



CARGO

"Año de la Universalización de la Salud"

Belén, 11 de setiembre del 2020

Oficio n. ° 1268-2020-GRL/GRI/SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
14 SEP 2020
Hora: 11.31 am Firma: [Signature]
Reg. N°

Asunto: Conformidad de Valorización N°06 de
Obra Agosto del 2020.

Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana
de la calle 28 de Julio de las cuadras 02-08-Yurimaguas
del Distrito de Yurimaguas –Provincia de Alto
Amazonas –Departamento de Loreto".

- Ref.: a. Informe n. °092-2020-GRL-GRI-SGSyC-DPCL
b. Carta N°332 -2020-M.S.S..SAC/J(09/09/2020)
c. Informe N°026-2020-MALRH/JS-28
d. Carta N°025-2020 CONS.MORALILLOS
YURIMAGUAS (03/09/2020)

Tengo el agrado de saludarle ,en atención a las referencias remitir la Valorización
n°06, por ejecución de obra correspondiente al mes de Agosto de 2020 revisada y
aprobada por el supervisor ,el mismo que asciende a la suma **S/.598,611.15 soles,**
(Quinientos Noventa y Ocho mil seiscientos once con 15/00 soles) sin IGV, de
acuerdo al siguiente detalle:

Valorización N° 06-Agosto de 2020	S/	587,282.47
Reajuste Actual	S/	11,328.68
Amortización de Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización de Adelanto para Materiales	S/	0.00
Neto a Pagar	S/.	598,611.15

Asimismo, la obra a Agosto de 2020 tiene un avance real acumulado ejecutado del
42.13%, versus el calendario programado de 30.38%, siendo el estado de la obra
adelantada y en ejecución.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta el supervisor,
se solicita continuar con el trámite respectivo **a favor de Consorcio Moralillos-
Yurimaguas.**

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerente Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES AQUISPUJOC
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: SGSyC – File obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)
RFA/dap.
Tramite: 26008



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

INFORME N°92-2020-GRL/GRI/SGSyC/DPCL

AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho
Sub Gerente de Supervisión y Control.

DE : Ing. Diana Paola Castro Litano
Coordinador de Obra

ASUNTO : **VALORIZACION DE OBRA N° 06– MES DE AGOSTO DEL 2020.**
OBRA.-“Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la calle 28 de Julio de las cuadras 02-08-Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas –Provincia de Alto Amazonas –Departamento de Loreto ”.
CONTRATISTA.- CONSORCIO MORALILLOS -YURIMAGUAS.

REFERENCIA: a) Carta N°332-2020-M.S.S.SAC/28 (09/09/2020)
b) Informe N°026-2020-MALRH/JS-28
c) Carta N°25-2020/CONS.Moralillos-Yurimaguas-MY (03/09/2020)
TRAMITE N°26008

FECHA : Iquitos, 08 de Setiembre del 2020.



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentación presentada por el Supervisor de obra referente a la Valorización de Obra N6, correspondiente al mes de Agosto del 2020, que mediante Proveído N°26008 de la SGSyC, se solicita su revisión e informe correspondiente.

1. ANTECEDENTES :

Mediante Resolución Gerencial Regional N° 086 – 2020 – GRL -GRI, de fecha 04 de Agosto del 2020, la Entidad resuelve aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo Excepcional por un periodo de 170 días calendarios.

Con fecha 05 de Agosto del 2020, en obra se inician los trabajos de adecuaciones de ambientes para prevenir el contagio y propagación de la COVID – 19.

Con fecha 19 de Agosto del 2020, en obra se da por concluida las adecuaciones de los ambientes para prevenir el contagio y propagación de la COVID – 19.

En ese sentido, en cumplimiento del Artículo primero de la Resolución Gerencial Regional N° 086 – 2020 – GRL -GRI, con fecha 20 de Agosto del 2020, se da por REINICIADA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02 - 08, LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – LORETO.

Mediante Carta N°332-2020-MS.S.SAC/28(09/09/2020) ;El Gerente General remite el informe de conformidad de la Valorización mensual N°06 de Obra correspondiente al mes de Agosto del 2020, de la Obra: “Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la calle 28 de Julio de las cuadras 02-08-Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas – Provincia de Alto Amazonas –Departamento de Loreto”, donde aprueba el monto de S/ 598,611.15 soles.



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Al respecto la suscrita indica que la supervisión ha presentado la valorización el 09/09/2020; incumpliendo el plazo estipulado de acuerdo al Art.194.6. donde indica que; el plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, por lo que la fecha máxima para la presentación de dicha valorización correspondiente al mes de Agosto del 2020 era hasta el 07/09/2020 y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

2. GENERALIDADES :

Del Contratista:

Nombre de la obra : “Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Calle 28 de Julio de las cuadras 02-08-Yurimaguas del Distrito de Yurimaguas-Provincia de Alto amazonas –Departamento de Loreto ”

Ubicación : Distrito: Yurimaguas– Prov.: Alto Amazonas

Entidad : Gobierno Regional de Loreto

Contratista : CONSORCIO MORALILLOS-YURIMAGUAS

Presupuesto Contractual : S/. 6, 689,731.46 SOLES (SIN IGV) con precios al mes de Feb.2019

Plazo de ejecución : 240 días calendario.

Contratista : CONSORCIO MORALILLOS - YURIMAGUAS.

Presupuesto Contractual : S/. 6, 689, 731.46 SOLES (SIN IGV) con precios al mes de FEBRERO DEL 2019.

Plazo de Ejecución : 240 días Calendario.

Inicio Plazo de Ejecución : 10/11/2019.

Término Plazo de Ejecución : 06/07/2020.

Representante Común : Ing. Fernando Tapullima Gálvez.

% del mes de avance programado. : 1.21 %
% avance ejecutado : 8.78 %
% avance prog. Acumul. : 30.38 %
% avance Ejecu.. Acumul. : 42.13 %

3. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION:



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

Del Contratista

1.0 GENERALIDADES

- 1.01 DATOS GENERALES
 - 1.01.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA
 - 1.01.2 DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA
- 1.02 ANTECEDENTES
- 1.03 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.0 CONTROL DE AVANCE

- 2.01 DATOS DE AVANCE DE OBRA
- 2.02 DESCRIPCION
- 2.03 AVANCE FISICO DE OBRA
- 2.04 CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y COMENTARIO ESPECIFICO

3.0 CONTROL DE OBRA

- 3.01 CONTROL DE CAMPO
- 3.02 DESCRIPCION DE LAS OCURRENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS EN OBRA.
- 3.03 CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PRUEBAS DE ENSAYO
- 3.04 RECURSOS UTILIZADOS DURANTE LA OBRA
- 3.05 CONTROL DE PERSONAL EN OBRA Y EQUIPO UTILIZADO
- 3.06 COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL RESIDENTE

4.0 CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

- 4.01 CONTROL DE VALORIZACIONES
- 4.02 CONTROL DE ADELANTOS
- 4.03 CONTROL DE CARTAS FIANZAS

5.0 CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL.

6.0 ANEXOS

- 6.1 RESUMEN DE VALORIZACION.
- 6.2 VALORIZACION, METRADOS Y REAJUSTES.
- 6.3 CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA.
- 6.4 COPIA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.
- 6.5 DISEÑOS DE MEZCLAS DE CONCRETO.
- 6.6 COPIA DEL CUADERNO DE OBRA.
- 6.7 PANEL FOTOGRAFICO
- 6.8 OTROS.

4. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

PROVEIDO N° 26008
A) Secretaría
PARA Para GEL para su
Primito correspondiente






“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS					MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS				
MES	MONTO TOTAL		PORCENTAJES		MES	MONTO TOTAL		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.		PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	S/.	%	%		S/.	S/.	%	%
10-NOV - 19	-	-	0.00%	0.00%	10-NOV - 19	-	-	-	-
30-NOV - 19	683,813.72	683,813.72	10.22%	10.22%	30-NOV - 19	683,813.72	683,813.72	10.22%	10.22%
31-DIC-19	596,382.09	1,280,195.81	8.91%	19.14%	31-DIC-19	596,382.09	1,280,195.81	8.91%	19.14%
31-ENE-20	204,449.90	1,484,645.71	3.06%	22.19%	31-ENE-20	204,449.90	1,484,645.71	3.06%	22.19%
29-FEB-20	547,691.78	2,032,337.49	8.19%	30.38%	29-FEB-20	547,691.78	2,032,337.49	8.19%	30.38%
31-MAR-20	198,935.44	2,231,272.93	2.97%	33.35%	31-MAR-20	198,935.44	2,231,272.93	2.97%	33.35%
30-ABR-20	-	2,231,272.93	0.00%	33.35%	30-ABR-20	-	2,231,272.93	0.00%	33.35%
31-MAY-20	0.00	2,231,272.93	0.00%	33.35%	31-MAY-20	0	2,231,272.93	0.00%	33.35%
30-JUN-20	0.00	2,231,272.93	0.00%	33.35%	30-JUN-20	0.00	2,231,272.93	0.00%	33.35%
30-JUL-20	0.00	2,231,272.93	0.00%	33.35%	30-JUL-20	0.00	2,231,272.93	0.00%	33.35%
30-AGO-20	80,656.77	2,311,929.70	1.21%	34.56%	31-AGO-20	587,282.47	2,818,555.40	8.78%	42.13%
30-SET-20	278,583.68	2,590,513.38	4.16%	38.72%					
30-OCT-20	842,792.61	3,433,305.99	12.60%	51.32%					
30-NOV-20	882,994.16	4,316,300.15	13.20%	64.52%					
30-DIC-20	1,136,165.36	5,452,465.51	16.98%	81.50%					
30-ENE-21	798,297.08	6,250,762.59	11.93%	93.44%					
08-FEB-21	438,968.87	6,689,731.46	6.56%	100.00%					
TOTAL CONTRATC	6,689,731.46				TOTAL EJECUTADO	2,818,555.40			

LA OBRA ESTA : ADELANTADA = -21.91%
RESPECTO AL PROGRAMADO ACUMULADO DEL MES

- CURVA S - PROGRAMADO V/S EJECUTADO

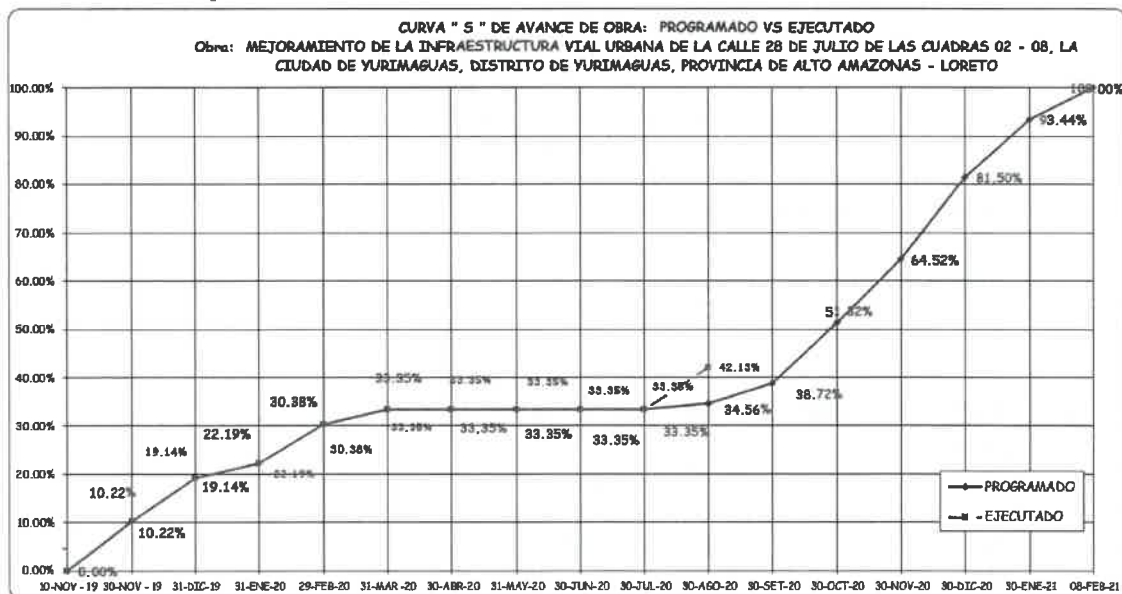

5. METRADOS EJECUTADOS

➤ De Acuerdo al Informe Técnico del Supervisor de Obra los Metrados realmente ejecutados en el presente periodo se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	ANT.		ACTUAL	ACUM.	SALDO
		UND	MET.	MET.	MET.	ME.
01	OBRAS PROVISIONALES					



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

01.01	ALQUILER DE ALMACEN	mes	4.20	1.00	5.20	2.80
02	SEGURIDAD Y SALUD					
02.01.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	est	0.54	0.07	0.61	0.39
02.01.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVO	est	0.54	0.07	0.61	0.39
02.01.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	0.54	0.07	0.61	0.39
02.01.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	0.54	0.07	0.61	0.39
02.01.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	0.54	0.07	0.61	0.39
03	SISTEMA DE DESAGUE					
03.01	RED MATRIZ					
03.01.02.03.05	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL	m	311.60	132.00	443.60	217.30
03.01.02.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3		363.39	363.39	797.06
03.03	CAMARAS DE INSPECCION: BUZONES, BUZONETAS, CAJAS, CAMARAS DE REUNION					
03.03.01.01.01	DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES	und		6.00	6.00	
04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS					



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

04.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 110MM	und	4.00	1.00	5.00	1.00
04.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES					
04.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES	und		3.00	3.00	1.00
05	PAVIMENTO ASFALTICO					
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
05.01.01	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2"	m2		655.40	655.40	
05.03	PAVIMENTOS					
05.03.01	SUB - BASE DE 0.20 M.	m3		727.09	727.09	314.08
05.03.02	MEZCLA DE MATERIAL CLASIFICADO PARA SUB BASE	m3		727.09	727.09	314.08
05.03.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SUB- BASE	m3		727.09	727.09	314.08
06	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE					
06.01	CUNETAS SARDINEL					
06.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m2	817.99	75.69	893.68	379.90
06.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE CUNETAS - SARDINEL	m3	700.87	45.41	746.28	321.20



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

06.01.02.02	NIVELACION, REGLADO Y APISONADO	m2	818.00	75.68	893.68	379.90
06.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3	841.04	54.50	895.54	385.43
06.01.03.01	CONCRETO EN SOLADO F'C=100KG/CM2 (e=2")	m2	818.00	75.68	893.68	379.90
06.01.04.01	CONCRETO EN CUNETAS - SARDINEL F'C= 175 KG/CM2	m3	432.89	50.46	483.35	200.42
06.02	ALCANTARILLA DE CRUCE					
06.02.01.01	DEMOLICION DE ALCANTARILLA EXISTENTE	m3		52.33	52.33	0.00
06.02.01.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2		98.37	98.37	
06.02.01.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2		78.59	78.59	0.00
06.02.02.01	DESVIO PROVISIONAL DE CAUCE NATURAL	m3		43.35	43.35	0.00
06.02.02.02	CORTE C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL	m3		29.15	29.15	0.00
06.02.02.03	NIVELACION, REGLADO Y APISONADO	m2		58.80	58.80	0.00
06.02.02.04	BASE GRANULAR DE 0.60 M.	m3		66.08	66.08	
06.02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3		86.99	86.99	



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

06.02.03.01	SOLADO DE CONCRETO F'C=100KG/CM2, E=4"	m2		71.99	71.99	
06.02.04.01	CONCRETO EN ALCANTARILLAS DE CRUCE F'C= 210 KG/CM2	m3		47.17	47.17	
06.02.04.02	ACERO CORRUGADO Ø 5/8" Fy= 4200 kg/cm2	kg		735.79	735.79	
06.02.04.03	ACERO CORRUGADO Ø 1/2" Fy= 4200 kg/cm2	kg		1,042.24	1,042.24	
06.02.04.04	ACERO CORRUGADO Ø 3/8" Fy= 4200 kg/cm2	kg		781.20	781.20	
06.02.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS	m2		275.06	275.06	
06.02.05.01	JUNTAS CON WATER STOP 6"	m		71.11	71.11	
06.03	SUMIDEROS					
06.03.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2		25.60	25.60	74.54
06.03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN SUMIDERO	m3		18.69	18.69	36.81
06.03.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A DISTANCIA 8.00 KM	m3		22.44	22.44	44.17
06.04	MURO DE CONTENCION					
06.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	233.89	156.03	389.92	898.06
06.04.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	233.89	156.03	389.92	898.06
06.04.02.01	CORTE	m3	1,089.19	608.27	1,697.46	5,529.60
