



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Belén, 18 de noviembre 2020

Oficio N° 03443-2020-GRL/GRI

CPC  
DIOMAR ROJAS PISCO  
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Logística  
Gobierno Regional de Loreto  
Presente.-

Asunto: **Conformidad de pago Valorización N° 09 de Obra. – Mes octubre 2020.**

Obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación del Nivel Secundario de la IEPEBR de la Localidad de Balsapuerto, Distrito de Balsapuerto-Provincia de Alto Amazonas-Loreto".

Ref. : a) Oficio N° 2032-2020-GRL-GRI-SGSyC  
b) Informe N° 158-2020-GRL-GRI-SGSyC-ERGOS.  
c) Carta N° 032-2020-Consortio Supervisor Balsapuerto  
d) Informe N° 009-2020-GBDV/SO

Es grato dirigirme a usted y en atención a los documentos de la referencia, se remite la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Supervisión y Control – GRI, para el pago de Valorización N° 09 por ejecución de Obra, correspondiente al mes de octubre 2020, de la obra indicada en el asunto, cuyo monto asciende a la suma de S/. 673,143.35 (Seiscientos Setenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Tres con 35/100 Soles), a favor del **CONSORCIO SANTA ROSA I**, según detalle:

Valorización N° 09 octubre 2020	S/	673,143.35
Reajuste	S/	0.00
Amortización de Adelanto Directo	S/	-101,971.50
Amortización de Adelanto Materiales	S/	-166,285.04
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/</b>	<b>404,886.81</b>

Asimismo, se indica que la obra a octubre 2020, tiene un avance real acumulado ejecutado de 57.47%, versus un avance programado de 57.07%, encontrándose la obra adelantada.

Para los fines subsiguientes se adjunta:

- 01 File de manila con 170 folios

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
**Ing. Edi Wisberto Ruiz Zarate**  
Gerente Regional de Infraestructura

C.c.  
SGSyC  
Crono GRI  
File Personal  
EWRZ/tbg  
Tramite : 33652




"Año de la Universalización de la Salud"

Belén, 18 de noviembre del 2020

Oficio n° 2032-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente



Asunto: Conformidad de valorización de obra n° 09 mes de octubre del 2020.

Obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación del Nivel Secundario de la IEPEBR de la Localidad de Balsapuerto, Distrito de Balsapuerto – Provincia de Alto Amazonas – Loreto".

Ref. : a) Informe n° 158-2020-GRL-GRI-SGSyC-ERGOS  
b) Carta n° 032-2020/CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO  
c) Informe n° 009-2020-GBDV/SO  
d) Carta n° 029-2020-CSRI-RFC  
e) informe n° 010-2020/AJM/R.O/CSR-I

Tengo el agrado de saludarle a usted, en atención a la referencia a), remitirle la valorización n° 09 por ejecución de obra, correspondiente al mes de **octubre del 2020**, revisada por el Coordinador y aprobada por el Supervisor, que asciende a la suma de **(S/. 673,143.35)**, de acuerdo a las amortizaciones por adelanto directo y adelanto de materiales, consideramos el monto neto a pagar la suma de **Cuatrocientos cuatro mil ochocientos ochenta y seis con 81/100 Soles, (S/. 404,886.81)**, sin incluir IGV; asimismo los reajustes serán considerados en la liquidación final de obra en concordancia al artículo 195° del RLCE, siendo el monto neto a pagar de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización n° 09 – octubre 2020	S/. <b>673,143.35</b>
Reajuste	S/. 0.00
Amortización adelanto directo	S/. -101,971.50
Amortización adelanto materiales	S/. -166,285.04
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/. 404,886.81</b>

Asimismo, la obra a octubre del 2020, tiene un avance real acumulado ejecutado de 57.47%, versus un avance programado de 57.07%, encontrándose en ejecución como obra **adelantada**.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación de la valorización que sustenta el Supervisor, solicito continuar con el trámite respectivo a favor del **CONSORCIO SANTA ROSA I**.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO  
Sub Gerente de Supervision y Control

Copia: SGSyC - File obra (01)  
SGSyC - File correlativo (01)  
SGSyC - File personal (01)  
Registro: 33652  
RFA/SGSyC/iva.



169

**INFORME N°158-2020-GRL/GRI/SGSyC-ERGOS**



A : Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO  
Sub Gerente de Supervisión y Control

De : Ing. ERICK GERMAN OLIVEIRA SANGAMA  
Coordinador de Obra

Asunto : Remito Informe sobre Valorización N°09 del Contratista de Obra correspondiente al mes de octubre del 2020 Obra: "Mejoramiento del Servicio de Educación del Nivel Secundario de la I.E.P.E.B.R. Balsapuerto; en la Localidad de Balsapuerto – Alto Amazonas - Loreto".

- Referencia :
1. N° de Trámite 33652
  2. Carta N°032-2020/CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO
  3. Informe N°009-2020-GBDV/SO
  4. Carta N°029-2020-CSRI-RFC
  5. Informe N°010-2020/AJM/R.O./CSR-I

Fecha : Iquitos, 17 de noviembre del 2020

Por el presente documento me dirijo a usted para saludarle, y a la vez, remitirle el informe de revisión del Informe de la Valorización N°009 de Ejecución de la Obra indicada en la referencia por el Contratista Consorcio Santa Rosa I en el mes de septiembre del año 2020, en calidad de Coordinador de Obra.

**ANTECEDENTES:**

- Con fecha 02 de noviembre del 2020 el Residente de Obra del Consorcio Santa Rosa I elabora el Informe N°010-2020/AJM/R.O./CSR-I cuyo asunto es la presentación de la valorización N°009 correspondiente al mes de octubre del 2020 de la obra "Mejoramiento del Servicio de Educación del Nivel Secundario de la I.E.P.E.B.R. Balsapuerto; en la Localidad de Balsapuerto – Alto Amazonas - Loreto".
- Con fecha 02 de noviembre del 2020 mediante Carta N°029-2020-CSRI-RFC, el representante común del Consorcio Santa Rosa I presenta la valorización N°009 correspondiente al mes de octubre del 2020, sin embargo, el jefe de supervisión registra su recepción la fecha 04/11/2020.
- Con Informe N°009-2020-GBDV/SO de fecha 05 de noviembre del 2020 el jefe de supervisión presenta, al Representante Legal Común de Consorcio Supervisor Balsapuerto, la valorización N°009 presentada por el contratista del Consorcio Santa Rosa I.

  
Erick German Oliveira Sangama  
Ingeniero Civil  
CIP N° 141593

18

- Con fecha 06 de noviembre del 2020 el Consorcio Supervisor Balsapuerto emite la Carta N°032-2020/CONSORCIO SUPERVISOR BALSAPUERTO en la cual adjunta la valorización N°009 de la obra indicada, y esta es recibida por el Gobierno Regional de Loreto el 09/11/2020.
- Con fecha 10/11/ 2020 la valorización N°009 es derivada a la Sub Gerencia de Supervisión y Control para su trámite respectivo.

#### **DATOS GENERALES DE LA OBRA:**

- Obra : "Mejoramiento del Servicio de Educación del Nivel Secundario de la I.E.P.E.B.R. Balsapuerto; en la Localidad de Balsapuerto – Alto Amazonas - Loreto".
- Entidad que Ejecuta : Gobierno Regional de Loreto.
- Proceso de Selección : AS N°010-2019-CSO-GRL – (I CONVOCATORIA).
- Contratista : Consorcio Santa Rosa I
- Sistema de Contratación : Suma Alzada
- Valor Referencial : S/. 7,368,559.35 Soles sin IGV
- Monto Contratado : S/. 7,361,593.41 Soles sin IGV
- Adelanto Directo : S/. 736,160.00 Soles
- Adelanto de Materiales : S/. 1,472,319.00
- Residente de Obra : Arq. Alfredo Jiménez Mera (CAP. N°4057)
- Contratista Supervisor : Consorcio Supervisor Balsapuerto
- Jefe de Supervisión : Ing. Geicen Bladislav Delgado Vásquez
- Plazo de ejecución : 240 días calendario
- Fecha de Inicio de Obra : 30-octubre-2019
- Término de Plazo de Obra : 25-junio-2020
- Inicio de Suspensión de plazo : 19-diciembre-19
- Periodo de suspensión de plazo : 33 días calendarios
- Finalización de suspensión de Plazo : 21-enero-20
- Nueva fecha de término de Ejecución : 28-julio-20
- Inicio de Estado de Emergencia : 16/03/2020
- Plazo del saldo de obra : 135 días calendarios
- Plazo de Impacto 3 : 50 días calendarios
- Plazo Total para Culminar Obra : 185 días calendarios
- Reinicio de Plazo de Ejecución : 03/08/2020


162

- Nueva fecha de Culminación : 03/02/2021
- Código Snip : 2437099
- Normativa Aplicable : Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

**CONTROL DE AVANCE DE OBRA:**

➤ De acuerdo con lo informado por el Consorcio Supervisor Balsapuerto, la obra a la fecha que corresponde la valorización N°009 octubre del 2020, tiene un porcentaje de avance ejecutado acumulado de 57.47% frente a un porcentaje de avance programado acumulado de 43.78%, por tal la obra se encuentra **ADELANTADA** en un 0.40%.

AÑO	2019				2020													
	DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE	DEL 19 AL 121 DE DICIEMBRE	DEL 01 AL 20 DE ENERO	DEL 01 AL 31 DE ENERO	DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	DEL 01 AL 15 DE MARZO	DEL 16 DE MARZO AL 04 DE JUNIO	DEL 05 DE JUNIO AL 06 DE JULIO	DEL 09 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO	DEL 03 AL 31 DE AGOSTO	DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE				
VALORIZACION PROGRAMADA	32,453.80	639,316.52	413,632.24	SUSPENSIÓN DE PLAZO		319,698.95	583,252.70	199,357.85	AISLAMIENTO SOCIAL	TRAMITE Y APROBACIÓN	ADECUACIÓN	473,546.75	561,913.94	978,079.40				
VAL PROGRAMADA ACUMULADA	32,453.80	671,770.32	1,085,402.56		1,405,101.51	1,988,354.21	2,187,712.06	2,561,258.81				2,561,258.81	2,561,258.81	2,561,258.81	2,561,258.81	3,223,172.75	4,201,252.15	
PORCENTAJE PROGRAMADO	0.44%	8.68%	5.62%		4.34%	7.92%	2.71%	6.43%				7.63%	13.29%					
% PROGRAMADO ACUMULADO		9.13%	14.74%		19.09%	27.01%	29.72%	36.15%				43.78%	57.07%					
VALORIZACION REAL	32,453.80	671,770.32	413,632.23		319,698.95	583,252.70	199,357.84	319,698.95				583,252.70	199,357.84	319,698.95	583,252.70	199,357.84	319,698.95	583,252.70
VAL ACUMULADA	32,453.80	671,770.32	1,085,402.55		1,405,101.50	1,988,354.20	2,187,712.04	2,561,258.81				2,561,258.81	2,561,258.81	2,561,258.81	2,561,258.81	3,223,172.75	4,201,252.15	
POR. DE EJECUTADO	0.44%	8.68%	5.62%		4.34%	7.92%	2.71%	8.07%				10.53%	9.14%					
% EJECUTADO ACUMULADO		9.13%	14.74%		18.09%	27.01%	28.72%	37.78%				48.32%	57.47%					

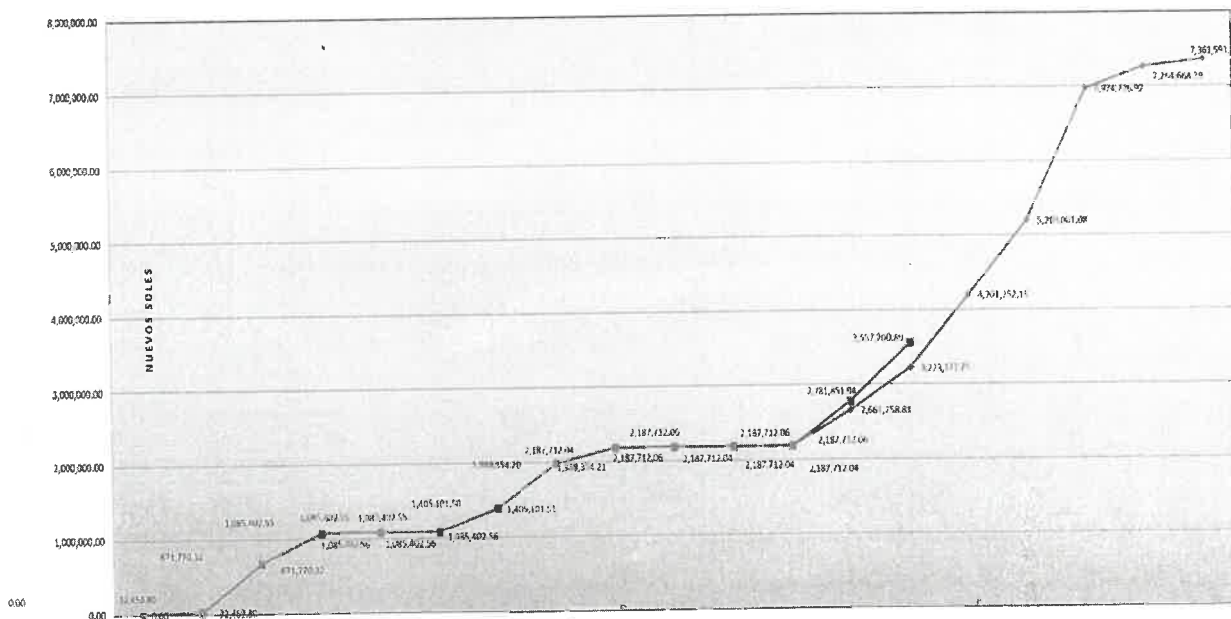

  
**Erick German Oliveira Sangama**  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 141593
