

## 5. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

VALORIZACION	N° 02	SEGUNDO PAGO	FECHA : Setiembre 2020
OBRA			
PROPIETARIO	Suma alzada		
CONTRATISTA	CONSORCIO SARAYAQUILLO		
PRESUP. CONTRATADO	S/. 510,007.99	sin IGV	
<b>HOJA DE LIQUIDACION</b>			
1. VALORIZACION N° 02 - Setiembre 2020			
Monto Bruto			( a ) 329,425.54
Amortización			
Adelanto Directo (10.00%)		-	
Adelanto por Materiales (Según D.S. N° 079-VC, Ampliatorias y Modificatorias)		-	-
2. REAJUSTES DE LA VALORIZACION N° 02			
Monto Bruto			( b ) -
Deducción de reajuste que no corresponde			
- Del adelanto directo		-	
- Del adelanto por materiales		-	( b ) -
3. REGULARIZACION DE REAJUSTE VAL. N° 02			
Monto Bruto			( c ) -
Deducción de reajuste que no corresponde			
- Del adelanto directo		-	
- Del adelanto por materiales		-	( c ) -
4. TOTAL A PAGAR			
		329,425.54	2'1) Valorización N° 02
		-	Deducción de reajuste que no corresponde
		329,425.54	<b>4) TOTAL A PAGAR</b>
5. SENCICO			
	((a)+(b)+(c))	329,425.54 x 2/1000	S/. 659
DE ACUERDO AL D.S. N°006-88-VC (12-05-88); Art. 2 ESTABLECE QUE LA FIRMA CONTRATISTA TIENE OBLIGACION DE ACREDITAR PREVIAMENTE ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE SUS APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL PARA DAR PASE A SU CANCELACION (Art. 4 D.L. 20024 de fecha 22-05-73)			



**7. CONCLUSIONES**

La Obra al Mes de Setiembre del 2020, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 90.89 % respecto a un avance programado de 75.68 %, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ADELANTADA.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de **Trescientos veintinueve mil cuatrocientos veinticinco y 54 /100 Soles (S/. 329,425.54), SIN/IGV, de acuerdo al siguiente detalle:**

<b>Valorización 02 Bruta Setiembre 2020</b>	<b>S/. 329,425.54</b>
Reajuste	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(0.00)
Por Adelanto de Materiales	(0.00)
IGV 18.00 %	(0.00)
<b>Monto Neto a Pagar</b>	<b>329,425.54</b>

**8. RECOMENDACIÓN**

Al contar con la opinión favorable y validación del monto consignado por parte del Inspector de la Obra, se otorga conformidad y se recomienda tramitar el pago de la valorización N° 02 de ejecución de obra : **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO EN EL CASERIO SARAYACU, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO"**. Correspondiente al mes de Setiembre del 2020, por **Trescientos veintinueve mil cuatrocientos veinticinco y 54 /100 Soles (S/. 329,425.54), SIN/IGV**, a favor del contratista **CONSORCIO SARAYAQUILLO**.

Se acredita pago a SENCICO por S/. 659 y se adjunta copia del Voucher de pago por Seguro Contra Todo Riesgo, ES SALUD y CONAFOVICER. Se adjunta el comprobante de pago o factura de la valorización.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

  
KENYO ALBERTO  
MONTES CUELLAR  
INGENIERO CIVIL  
Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR  
Inspector de Obra  
Sub Gerencia de Supervisión y Control

Cc: Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar


Trámite: 29592



6. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA

GRÁFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA - VAL Nº 02											
PROGRAMADO VS EJECUTADO											
Obra :		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN CON POSTES DE CONCRETO EN EL CASERÍO SARAYACU DEL DISTRITO DE SARAYACU - PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO									
Ubicación :		DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO									
FECHA		PRESUPUESTO OBRA				PRESUPUESTO VALORIZADO				AVANCE / ATRAZO	
		PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	%	% ACUM.	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	%	% ACUM.	RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO	
										%	DESCRIP
INICIO	JULIO 2020	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
VAL Nº 01	AGOSTO 2020	102,187.30	102,187.30	20.04%	20.04%	134,108.33	134,108.33	26.30%	26.30%	6.26%	ADELANTADO
VAL Nº 02	SEPTIEMBRE 2020	283,786.91	385,974.21	56.64%	75.68%	329,425.54	463,533.67	64.59%	90.89%	15.21%	ADELANTADO
VAL Nº 03	OCTUBRE 2020	124,033.75	510,007.96	24.32%	100.00%						
TOTAL		510,007.96		TOTAL		463,533.67		90.89%			

GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES  
PROGRAMADO VS EJECUTADO

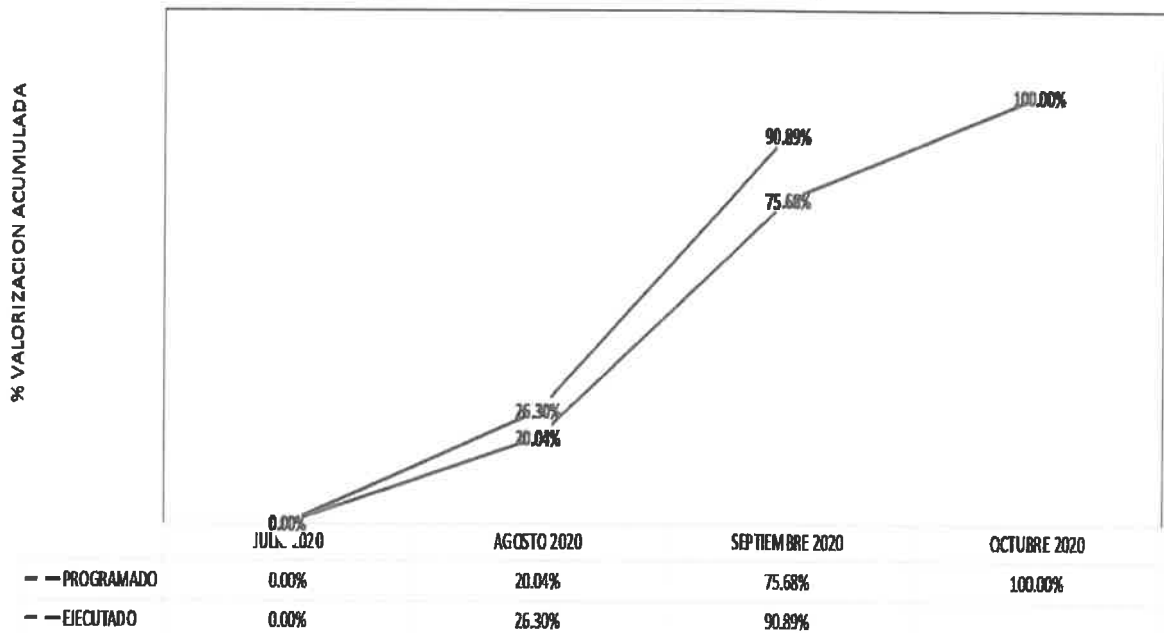

# CONSORCIO SARAYAQUILLO

## RUC N° 20606021136

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

**Coronel Portillo, 03 de Setiembre del 2020**


**CARTA N° 007-2020-CS**

Señor:  
Ing. Edí Wisberto Ruíz Zarate  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Presente:

**ATENCIÓN : ING. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR**  
Inspector de Obra

**ASUNTO : REMITO VALORIZACIÓN N° 02 – SETIEMBRE 2020**

**REF : a).- CONTRATO N° 018-C-2020-GRL-GGR-GRI**  
**Obra: Mejoramiento del Sistema de Sarayacu**  
**Electrificación con Postes de Concreto en el**  
**Caserío del Distrito de Sarayacu – Provincia de**  
**Ucayali, Departamento de Loreto.**



De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a Usted, a fin de hacerle llegar la Valorización N° 02, correspondiente al mes de setiembre del 2020, de la obra en referencia.

Seguro de contar con la atención debida a lo solicitado quedamos de usted.

Atentamente,

CONSORCIO SARAYAQUILLO  
*Cintya Prota Campos Davila*  
CINTYA PROTA CAMPOS DAVILA  
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO



PROVEIDO N° 29592  
A: S.G. Superv. y Control  
PARA: Supervisión



PROVEIDO N° 29592  
A: Ing. Kenyo Montes  
PARA: SU  
Atención  
06/10/2020



**VALORIZACION N°02 SETIEMBRE 2020**

Proyecto : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO EN EL CARRERITO SARAYACU, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO\*

RESIDENTE: ING. ROLANDO WILLIAM CANARIO VASQUEZ  
 INSPECTOR: ING. KENYO ALBERTO MONTES CUELAR

CONTRATO DE OBRA N° 018-C-2020-ORL-GOR-GRI  
 MÓDULO CONTRACTUAL: 510.007.98

VALORIZACION N°02 SETIEMBRE 2020

Item	Materiales	TOTAL			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE DEL MES			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		Unidad	Cantidad	Preço S/.	Total S/.	CANTIDAD	P. TOTAL S/	%	CANTIDAD	P. TOTAL S/	%	CANTIDAD	P. TOTAL S/	%	CANTIDAD	P. TOTAL S/	%
01.04	<b>OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES</b>	gp	1,00	48.183,00	48.183,00	0,50	38.554,40	20,00%	0,20	9.638,60	20,00%	1,00	48.183,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
02.03	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PRED SECUNDARIA, CABETA DE FUERZA, DESDE EL PUERTO DE PICALPA HASTA EL EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gp	1,00	737,80	737,80	1,00	737,80	100,00%	1,00	737,80	100,00%	1,00	737,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO	pb	2,00	352,38	704,76	2,00	352,38	100,00%	1,50	352,38	75,00%	1,00	352,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
02.05	CAPACITACION PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	ms	1,00	1.500,00	1.500,00	1,00	1.500,00	100,00%	1,00	1.500,00	100,00%	1,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
02.06	TRAZO DE INHUILES Y REPLANTEO	gp	2,085,87	1.710,00	3.420,00	10,00	1.710,00	100,00%	1,00	3.395,50	88,61%	2,085,87	5.105,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.01.01	EXCAVACION DE HOYOS PARA RETENIDA EN TERRENO SUELTO	und	38,00	76,02	2.894,76	38,00	76,02	100,00%	23,00	3.095,50	88,61%	38,00	5.105,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.01.02	EXCAVACION DE HOYOS PARA PUESTA A TIERRA EN TERRENO SUELTO	und	23,00	117,01	2.691,23	23,00	117,01	100,00%	113,00	2.891,23	100,00%	23,00	2.891,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.01.03	TRANSPORTE DE POSTES DEL ALMACEN AL PUNTO DE IZAJE	und	113,00	86,18	9.738,34	30	20.076,30	17,76%	113,00	7.478,34	100,00%	113,00	7.478,34	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.01.04	POSTES DE C.A.C. 8000V/120/240	und	34,00	689,21	23.415,14	80	20.076,30	4,00	23,00	4.000,00	24,05%	34,00	23.415,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.02.01	POSTES DE C.A.C. 8000V/120/240	und	78,00	84,40	6.571,20	38.352,60	38.352,60	100,00%	19,00	12.144,99	31,69%	78,00	50.497,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.02.02	ARMADO DE FIN DE LINEA (E)	gp	14,00	76,40	1.069,60	4.884,40	4.884,40	100,00%	14,00	4.884,40	100,00%	14,00	4.884,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.02.03	ARMADO DE ALINEAMIENTO (E)	gp	18,00	85,40	1.537,20	1.069,60	1.069,60	68,76%	12,00	1.069,60	100,00%	12,00	1.069,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.02.04	ARMADO DE ANCLAJE CON DERIVACION (E)	gp	5,00	122,85	614,25	1.537,20	614,25	39,35%	3,00	387,85	60,00%	3,00	387,85	60,00%	2,00	387,85	26,00%
03.03.01	ARM. ARMADO DE DOBLE ANCLAJE CON DERIVACION (I)	gp	3,00	132,65	397,95	397,95	397,95	100,00%	1,00	132,65	33,33%	3,00	397,95	100,00%	1,00	132,65	33,33%
03.03.02	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE AL. 3/26x1x18/95mm2	m	1.003,37	14,13	14.177,62	14.177,62	14.177,62	100,00%	1.003,37	14.177,62	100,00%	1.003,37	14.177,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.03.03	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE AL. 3/26x1x18/95mm2	m	1.952,30	11,13	21.724,45	21.724,45	21.724,45	100,00%	1.952,30	21.724,45	100,00%	1.952,30	21.724,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.03.04	INSTALACION DE RETENIDA INCLINADA P/POSTES DE 8m.	gp	34,00	385,77	13.104,18	13.104,18	13.104,18	100,00%	34,00	13.104,18	100,00%	34,00	13.104,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.03.05	PUERSTA A TIERRA CON VARILLA COOPERWELD	gp	4,00	486,93	1.947,72	1.947,72	1.947,72	100,00%	4,00	1.947,72	100,00%	4,00	1.947,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.03.06	PASTORAL DE F*9 x LUMINARIA 70 W/6 ECC/RRJAL	gp	113,00	448,52	50.682,76	50.682,76	50.682,76	100,00%	113,00	50.682,76	100,00%	113,00	50.682,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.10.01	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS LARGAS	und	18,00	185,35	3.336,30	27.448,10	27.448,10	90,18%	18,00	24.940,40	90,18%	18,00	24.940,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.11.01	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS LARGAS	und	19,00	284,04	5.396,76	5.396,76	5.396,76	100,00%	1,00	75.877,45	1.407,76%	10,00	24.940,40	52,03%	9,00	2.376,36	47,27%
03.13.01.01.01	INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO 100 KW. 380/230 V	gp	1,00	75.877,45	75.877,45	75.877,45	75.877,45	100,00%	1,00	75.877,45	100,00%	1,00	75.877,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.13.01.01.02	CAPACITACION A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	gp	1,00	1.198,44	1.198,44	1.198,44	1.198,44	100,00%	1,00	1.198,44	100,00%	1,00	1.198,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
03.13.02.01.01	LETREROS INFORMATIVOS, PREVENTIVOS Y DE RECONSTRUCCION	und	4,00	75,86	303,44	303,44	303,44	100,00%	4,00	303,44	100,00%	4,00	303,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	gp	21,20	6,85	145,22	145,22	145,22	100,00%	21,20	145,22	100,00%	21,20	145,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
04.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	gp	18,00	4,47	80,46	80,46	80,46	100,00%	18,00	80,46	100,00%	18,00	80,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%
04.02.01	EXCAVACION Y PERILADO PARA VEREDAS	gp	5,20	46,89	243,66	243,66	243,66	100,00%	5,20	243,66	100,00%	5,20	243,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
04.02.02	NIVELACION Y PERILADO PARA VEREDAS	gp	18,00	6,18	111,24	111,24	111,24	100,00%	18,00	111,24	100,00%	18,00	111,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
04.03.01	TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL	ms	1,00	677,18	677,18	677,18	677,18	100,00%	1,00	677,18	100,00%	1,00	677,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%
04.03.02	SISTEMA DE PARABARRIO TIPO IONIZANTE	ms	1,00	1.232,70	1.232,70	1.232,70	1.232,70	100,00%	1,00	1.232,70	100,00%	1,00	1.232,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
04.03.03	POSTE DE C.A.C. DE 6/20	und	1,00	539,00	539,00	539,00	539,00	100,00%	1,00	620,00	100,00%	1,00	620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
04.03.04	IZAJE Y CIMENTACION POSTE DE C.A.C. DE 8/90	und	1,00	227,21	227,21	227,21	227,21	100,00%	1,00	227,21	100,00%	1,00	227,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES 10,00%

UTILIDAD 10,00%

SUB TOTAL 1

FACTOR

SUB TOTAL 2

PRESUUESTO TOTAL

% AVANCE MENSUAL

% AVANCE ACUMULADO

90,89%

90,89%

64,56%

90,89%

90,89%

326.426,56

326.426,56

326.426,56

326.426,56

326.426,56

326.426,56

326.426,56

326.426,56

**Rolando W. Caporin Vasquez**  
 Residente de Obra  
 CIP N° 76036

90,89%  
90,89%  
64,56%  
90,89%

326.426,56

**Kenyo Alberto Montes Cuelar**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 195722

90,89%  
90,89%  
46.474,11  
46.474,11

