



Valorización 01 Bruta Agosto 2020	S/. 134,108.32
Reajuste	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(0.00)
Por Adelanto de Materiales	(0.00)
IGV 18.00 %	(0.00)
Monto Neto a Pagar	134,108.32


La Obra al Mes de Agosto del 2020, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 26.30% respecto a un avance programado de 20.04 %, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ADELANTADA.

5. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

VALORIZACION	Nº 01	PRIMER PAGO	FECHA : Agosto 2020
OBRA		"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO EN EL CASERIO SARAYACU, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO"	
CONTRATISTA		CONSORCIO SARAYAKILLO	
PRESUP. OFERTADO	S/. 510,007.99	sin IGV	
HOJA DE LIQUIDACION			
1. VALORIZACION Nº 02 - Agosto 2020:			
<u>Monto Bruto</u>		(a)	134,108.33
<u>Amortización</u>			
Adelanto Directo (10.00%)		-	
Adelanto por Materiales (Según D.S. Nº 079-VC, Ampliatorias y Modificadorias)		-	
			134,108.33
2. REAJUSTES DE LA VALORIZACION Nº 04			
<u>Monto Bruto</u>		(b)	-
Deducción de reajuste que no corresponde			
- Del adelanto directo		-	
- Del adelanto por materiales		-	
		(b)	-
3. REGULARIZACION DE REAJUSTE VAL. Nº 01			
<u>Monto Bruto</u>		(c)	-
Deducción de reajuste que no corresponde			
- Del adelanto directo		-	
- Del adelanto por materiales		-	
		(c)	-
4. TOTAL A PAGAR			
		134,108.33	
		-	2) Valorización Nº 01
		-	Deducción de reajuste que no corresponde
		134,108.33	4) TOTAL A PAGAR
5. SENCICO			
	((a)+(b)+(c))	134,108.33 x 2/1000	S/. 268.22
DE ACUERDO AL D.S. Nº006-88-VC (12-05-88); Art. 2 ESTABLECE QUE LA FIRMA CONTRATISTA TIENE OBLIGACION DE ACREDITAR PREVIAMENTE ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE SUS APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL PARA DAR PASE A SU CANCELACION (Art. 4 D.L. 20024 de fecha 22-05-73)			



6. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA

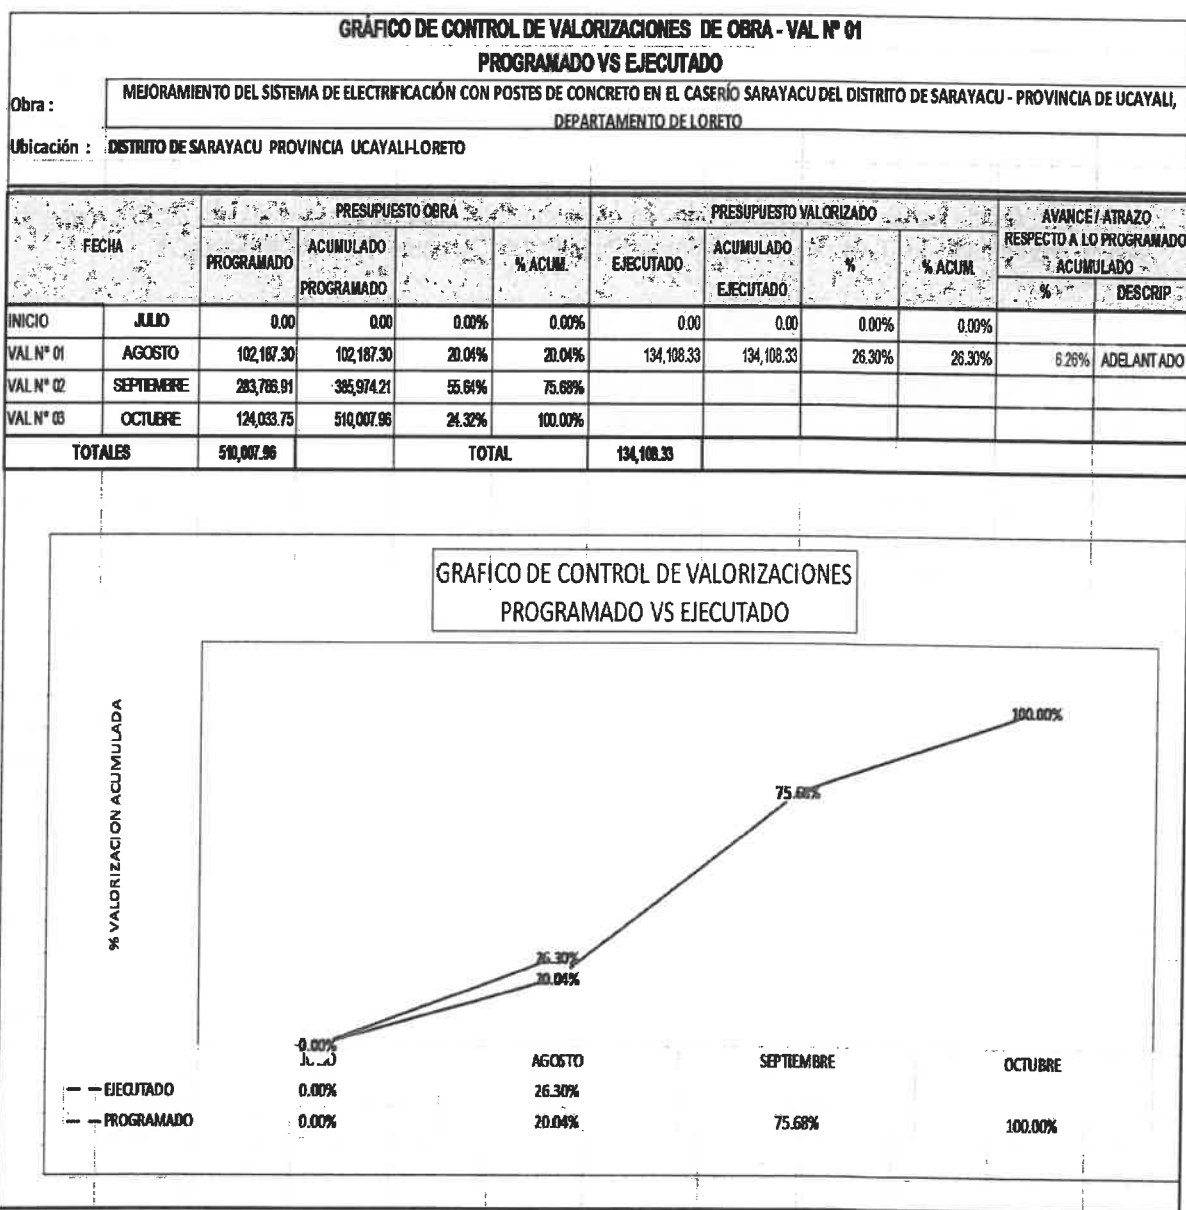



7. CONCLUSIONES

La Obra al Mes de Agosto del 2020, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 26.30 % respecto a un avance programado de 20.04 %, encontrándose EN EJECUCIÓN como OBRA ADELANTADA.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de **ciento treinta y cuatro mil ciento ocho y 32 /100 Soles (S/. 134,108.32), SIN/IGV**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización 01 Bruta Agosto 2020	S/. 134,108.32
Reajuste	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(0.00)
Por Adelanto de Materiales	(0.00)
IGV 18.00 %	(0.00)
Monto Neto a Pagar	134,108.32


8. RECOMENDACIÓN

Al contar con la opinión favorable y validación del monto consignado por parte del Inspector de la Obra, se otorga conformidad y se recomienda tramitar el pago de la valorización N° 01 de ejecución de obra : **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO EN EL CASERIO SARAYACU, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO"**. Correspondiente al mes de Agosto del 2020, por **ciento treinta y cuatro mil ciento ocho y 32 /100 Soles (S/. 134,108.32), SIN/IGV** a favor del contratista **CONSORCIO SARAYAQUILLO**.

Se acredita pago a SENCICO por S/. 268.22 y se adjunta copia del Voucher de pago por Seguro Contra Todo Riesgo, ES SALUD y CONAFOVICER. Se adjunta el comprobante de pago o factura de la valorización.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,


KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 195722

Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
Inspector de Obra
Sub Gerencia de Supervisión y Control

Cc: Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar

Trámite: 25081

CONSORCIO SARAYAQUILLO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control

RUC N° 20606021136

07 SEP 2020

Fecha: 25081 Hora: 8:47 am
Reg: _____

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Coronel Portillo, 03 de Agosto del 2020

CARTA N° 005-2020-CS

Señor:

Ing. Edi Wisberto Ruíz Zarate
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Presente:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
04 SEP 2020
Hora: 12:19 pm
Reg. N° _____
Firma: _____

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
OFICINA DE ADM. DOCUMENTARIA
UNIDAD TRAMITE DOCUMENTARIO
25081
04 SEP 2020
Hora: _____ Fecha: _____
CONTROL RECEPCION

ATENCIÓN : ING. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
Inspector de Obra

ASUNTO : REMITO VALORIZACIÓN N° 01 – AGOSTO 2020

REF : a).- CONTRATO N° 018-C-2020-GRL-GGR-GRI
Obra: Mejoramiento del Sistema de Sarayacu
Electrificación con Postes de Concreto en el
Caserío del Distrito de Sarayacu – Provincia de
Ucayali, Departamento de Loreto.

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a Usted, a fin de hacerle llegar la Valorización N° 01, correspondiente al mes de agosto del 2020, de la obra en referencia.

Seguro de contar con la atención debida a lo solicitado quedamos de usted.

Atentamente,

CONSORCIO SARAYAQUILLO
Redamp
CINTIA PAOLA CAMPOS DA
SUPERINTENDENTE GENERAL DEL CONSORCIO

PROVIDO N° 25081
A: Ing Kenyo Montes
PARA: Su Atención



PROVIDO N° 25081
A: S.G.S.C - 014
PARA: Trámite de
07.09.2020

