



05.04	UÑAS EN PAVIMENTO MORTERO F'c=210 kg/cm2	m3	137.70	0.00	4.56	4.56	133.14
05.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA	m2	1,500.02	0.00	264.00	264.00	1,236.02
05.06	CURADO DE LOSA DE RODADURA, durante 7 días- 4 veces x días	m2	5,508.12	0.00	180.00	180.00	5,328.12
05.07	JUNTAS DE DILATACION 1"X8"@9.00	m	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00
05.08	JUNTAS DE CONTRACCION 1"X2"	m	1,200.04	0.00	0.00	0.00	1,200.04
05.09	JUNTAS DE ARTICULACION LONGITUDINAL 1"X2"	m	918.02	0.00	0.00	0.00	918.02
05.10	JUNTA LATERAL DE CONSTRUCCION 1"X6"	m	1,836.04	0.00	0.00	0.00	1,836.04
05.11	PASADORES DE FIERRO CORRUGADO D=5/8" PARA JUNTA DE ARTICULACION LONGITUDINAL	kg	2,565.00	0.00	140.40	140.40	2,424.60
05.12	PASADORES DE FIERRO CORRUGADO D=5/8" PARA JUNTA DE CONTRACCION	kg	3,163.00	0.00	91.26	91.26	3,071.74
05.13	PASADOR DE FIERRO LISO D=5/8" PARA JUNTA DE DILATACION	kg	1,583.00	0.00	42.12	42.12	1,540.88
05.14	ESPIGAS DE FIJACION CON TUBO PVC SAP 3/4"	kg	2,041.00	0.00	437.00	437.00	1,604.00
06.00	VEREDA						
06.01	CAMA DE ARENA ANTICONTAMINANTE EN VEREDA e=0.10m	m3	176.64	0.00	0.00	0.00	176.64
06.02	Solado de mortero 1:8 (c.a), e= 2"	m2	1,960.31	0.00	0.00	0.00	1,960.31
06.03	VEREDA, E=0.10m, MORTERO F'C= 175 kg/cm2, acabado con bruña de canto y transversal	m3	211.97	0.00	0.00	0.00	211.97
06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	1,130.41	0.00	0.00	0.00	1,130.41
06.05	JUNTA DE DILATACION EN VEREDA CON MEZCLA DE ASFALTO Y ARENA @ 3.00m	m	705.60	0.00	0.00	0.00	705.60
06.06	CURADO DE LOSA DE VEREDA, durante 7 días- 4 veces x días	m2	2,119.70	0.00	0.00	0.00	2,119.70
07.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE						
07.01	SARDINEL						
7.01.01	MORTERO F'c=175kg/cm2	m3	211.97	0.00	0.00	0.00	211.97
7.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	1,787.03	0.00	0.00	0.00	1,787.03
7.01.03	FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" Inc. 5% desp.	kg	8,705.00	0.00	0.00	0.00	8,705.00
7.01.04	TARRAJEO PULIDO EN SARDINELES	m2	529.93	0.00	0.00	0.00	529.93
7.01.05	JUNTA DE DILATACION 1" @ 9.00m EN SARDINEL	m	117.76	0.00	0.00	0.00	117.76
07.02	CUNETAS						



07.02.01	CAMA DE ARENA ANTICONTAMINANTE EN CUNETAS e=0.05m	m3	52.99	0.00	0.00	0.00	52.99
07.02.02	MORTERO F'c=175kg/cm2	m3	90.09	0.00	0.00	0.00	90.09
07.02.03	FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" Inc. 5% desp.	kg	6,924. 37	0.00	0.00	0.00	6,924. 37
07.02.04	TARRAJEO PULIDO EN CUNETAS	m2	918.54	0.00	0.00	0.00	918.5 4
07.02.05	JUNTA DE DILATACION 1" @ 9.00m EN CUNETAS	m	102.06	0.00	0.00	0.00	102.0 6
08.00	SISTEMA PARA ALCANTARILLA EMISOR DE AGUAS PLUVIALES						
08.01	OBRAS PRELIMINARES						
08.01.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	616.78	0.00	616.78	616.78	0.00
08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
08.02.01	CORTES Y EXCAVACIONES						
08.02.01 .01	EXCAVACION PARA ALCANTARILLA EMISOR DE AGUAS PLUVIALES	m3	1,229. 36	0.00	1030.0 0	1,030.00	199.3 6
08.02.01 .02	EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES	und	125.30	0.00	125.30	125.30	0.00
08.02.01 .03	EXCAVACION MANUAL PARA SUMIDERO	und	69.25	0.00	6.76	6.76	62.49
08.02.01 .04	EXCAVACION DE ZANJA PARA CONEXION DE SUMIDERO	m3	195.02	0.00	162.24	162.24	32.78
08.03	NIVELACIONES						
08.03.01	REFINE Y NIVELACION EN ZANJA DE ALCANTARILLA DE AGUAS PLUVIALES	m2	624.78	0.00	511.20	511.20	113.5 8
08.03.02	REFINE Y NIVELACION EN CONEXIONES DE SUMIDEROS	m2	188.00	0.00	158.00	158.00	30.00
08.04	RELLENOS						
08.04.01	RELLENO EN ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES CON ARENA	m3	280.25	0.00	229.00	229.00	51.25
08.04.02	RELLENO PARA CONEXION DE SUMIDERO CON ARENA	m3	75.15	0.00	63.20	63.20	11.95
08.04.03	CAMA DE ARENA E=0.15 M.	m3	93.72	0.00	76.59	76.59	17.13
08.05	SUMIDEROS						
08.05.01	SUMIDERO PARA DRENAJE PLUVIAL (INC. REJILLA)	und	94.00	0.00	9.00	9.00	85.00
08.05.02	CONEXION DE SUMIDERO A RED DE DESAGUE D= 200mm. con tuberia PVC D=160 mm	und	94.00	0.00	79.00	79.00	15.00
08.06	DISIPADOR						
08.06.01	Solado 1:10; C:A e = 2"	m2	3.62	0.00	0.00	0.00	3.62
08.06.02	MORTERO F'c = 175 KG/CM2, VACEADO CON CARRETILLA	m3	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
08.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	13.54	0.00	0.00	0.00	13.54
08.06.04	Acero Corrugado Ø 1/2" f'c = 4200 Kg/cm2 + 5% desperdicios	kg	144.13	0.00	0.00	0.00	144.1 3
08.06.05	TARRAJEO PULIDO	m2	13.54	0.00	0.00	0.00	13.54




08.07	SISTEMA DE DESAGUE						
08.07.01	SISTEMA PARA ALCANTARILLA EMISOR DE AGUAS PLUVIALES						
08.07.01 .01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO-UFD=200mm	m	1,037. 97	0.00	837.74	837.74	200.2 3
08.07.01 .02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO-UFD=355mm	m	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
08.07.01 .03	SOLADO DE BUZON 1:10; C:A E=2"	m2	63.62	0.00	63.62	63.62	0.00
08.07.01 .04	BUZON DE MORTERO ARMADO ALTURA PROMEDIO 2.25 MT F'c=210kg/cm2	und	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
09.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
09.01	SUB DREN TUBO Ø 4" PVC						
09.01.01	TUBERIA PVC ISO 4422 - Ø 160.00 mm UF	m	918.00	0.00	102.00	102.00	816.0 0
10.00	VARIOS						
10.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	8,701. 38	0.00	0.00	0.00	8,701. 38

FECHA	PROGRAMADO				REAL		
	PARCIAL	%	ACUMULADO	%	PARCIAL	ACUMULADO	%
9/09/2020	716,460.74	15.47%	716,460.74	15.47%	1,091,877.31	1,091,877.31	23.58%
1/10/2020	1,219,975.87	26.34%	1,936,436.61	41.82%			
1/11/2020	1,028,936.96	22.22%	2,965,373.57	64.04%			
1/12/2020	1,056,603.20	22.82%	4,021,976.77	86.85%			
1/01/2021	571,794.04	12.35%	4,593,770.81	99.20%			
5/02/2021	37,083.88	0.80%	4,630,854.69	100.00%			
TOTAL S/.	4,630,854.69		4,630,854.69				

El suscrito en Calidad de Inspector, verifico que la documentación presentada, se encuentra conforme, debido a que se verifico que los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son compatible con la Valorización de Obra N° 01 – mes de Setiembre del 2020. Asimismo, La firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de S/.2,184 y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVICER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.

Así mismo se hace mención que tiene un avance real acumulado ejecutado de 23.58% contra un programado de 15.47%, encontrándose adelantada.

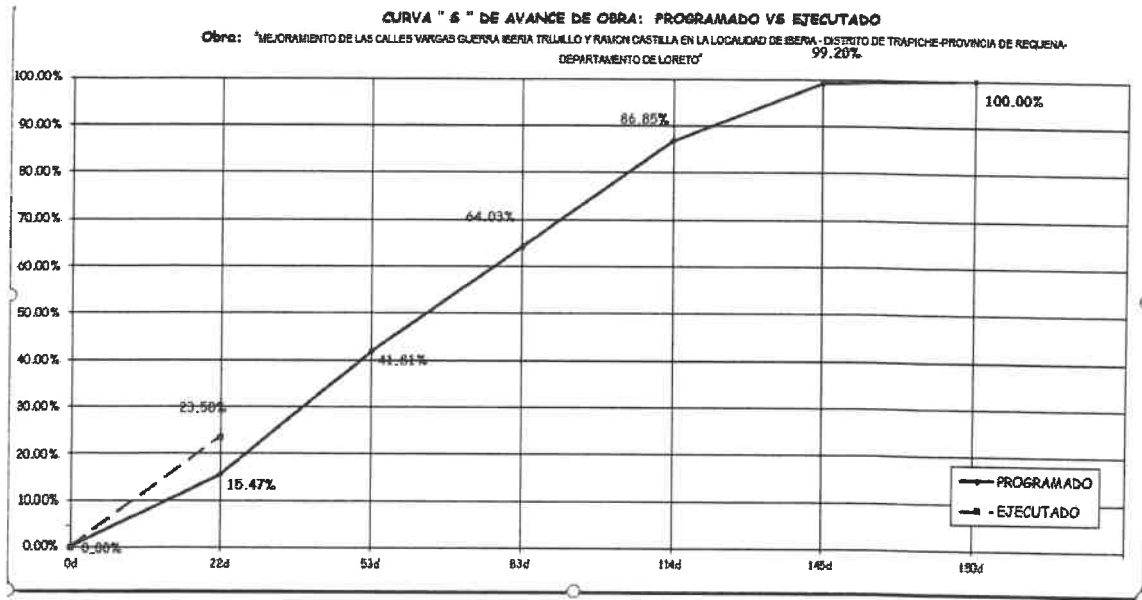

El suscrito realizo la revisión de la documentación presentada en la Valorización, los cálculos de reajustes, el cálculo de las amortizaciones de Adelanto Directo y materiales, correspondientes a la Valorización de Obra N° 01 – correspondiente al mes de Setiembre- 2020, por el cual se otorga la conformidad respectiva.

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda, tramitar el pago de la valorización Obra N° 01– correspondiente al mes de Setiembre– 2020, por un monto Neto a Pagar por la suma de **Un millón noventa y un mil ochocientos setenta y siete con 31 /100 Soles (S/.1,091,877.31 Soles)**, sin IGV; a favor del Contratista CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, por la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA IBERIA TRUJILLO Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA - DISTRITO DE TRAPICHE-PROVINCIA DE REQUENA- DEPARTAMENTO DE LORETO"; por lo que el suscrito encuentra conforme a la documentación presentada.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente


DIANA PAOLA CASTRO LITANO
Ing. Civil – Inspector de Obra
