




FECHA	PROGRAMADO				REAL		
	PARCIAL	%	ACUMULADO	%	PARCIAL	ACUMULADO	%
09/09/2020	716,460.74	15.47%	716,460.74	15.47%	1,091,877.31	1,091,877.31	23.58%
01/10/2020	1,219,975.87	26.34%	1,936,436.61	41.82%	852,268.15	1,944,145.46	41.98%
01/11/2020	1,028,936.96	22.22%	2,965,373.57	64.04%			
01/12/2020	1,056,603.20	22.82%	4,021,976.77	86.85%			
01/01/2021	571,794.04	12.35%	4,593,770.81	99.20%			
05/02/2021	37,083.88	0.80%	4,630,854.69	100.00%			
TOTAL S/.	4,630,854.69		4,630,854.69				

El suscrito en Calidad de Inspector, verifico que la documentación presentada, se encuentra conforme, debido a que se verifico que los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son compatible con la Valorización de Obra N° 02 – mes de Octubre del 2020. Asimismo, La firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de S/.1,704.54 y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVICER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.

Así mismo se hace mención que tiene un avance real acumulado ejecutado de 41.98% contra un programado de 41.81%, encontrándose adelantada.

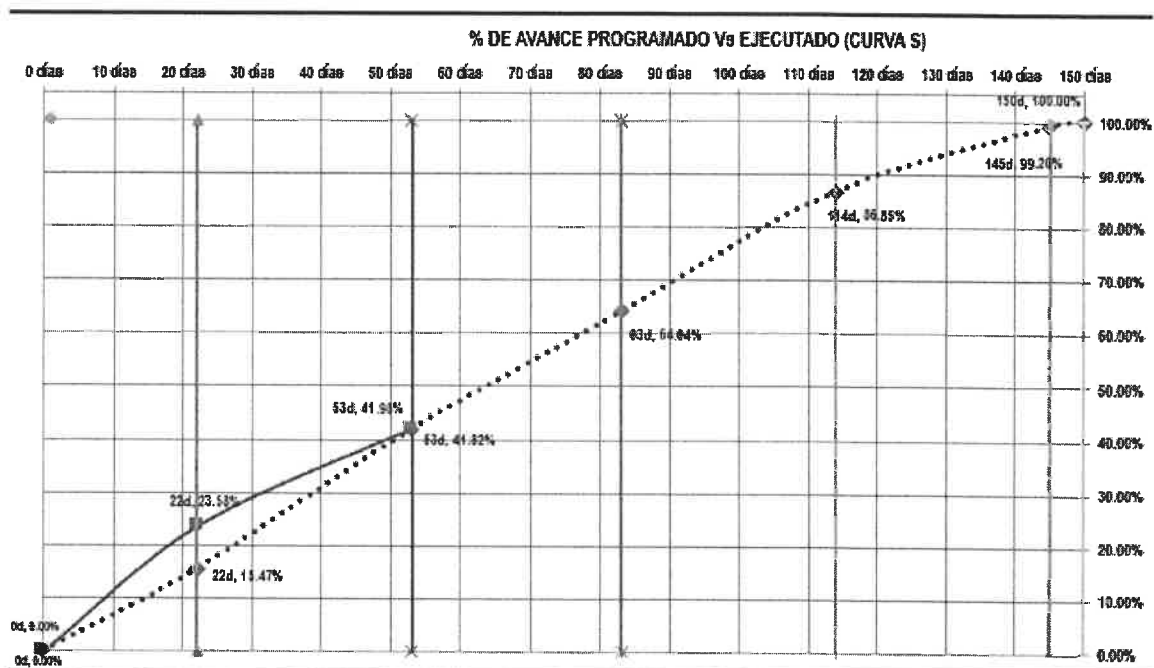

El suscrito realizo la revisión de la documentación presentada en la Valorización, los cálculos de reajustes, el cálculo de las amortizaciones de Adelanto Directo y materiales, correspondientes a la Valorización de Obra N° 01 – correspondiente al mes de octubre- 2020, por el cual se otorga la conformidad respectiva.



RECOMENDACIÓN:

Se recomienda, tramitar el pago de la valorización Obra N° 02– correspondiente al mes de octubre– 2020, por un monto Neto a Pagar por la suma **Seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y tres con 61 /100 Soles (S/657,853.61 Soles)**, sin IGV; a favor del Contratista CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, por la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA IBERIA TRUJILLO Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA - DISTRITO DE TRAPICHE-PROVINCIA DE REQUENA-DEPARTAMENTO DE LORETO”; por lo que el suscrito encuentra conforme a la documentación presentada.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente

DIANA PAOLA CASTRO LITANO
Ing. Civil – Inspector de Obra

TRAMITE: 33245



CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Ejecución de Obras Civiles en General – Alquiler de Maquinaria de Construcción
Equipos y Servicios en General.



05 NOV 2020
Fecha: _____
N° Reg: _____

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

lquitos, 02 de noviembre del 2020
33245
05 NOV 2020
Fecha Recepción
CONTROL

CARTA N° 009-2020-CCGEIRL-LCN-TG/VIAS IBERIA

Señor:
Ing. EDI WISBERTO RUIZ ZARATE
Gerente Regional de Infraestructura – GORELORETO
Atención:
Ing. Diana Paola Castro Litano
Inspector de obra - GORELORETO
Presente.-

ASUNTO :
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
REF :
05 NOV 2020
Hora: 1:43 PM
Reg. N° Regmol

REMITO VALORIZACION DE OBRA N°02 – DEL CONTRATO PRINCIPAL,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

L.P. N° 001-2020-CSO-GRL (PRIMERA CONVOCATORIA)
Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA, IBERIA,
TRUJILLO, Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA DEL
DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE
LORETO”.
CONTRATO N° 018 -2020-GRL-GGR-GRI

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del compromiso contractual, establecido con el Gobierno Regional de Loreto, respecto a la ejecución de la Obra indicada en la referencia; hacerle llegar adjunto el Informe y Valorización de Obra N°02, correspondiente al mes de octubre del 2020, de la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA, IBERIA, TRUJILLO, Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA DEL DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO”, la misma que se encuentra en EJECUCION con un Avance físico real al mes de octubre del 2020 del 18.40% y un acumulado del 41.98% según se detalla en la valorización respectiva; cuyo monto valorizado asciende a la suma de S/. 852,268.15 (Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Ocho con 15/100 Soles) sin IGV. Siendo el monto neto a cobrar por el Contratista la suma de S/. 657,853.61 (Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Tres con 61/100 Soles) sin IGV, debido a la retención por adelanto directo.

Adjunto la factura correspondiente para su respectiva cancelación.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. LAY CABALLERO NASHINATE
TITULAR GERENTE

APROVEIDO N° 33245
S.G.S.C. - GRI
PARA Aprobación del contrato
05/11/2020

ADJUNTO:
VALORIZACION N°02 DEL CONTRATO PRINCIPAL:
01 ORIGINAL – 03 COPIAS + CD
Cc./Archiv

RUC: 20528115897
REG. OSCE N° 17144
Of. Princ.: C. Tte. Cesar López N°761 – Yurimaguas

Teléfonos: (65)760402 – 991556755- 942171115
Email: caballerocontratistas@hotmail.com
Sucursal: C. Morona N° 1298 – Iquitos

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 02

OBRA: *MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA, IBERIA, TRUJILLO, Y SAN MON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA DEL DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO*

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
 RESIDENTE: ING° LAN CABALLERO NASHNATE
 INSPECTOR: ING° DIANA PAOLA CASTRO LITANO
 UBICACIÓN: TAPICHE - REQUENA - LORETO
 FECHA: OCTUBRE DEL 2020

PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL: S/5,059,595.67 CON IGV
 PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 4,630,854.69 SIN IGV

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCE				SALDO			
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	ANTERIOR		ACTUAL		Metrado	%	Valorizado S/.	%
						Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.				
07.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE												
07.01	SARDINEL												
7.01.01	MORTERO F' c= 175kg/cm2	m3	211.97	513.32	108,808.44	0.00	0.00	17,612.01	34.31	17,612.01	16.19%	177.66	83.81%
7.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	1,787.03	29.33	52,413.59	0.00	0.00	8,136.14	277.40	8,136.14	15.52%	1,509.63	84.48%
7.01.03	FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" Inc. 5% desp.	kg	8,705.00	5.45	47,442.25	0.00	0.00	6,036.86	1,107.68	6,036.86	12.72%	7,597.32	87.28%
7.01.04	TARRAJEO PULIDO EN SARDINELES	m2	529.93	19.62	10,397.23	0.00	0.00	1,653.18	84.26	1,653.18	15.90%	445.67	84.10%
7.01.05	JUNTA DE DILATACION 1" @ 9.00m EN SARDINEL	m	117.76	8.76	1,031.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	117.76	100.00%
07.02	CUNETAS												
07.02.01	CAMA DE ARENA ANTICONTAMINANTE EN CUNETAS e=0.05m	m3	52.99	114.88	6,087.49	0.00	0.00	967.29	8.42	967.29	15.89%	44.57	84.11%
07.02.02	MORTERO F' c= 175kg/cm2	m3	90.09	513.32	46,245.00	0.00	0.00	7,350.74	14.32	7,350.74	15.90%	75.77	84.10%
07.02.03	FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" Inc. 5% desp.	kg	6,824.37	5.45	37,737.82	0.00	0.00	4,661.00	855.23	4,661.00	12.35%	6,069.14	87.65%
07.02.04	TARRAJEO PULIDO EN CUNETAS	m2	918.54	21.80	20,024.17	0.00	0.00	350.11	16.06	350.11	1.75%	902.48	98.25%
07.02.05	JUNTA DE DILATACION 1" @ 9.00m EN CUNETAS	m	102.06	12.55	1,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	102.06	100.00%
08.00	SISTEMA PARA ALCANTARILLA EMISOR DE AGUAS PLUVIALES												
08.01	OBRAS PRELIMINARES												
08.01.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	616.78	1.59	980.68	616.78	980.68	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	0.00%
08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
08.02.01	CORTES Y EXCAVACIONES												
08.02.01.01	EXCAVACION PARA ALCANTARILLA EMISOR DE AGUAS PLUVIALES	m3	1,229.36	55.28	67,959.02	1030.00	56,938.40	0.00	0.00	0.00	83.78%	199.36	16.22%
08.02.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES	und	129.30	55.28	6,926.58	125.30	6,926.58	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	0.00%
08.02.01.03	EXCAVACION MANUAL PARA SUMIDERO	und	69.25	55.28	3,828.14	6.76	373.69	11.20	17.96	992.83	25.94%	51.29	74.06%
08.02.01.04	EXCAVACION DE ZANJA PARA CONEXION DE SUMIDERO	m3	195.02	55.28	10,780.71	162.24	8,968.63	0.00	0.00	0.00	83.19%	32.78	16.81%
08.03	NIVELACIONES												
08.03.01	REFINE Y NIVELACION EN ZANJA DE ALCANTARILLA DE AGUAS PLUVIALES	m2	624.78	5.51	3,442.54	511.20	2,816.71	0.00	0.00	0.00	81.82%	113.58	18.18%
08.03.02	REFINE Y NIVELACION EN CONEXIONES DE SUMIDEROS	m2	188.00	5.51	1,035.88	158.00	870.58	0.00	0.00	0.00	84.04%	30.00	15.96%
08.04	RELLENOS												
08.04.01	RELLENO EN ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES CON ARENA	m3	280.25	158.54	44,430.84	229.00	36,305.66	0.00	0.00	0.00	81.71%	51.25	18.29%
08.04.02	RELLENO PARA CONEXION DE SUMIDERO CON ARENA	m3	75.15	158.54	11,914.28	63.20	10,019.73	0.00	0.00	0.00	84.10%	11.95	15.90%
08.04.03	CAMA DE ARENA E=0.15 M.	m3	93.72	114.88	10,766.55	76.39	8,798.66	0.00	0.00	0.00	81.72%	17.13	18.28%
08.05	SUMIDEROS												
08.05.01	SUMIDERO PARA DRENAJE PLUVIAL (INC. REJILLA)	und	94.00	559.09	52,554.46	9.00	5,031.81	15.00	8,386.35	24.00	25.53%	70.00	74.47%
08.05.02	CONEXION DE SUMIDERO A RED DE DESAGUE D= 200mm; con tuberia PVC Ø 110	und	94.00	181.13	17,026.22	59.00	10,609.57	0.00	0.00	0.00	84.04%	15.00	15.96%
08.06	DISIPADOR												
08.06.01	Mortero 1:10; C:A e = 2"	m2	3.62	319.47	1,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3.62	100.00%
08.06.02	MORTERO F' C = 175 KG/CM2, VACEADO CON CEMENTO PORTLAND	m3	3.95	569.43	2,250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3.95	100.00%
08.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m3	13.54	29.33	397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13.54	100.00%
08.06.04	Acero Corrugado Ø 1/2" f' c = 4200 Kg/cm2 + 5% desperdicio	kg	144.13	4.94	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	144.13	100.00%
08.06.05	TARRAJEO PULIDO	m2	13.54	21.80	295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13.54	100.00%
08.07	SISTEMA DE DESAGUE												
08.07.01	SISTEMA PARA ALCANTARILLA EMISOR DE AGUAS PLUVIALES												
08.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO-UFD=200mm	m	1,037.97	55.45	57,555.44	837.74	46,452.68	0.00	0.00	0.00	80.71%	200.23	19.29%
08.07.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO-UFD=355mm	m	10.00	110.90	1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00	100.00%
08.07.01.03	SOLADO DE BUZON 1:10; C:A E=2"	m2	63.62	319.47	20,324.68	63.62	20,324.68	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	0.00%
08.07.01.04	BUZON DE MORTERO ARMADO ALTURA PROMEDIO 2.25 MT F' c=210kg/cm2	und	36.00	2,345.96	84,454.56	36.00	84,454.56	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00	0.00%
09.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
09.01	SUB DREN TUBO Ø 4" PVC												
09.01.01	TUBERIA PVC ISO 4422 - Ø 160.00 mm UF	m	918.00	40.31	37,004.58	102.00	4,111.62	127.50	5,139.53	229.50	25.00%	688.50	75.00%

DIANA PAOLA CASTRO LITANO
 INGENIERA CIVIL
 R.C.I.P. N° 88472
 Residente de obra

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 02

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA, IBERIA, TRUJILLO, Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA DEL DISTRITO DE TAPICHE - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO"

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL.
RESIDENTE: ING° LAN CABALLERO NASHNATE
INSPECTOR: ING° DIANA PAOLA CASTRO LITANO
UBICACIÓN: TAPICHE - REQUENA - LORETO
FECHA: OCTUBRE DEL 2020

PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS CALENDARIOS
VALOR REFERENCIAL S/. 5,059,595.67 CON IGV
PRESUPUESTO CONTRATADO: S/. 4,630,854.69 SIN IGV

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				ANTERIOR				AVANCE				ACUMULADO		SALDO	
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%
10.00	VARIOS																
10.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	8,701.38	1.72	14,966.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,701.38	14,966.37	100.00%	
	COSTO DIRECTO (CD)				3,859,045.57		909,897.75		710,223.45		0.00				1,620,121.20		
	GASTOS GENERALES (10% de CD)				385,904.56		90,989.78		71,022.35		0.00				162,012.13		
	UTILIDAD (10% de CD)				385,904.56		90,989.78		71,022.35		0.00				162,012.13		
	TOTAL DEL PRESUPUESTO				4,630,854.69		1,091,877.31		852,268.15		18.40%				1,944,145.46		
	PROCENTAJE DE AVANCE DE OBRA				100.00%		23.56%		18.40%						41.98%		


DIANA PAOLA CASTRO LITANO
INGENIERA CIVIL
REG. CIP N° 162223


LAN CABALLERO NASHNATE
INGENIERO CIVIL
R. CIP N° 88472
Residente de obra
