




6. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA

GRÁFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA - VAL Nº 03
PROGRAMADO VS EJECUTADO

Obra :	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN CON POSTES DE CONCRETO EN EL CASERÍO SARAYACU DEL DISTRITO DE SARAYACU - PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO
Ubicación :	DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO

FECHA	PRESUPUESTO OBRA				PRESUPUESTO VALORIZADO				AVANCE / ATRAZO		
	PROGRAMADO	ACUMULADO	%	% ACUM.	EJECUTADO	ACUMULADO	%	% ACUM.	RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO		
		PROGRAMADO				EJECUTADO			%	DESCRIP	
INICIO	JULIO 2020	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
VAL N° 01	AGOSTO 2020	102,187.30	102,187.30	20.04%	20.04%	134,108.33	134,108.33	26.30%	26.30%	6.26%	ADELANTADO
VAL N° 02	SEPTIEMBRE 2020	283,786.91	385,974.21	55.64%	75.68%	329,425.54	463,533.87	64.59%	90.89%	15.21%	ADELANTADO
VAL N° 03	OCTUBRE 2020	124,033.78	510,007.99	24.32%	100.00%	46,474.12	510,007.99	9.11%	100.00%	0.00%	CULMINADA
TOTAL		510,007.99			TOTAL	510,007.99		100.00%			

GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES
PROGRAMADO VS EJECUTADO

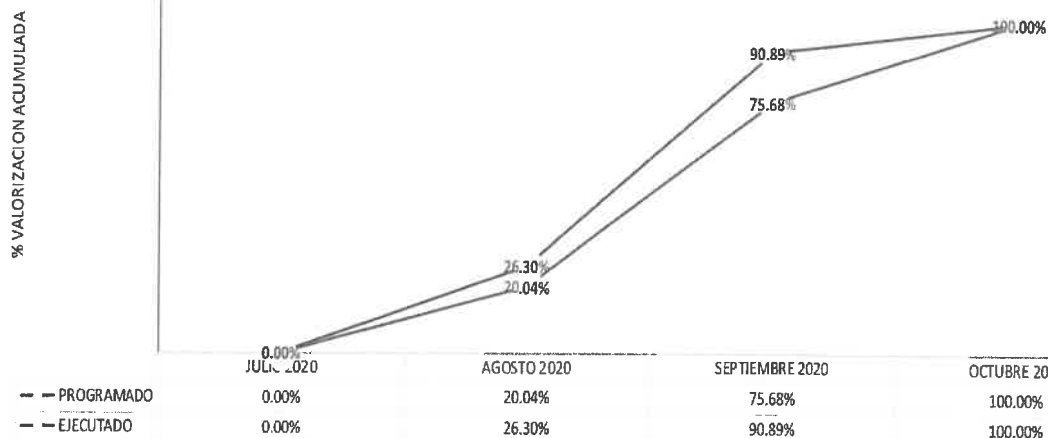



7. CONCLUSIONES

La Obra al Mes de Octubre del 2020, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 100 % respecto a un avance programado de 100 %, encontrándose TERMINADA como OBRA CULMINADA.

En concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de **cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro y 12 /100 Soles (S/. 46,474.12), SIN/IGV, de acuerdo al siguiente detalle:**

Valorización 03 Bruta Octubre 2020	S/. 46,474.12
Reajuste	
Por adelanto directo	-
Por adelanto de materiales	-
Amortizaciones	
Por Adelanto Directo	(0.00)
Por Adelanto de Materiales	(0.00)
IGV 18.00 %	(0.00)
Monto Neto a Pagar	46,474.12

8. RECOMENDACIÓN

Al contar con la opinión favorable y validación del monto consignado por parte del Inspector de la Obra, se otorga conformidad y se recomienda tramitar el pago de la valorización N° 03 de ejecución de obra: **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO EN EL CASERIO SARAYACU, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO"**. Correspondiente al mes de octubre del 2020, por **cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro y 12 /100 Soles (S/. 46,474.12), SIN/IGV, a favor del contratista CONSORCIO SARAYAQUILLO.**

Se acredita pago a SENCICO por S/. 95.95 y se adjunta copia del Voucher de pago por Seguro Contra Todo Riesgo, ES SALUD y CONAFOVICER. Se adjunta el comprobante de pago o factura de la valorización.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

KENYO ALBERTO
MONTES CUELLAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 196722

Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
Inspector de Obra
Sub Gerencia de Supervisión y Control

Cc: Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar

Trámite: 32010

CONSORCIO SARAYAQUILLO

77

RUC N° 20606021136

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Coronel Portillo, 24 de Octubre del 2020

CARTA N° 008-2020-CS

Señor:

Ing. Edi Wisberto Ruíz Zarate
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Presente:



ATENCIÓN : ING. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR
Inspector de Obra

ASUNTO : REMITO VALORIZACIÓN N° 03 – OCTUBRE 2020

REF : a).- CONTRATO N° 018-C-2020-GRL-GGR-GRI
Obra: Mejoramiento del Sistema de Sarayacu
Electrificación con Postes de Concreto en el
Caserío del Distrito de Sarayacu – Provincia de
Ucayali, Departamento de Loreto.

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a Usted, a fin de hacerle llegar la Valorización N° 03, correspondiente al mes de octubre del 2020, de la obra en referencia.

Seguro de contar con la atención debida a lo solicitado quedamos de usted.



Atentamente,

CONSORCIO SARAYAQUILLO
Paola Campos
PAOLA CAMPOS DAVILA
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO

01 A/P
03 file

PROVEIDO N° 32010
A: SGSyc
PARA Atención



PROVEIDO N° 32010
A: Ing Kenyo Montes
PARA: Su
Atención



VALORIZACION N°03 OCTUBRE 2020

Proyecto : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION CON POSTES DE CONCRETO EN EL CASERIO SARAYACU, DISTRITO DE SARAYACU, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO LORETO"

RESIDENTE: ING. ROLANDO WILLIAM CANORIO VASQUEZ
INSPECTOR: ING. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA N° 018-C-2020-GRL-GGR-GRI
MONTO CONTRACTUAL: 510,007.99

VALORIZACION N°03 OCTUBRE 2020

Item	Materiales	TOTAL			ACUMULADO ANTERIOR			AVANCE DEL MES			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR			
		Unidad	Cantidad	Precio \$/.	Total \$/.	Cantidad	P. TOTAL \$/	%	Cantidad	P. TOTAL \$/	%	Cantidad	P. TOTAL \$/	%	Cantidad	P. TOTAL \$/	%
01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES																
01.01	ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	m ²	40.00	76.00	3,040.00	40.00	3,040.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	40.00	3,040.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.02	CARTEL DE OBRA TIPO GIGANTOGRAFIA DE (3.00 x 2.40 m.)	und	1.00	1,015.65	1,015.65	1.00	1,015.65	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,015.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.03	CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS	und	2.00	300.00	600.00	2.00	600.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	600.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
01.04	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PRED SECUNDARIA - CASETA DE FUERZA (DESDE EL PUERTO DE PUCALLPA HASTA EL SEGURIDAD Y SALUD	gls	1.00	48,193.00	48,193.00	1.00	48,193.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	48,193.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
02	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gls	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	20.00	117.00	2,340.00	20.00	2,340.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20.00	2,340.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gls	1.00	737.80	737.80	1.00	737.80	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	737.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%
02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO	gls	1.00	352.38	352.38	1.00	352.38	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	352.38	100.00%	0.00	0.00	0.00%
02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	2.00	1,500.00	3,000.00	1.50	2,250.00	25.00%	0.50	750.00	25.00%	2.00	3,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURAN RED SECUNDARIA CON POSTES DE CONCRETO	gls	1.00	1,310.00	1,310.00	1.00	1,310.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,310.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03	OBRAS PRELIMINARES																
03.01.01	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	m ^l	2,985.67	1.71	5,105.50	2,985.67	5,105.50	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,985.67	5,105.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
03.02.01	EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES EN TERRENO SUELTO	und	113.00	58.51	6,611.63	113.00	6,611.63	0.00%	0.00	0.00	0.00%	113.00	6,611.63	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.02.02	EXCAVACION DE HOYOS PARA RETENIDA EN TERRENO SUELTO	und	38.00	78.02	2,964.76	38.00	2,964.76	0.00%	0.00	0.00	0.00%	38.00	2,964.76	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.02.03	EXCAVACION DE HOYOS PARA PUESTA A TIERRA EN TERRENO SUELTO	und	23.00	117.01	2,691.23	23.00	2,691.23	0.00%	0.00	0.00	0.00%	23.00	2,691.23	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES																
03.03.01	TRANSPORTE DE POSTES DEL ALMACEN AL PUNTO DE IZAJE	und	113.00	66.18	7,478.34	113.00	7,478.34	0.00%	0.00	0.00	0.00%	113.00	7,478.34	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.03.02	POSTES DE C.A.C. 8/200/120/240	34	34.00	669.21	22,753.14	34	22,753.14	0.00%	0.00	0.00	0.00%	34.00	22,753.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.03.03	POSTES DE C.A.C. 8/200/120/240	und	79.00	639.21	50,487.59	79	50,487.59	0.00%	0.00	0.00	0.00%	79.00	50,487.59	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS																
03.04.01	ARMADO DE ALINEAMIENTO (a)	gls	76.00	64.40	76	4,894.40	0.00%	0.00	0.00	0.00%	76.00	4,894.40	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
03.04.02	ARMADO DE FIN DE LINEA (b)	gls	14.00	76.40	1,069.60	14.00	1,069.60	0.00%	0.00	0.00	0.00%	14.00	1,069.60	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.04.03	ARMADO DE FIN DE LINEA CON DERIVACION (c)	gls	16.00	95.40	1,526.40	12.00	1,144.80	25.00%	4.00	381.60	25.00%	16.00	1,526.40	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.04.04	ARMADO DE ALINEAMIENTO Y DERIVACION (d)	gls	5.00	122.85	614.25	5.00	614.25	40.00%	2.00	1,847.80	40.00%	7.00	819.25	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.04.05	ARMADO DE ANCLAJE CON DERIVACION (e)	gls	2.00	153.85	307.70	1	153.85	50.00%	1.00	153.85	50.00%	2.00	307.70	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.04.06	ARM. ARMADO DE DOBLE ANCLAJE CON DERIVACION (f)	gls	3.00	132.85	397.95	1.00	132.85	66.67%	2.00	265.30	66.67%	3.00	397.95	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES ELECTRICOS																
03.05.01	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE AL. 3x35+X1805mm ²	m	1,033.37	14.13	14,777.62	1,033.37	14,777.62	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,033.37	14,777.62	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.05	CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE AL. 3x25+X1805mm ²	m	1,882.30	11.13	22,063.00	1,882.30	22,063.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,882.30	22,063.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.06.01	INSTALACION DE RETENIDA INCLINADA P/POSTES DE 8m.	gls	34.00	385.77	13,458.18	34.00	13,458.18	0.00%	0.00	0.00	0.00%	34.00	13,458.18	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA	gls	4.00	485.93	1,943.72	4.00	1,943.72	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	1,943.72	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.07.01	PUESTA A TIERRA CON VARILLA COOPERWELD	gls	23.00	841.19	14,747.37	23	14,747.37	0.00%	0.00	0.00	0.00%	23.00	14,747.37	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	gls	113.00	448.52	50,682.76	113.00	50,682.76	0.00%	0.00	0.00	0.00%	113.00	50,682.76	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.09	CODIFICACION DE POSTES	gls	113.00	34.77	3,929.01	0	0.00	100.00%	113.00	3,929.01	100.00%	113.00	3,929.01	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.09.01	CODIFICACION DE POSTES, PINTADO DE SIMBOLO DE ADVERTENCIA Y TIERRA	gls	113.00	34.77	3,929.01	0	0.00	100.00%	113.00	3,929.01	100.00%	113.00	3,929.01	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	und	188.00	165.35	27,445.10	188.00	27,445.10	0.00%	0.00	0.00	0.00%	188.00	27,445.10	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.10.01	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CORTAS	und	188.00	204.04	5,016.76	10.00	2,640.40	47.37%	9.00	2,376.36	47.37%	198.00	5,016.76	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.11	INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO 100 KW, 380/220 V	gls	1.00	75,977.45	75,977.45	1.00	75,977.45	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	75,977.45	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.12	PRUEBAS ELECTRICAS																
03.12.01	PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD	gls	1.00	1,235.12	1,235.12	0.00	0.00	100.00%	1.00	1,235.12	100.00%	1.00	1,235.12	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.12.02	PRUEBAS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	gls	1.00	1,235.12	1,235.12	0	0.00	100.00%	1.00	1,235.12	100.00%	1.00	1,235.12	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.13	MITIGACION AMBIENTAL																
03.13.01	MEDIDA DE PREVENION	gls	1.00	1,186.44	1,186.44	1	1,186.44	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,186.44	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.13.01.01	EDUCACION AMBIENTAL	gls	1.00	1,186.44	1,186.44	1	1,186.44	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,186.44	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.13.01.01.01	CAPACITACION A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	gls	1.00	1,186.44	1,186.44	1	1,186.44	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	1,186.44	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.13.02	MEDIDAS DE CONTROL																
03.13.02.01	SEÑALIZACION	und	1.00	75.89	75.89	1.00	75.89	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	75.89	100.00%	0.00	0.00	0.00%
03.13.02.01.01	LETREOS INFORMATIVOS, PREVENTIVOS Y DE REGLAMENTACION	und	1.00	75.89	75.89	1.00	75.89	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	75.89	100.00%	0.00	0.00	0.00%


Rolando W. Canorio Vasquez
 Asistente de Obra
 CIP N° 76038


CONSORCIO SARAYAQUILLO
 Sarayaquillo
 AV. TAPALCAYAN 1000
 DEPARTAMENTO DE UCAYALI

