



"Año de la Universalización de la Salud"

Belén, 30 de noviembre de 2020

Oficio n.º 2164-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate.
Gerente Regional de Infraestructura.
Presente

Asunto: Remite Valorización
OCTUBRE 2020

Obra: "Construcción de vías
Alfonso Ugarte y calle buenav
m-1.09 km distrito de Cont
departamento de Loreto"

Ref. : a. Informe n.º 122-2020-GR
b. Carta n.º 20-2020-JKP-C

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle
Valorización n.º 02 por ejecución de obra, que asciende a la **S/**
cuatrocientos sesenta y uno con 86/100 soles) (S/36,461.86) a
el inspector, mediante la referencia a), **correspondiente al mes**
de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N.º 02	S/	36,4
Reajuste de fiel cumplimiento	S/	
Amortización Adelanto Directo	S/	
Amortización Adelanto por Materiales	S/	
Deducción Reaj. Que No Corresp. A/D	S/	
Deducción Reaj. Que No Corresp. A/M	S/	
Neto a Pagar	S/	36,4

Asimismo, la ejecución de la obra a **OCTUBRE** del 2020 tiene
acumulado de **56.58%** versus un programado de **65.41%**
ATRASADA y en ejecución.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar
favor de **CONSORCIO UCAYALI** conforme lo detallan los do

Atentamente.

Copia: Inspector de Obra
Ing. dpcl
SGSyC - File de obra (01)
SGSyC - File correlativo (01)
SGSyC - File personal (01)
TRAMITE: 33444
RFA/dap

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHC
Sub Gerente de Supervisión y Control

A Santana Obra
PARA: O.C.L.



INFORME N°122-2020-GRL/GRI/SGSyC/DPCL

AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho
Sub Gerente de Supervisión y Control.

DE : Ing. Diana Paola Castro Litano
Inspector de Obra.

ASUNTO : **VALORIZACION DE OBRA N° 02- MES DE OCTUBRE DEL 2020.**
OBRA.- "CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE ALFONSO UGARTE Y CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ L: 1,090.15 M-1.09 KM DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO".



REFERENCIA: a) CARTA N°20-2020-JKP-CU/ CONSORCIO UCAYALI
TRAMITE: 33444

FECHA : Iquitos, 06 de noviembre del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentación presentada por el contratista de obra referente a la Valorización de Obra N°02, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2020, que mediante Proveído N°33444 de la SGSyC, se solicita su revisión e informe correspondiente.

1. ANTECEDENTES :

Mediante CARTA N°20-2020-JKP-CU/ CONSORCIO UCAYALI remite toda la documentación relacionada a la obra descrita líneas arriba con respecto a la Valorización de Obra N°02 mes de octubre del 2020, de la Obra: "CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE ALFONSO UGARTE Y CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ L: 1,090.15 M-1.09KM DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI DEPARTAMENTO 7DE LORETO"; La cual asciende al monto **36,461.86** soles.

GENERALIDADES:

Del Contratista:

Nombre de la obra : "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Alfonso Ugarte y calle buenaventura Márquez I: 1,090.15 m-1.09 km distrito de Contamana, provincia Ucayali, departamento de Loreto"

Ubicación : Distrito de Contamana, provincia Ucayali departamento de Loreto"

Entidad : Gobierno Regional de Loreto

Contrato : N° 16-B -2020-GRL-GGR-GRI

Firma de Contrato : 13 de marzo del 2020

Valor Contratado : S/. 311,222.98

Valor Referencial : S/. 311,222.98

Ubicación : Distrito de Contamana.

Otorgamiento de Buena Pro : 24/02/2020



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

Plazo Contratado : 60 días Calendarios
 Contratista : Consorcio Ucayali
 Modalidad de Ejecución : A precios unitarios.
 Representante Común : José Antonio Padilla Koo

2. CONTROL DE AVANCE DE OBRA.


El Residente de Obra manifiesta en su informe que el avance de obra presentado para la **valorización N°02 OCTUBRE** de 2020 que su porcentaje de avance de obra programado acumulado es de **65.41%** mientras que su porcentaje de avance de obra ejecutado acumulado es de **56.58%** lo cual indica que la obra se encuentra **ATRASADA**.

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCE							SALDO					
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			Metrado	Valorizado S/	%			
						Metrado	Valorizado S/	Metrado	Valorizado S/	Metrado	Valorizado S/	%						
01	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE PALESTINA, CALLE BELLAVISTA, CALLE MARACAN Y CALLE BELEN DEL AA HH. PADRE ZAPICO RAMOS - CONTAMANA L=1.691.40 ML. - 1.69 KM																	
01.01	OBRAS PROVISIONALES																	
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40M X 3.60M INCL MARCO DE 2"x2", BASTIDORES, GIGANTOGRAFIA Y COLOCACION	und	1.00	923.65	923.65	1.00	923.65	0.00	0.00	1.00	923.65	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
01.01.02	ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	mes	2.00	500.00	1,000.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	Und	1.00	3,000.00	3,000.00	0.50	1,500.00	0.00	0.00	0.50	1,500.00	50.00%	0.50	1,500.00	50.00%			
01.02	OBRAS PRELIMINARES							0.00										
01.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	6,540.90	2.88	18,837.79	6540.90	18,837.79	0.00	0.00	6,540.90	18,837.79	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
01.02.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA	m2	5,450.75	3.29	17,932.97	3450.75	17,932.97	0.00	0.00	5,450.75	17,932.97	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							0.00										
01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA	km	1.09	1,866.68	2,034.68	1.09	2,034.68	0.00	0.00	1.09	2,034.68	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
01.03.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-FASANTE	m2	7,631.05	5.60	42,733.88	7631.05	42,733.88	0.00	0.00	7,631.05	42,733.88	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
01.03.03	CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES	m	2,180.30	6.45	13,408.85	2180.30	13,408.85	0.00	0.00	2,180.30	13,408.85	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPOS	m3	992.30	16.23	16,105.03	992.30	16,105.03	0.00	0.00	992.30	16,105.03	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
01.04	AFIRMADO																	
01.04.01	AFIRMADO DE PLATAFORMA DE RODADURA E=16 CM (80% H. + 20% T.R.)	m2	5,450.75	25.96	141,501.47	0.00	0.00	1,170.45	30,384.88		30,384.88			111,116.59				
01.05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA									1,170.45		21.47%	4,280.30			73.53%		
01.05.01	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL	Und	1.00	510.00	510.00	1.00	510.00	0.00	0.00	1.00	510.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
01.05.02	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA	Und	1.00	725.00	725.00	1.00	725.00	0.00	0.00	1.00	725.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
01.05.03	EQUIPO TEMPORAL DE SEGURIDAD	Und	1.00	640.00	640.00	1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%			
	COSTO DIRECTO (CD)				259,351.32		116,361.85		30,384.88		146,736.73			112,616.59				
	GASTOS GENERALES (10% de CD)				25,935.33		11,636.19		3,038.49		14,673.67			11,261.66				
	UTILIDAD (10% de CD)				25,935.33		11,636.19		3,038.49		14,673.67			11,261.66				
	sub total				311,223.98		139,622.23		36,461.86		176,084.07			135,139.91				
	factor de relacion		1.000000		311,223.98		139,622.23		36,461.86		176,084.07			0.00				
	TOTAL DEL PRESUPUESTO				311,223.98		139,622.23		36,461.86		176,084.07			135,139.91				
	PROCENTAJE DE AVANCE DE OBRA				100.00%		44.86%		11.72%		56.58%			43.42%				





CURVA S – PROGRAMADO V/S EJECUTADO

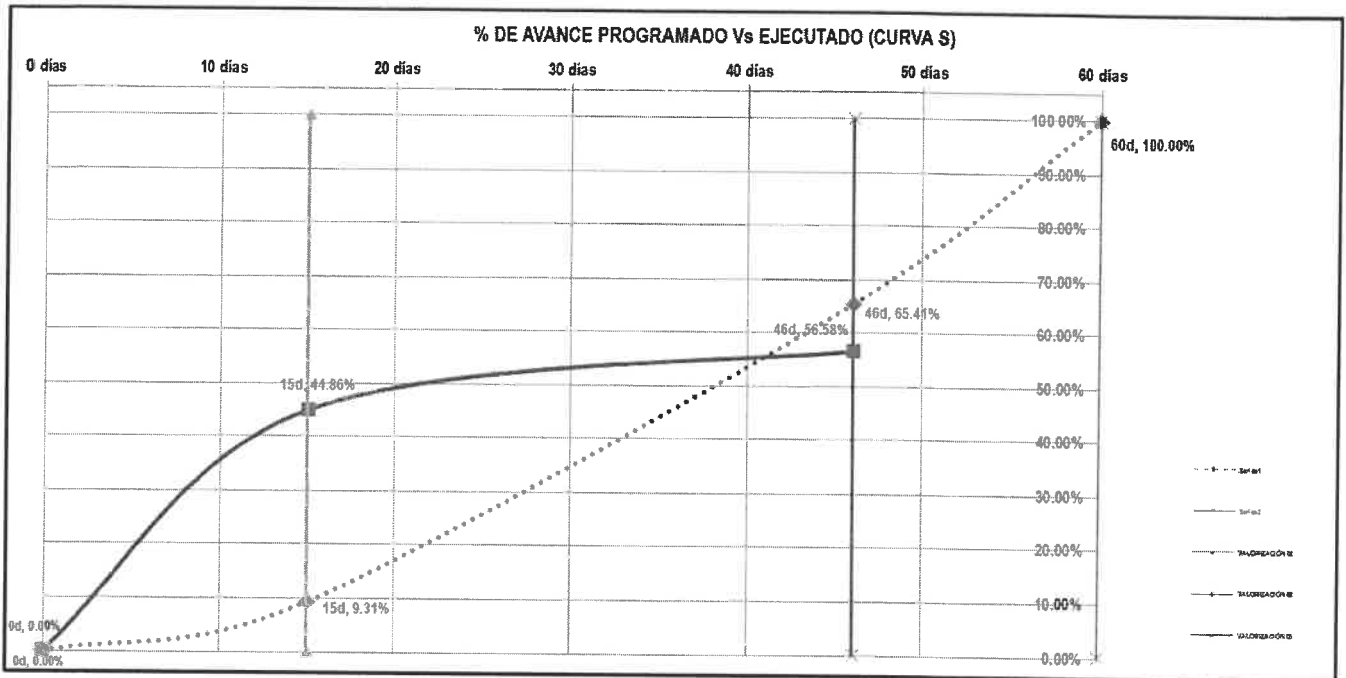

3. CONCLUSIONES:

- La presente documentación materia de su revisión, consta con los requerimientos y sustentos que derivan a la presente valorización.
- En la documentación, se adjuntan las boletas de pagos realizados a **SENCICO**, de acuerdo al porcentaje que estima la legislación vigente, pago de póliza **SCTR**.
- El avance físico del mes es: **11.72 %**
- El avance programado al mes de **56.10 %**.
- En este caso la Valorización Acumulada Ejecutada alcanzo el **56.58%**, mientras que la Valorización Acumulada Programada es del **65.41%**.
- Es por ello que en esta 2da Valorización correspondiente al mes de octubre-2020, la Ejecución de la obra se encuentra **ATRASADA**.



4. RECOMENDACIONES:


- Los metrados han sido conciliados por el Residente e Inspector de Obra por lo mismo que Da Conformidad a la **Valorización N°02** correspondiente al mes de **OCTUBRE**, de la obra "CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE ALFONSO UGARTE Y CALLE BUENAVENTURA MARQUEZ L: 1,090.15 M-1.09KM DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI DEPARTAMENTODE LORETO".
- Visto la Valorización N°02 correspondiente al mes de OCTUBRE 2020 por lo que se le da conformidad, y se recomienda el pago correspondiente a la empresa **CONSORCIO UCAYALI**, siendo el monto a pagar de **S/ 36,461.86 (treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y uno con 86/100 soles)** sin IGV, como se detalla:

Valorización bruto N°02- octubre del 2020	S/	36,461.86
Reajuste de fiel cumplimiento	S/	0.00
Deducción	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Neto Facturar	SI.	36,461.86

Se recomienda seguir los procedimientos de acuerdo al RLCE artículo 194, y continuar con su trámite correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente


Ing. DIANA PAOLA CASTRO LITANO
Inspector de Obra
Sub Gerencia de Supervisión y Control



CARTA N° 20-2020-JPK-CU

Sr. (es): Gerente Regional de Infraestructura
EDI WISBERTO RUIZ ZARATE
Presente.-

33444
05 NOV 2020

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
06 NOV 2020
Hora: 2:07 pm
Reg. N°
Reymal

Asunto : Remito Valorizaciones de Obra N° 02,
Correspondiente al mes de Octubre del 2020

Referencia: a) Contrato N° 16-B-2020-GRL-GGR-GRI
b) Contrato N° 16-C-2020-GRL-GGR-GRI
c) Contrato N° 16-D-2020-GRL-GGR-GRI

Obras : "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Alfonso Ugarte y calle Buenaventura Marquez I: 1,090.15 m-1.09 km distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto",

"Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Circunvalacion, calle Juan Pablo II, calle Luis Rengifo Alvarado y calle Roldan Tuesta Ruiz del Barrio Shiringal – l=1,307.57 ml – 1.31 km – Distrito de Contamana – Provincia de Ucayali – Departamento de Loreto",

"Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Palestina, calle Bellavista, calle Maracana y calle belen – aa.hh. Padre Zapico Ramos l=1,691.40 m-1.69 km, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto".

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del compromiso contractual, establecido con el Gobierno Regional de Loreto, respecto a las ejecuciones de la Obras indicadas en la referencia ; hacerle llegar adjunto los Informes y Valorizaciones N° 02, correspondiente al mes de Octubre del 2020, de la ejecución de las obras: "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Alfonso Ugarte y calle Buenaventura Marquez I: 1,090.15 m-1.09 km distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto", "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Circunvalacion, calle Juan Pablo II, calle Luis Rengifo Alvarado y calle Roldan Tuesta Ruiz del Barrio Shiringal – l=1,307.57 ml – 1.31 km – Distrito de Contamana – Provincia de Ucayali – Departamento de Loreto", "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Palestina, calle Bellavista, calle Maracana y calle belen – aa.hh. Padre Zapico Ramos l=1,691.40 m-1.69 km, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto"., las mismas que se encuentra en EJECUCION.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente

ADJUNTO:
VALORIZACIONES N°02
01 ORIGINAL – 03 COPIAS + CD
Cc./Archiv

CONSORCIO UCAYALI
José Antonio Padilla Kusi
Representante Legal Común

PROVEIDO N° 33444
A: S6 SEC
PARA: Informe

Teléfonos: 961603114

Email: jpadillakoo@yahoo.com

Of. Princ: Jr. Yurimaguas N° 250-Int. 1-Calleria – Coronel Portillo – Ucayali.

CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 02

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE ALFONSO UGARTE Y CALLEBUENAVENTURA MARQUEZ L. 1,090.15 M-1.09 KM DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO"

PROPIETARIO: DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO
CONTRATISTA: CONSORCIO UCAYALI
RESIDENTE: JOSE HERMINIO QUINTANA ACUÑA
INSPECTOR: ING° DIANA PAOLA CASTRO LITANO
UBICACIÓN: Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto.
FECHA: OCTUBRE DEL 2020

PRESUPUESTO CONTRATADO: S/.311,223.98 SIN IGV
FACTOR DE RELACION: 1.00

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANCE				SALDO				
		Und.	P. Unit.	Presup.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO				
					Meitrado	Valorizado S/.	Meitrado	Valorizado S/.	Meitrado	Valorizado S/.	%	%	
01	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE PALESTINA, CALLE BELAVISTA, CALLE MAPACAN Y CALLE BELÉN DEL AA.HH. PADRE ZAPICO RAMOS - CONTAMANA L=1,691.40 M.-1.69 KM												
01.01	OBRAS PROVISIONALES												
01.01.01	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE 3.00 MTS DE ANCHO DE 100 M. BARRIO DE LA MANTACARRERA Y COLONIAL	und	923.65	923.65	1.00	923.65	0.00	0.00	1.00	923.65	100.00%	0.00	0.00%
01.01.02	ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	mss	500.00	1,000.00	2.00	1,000.00	0.00	0.00	2.00	1,000.00	100.00%	0.00	0.00%
01.01.03	MOVILIZACION Y LOGISTICA DE MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA	Und	3,000.00	3,000.00	0.50	1,500.00	0.00	0.00	0.50	1,500.00	50.00%	0.50	50.00%
01.02	OBRAS PRELIMINARES												
01.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	8,540.90	18,837.79	6540.90	18,837.79	0.00	0.00	6,540.90	18,837.79	100.00%	0.00	0.00%
01.02.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA	m2	5,450.75	17,932.97	5450.75	17,932.97	0.00	0.00	5,450.75	17,932.97	100.00%	0.00	0.00%
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA	km	1,866.68	2,034.68	1.09	2,034.68	0.00	0.00	1.09	2,034.68	100.00%	0.00	0.00%
01.03.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	m2	7,631.05	42,733.88	7631.05	42,733.88	0.00	0.00	7,631.05	42,733.88	100.00%	0.00	0.00%
01.03.03	CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES	m	2,180.30	13,408.85	2180.30	13,408.85	0.00	0.00	2,180.30	13,408.85	100.00%	0.00	0.00%
01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPOS	m3	892.30	16,105.03	892.30	16,105.03	0.00	0.00	892.30	16,105.03	100.00%	0.00	0.00%
01.04	AFIRMAO												
01.04.01	AFIRMAO DE PLATAFORMA DE RODADURA E=10 CM (80% H. + 20% T.R.)	m2	5,450.75	141,307.47	0.00	0.00	1,170.45	30,384.88	1,170.45	30,384.88	21.47%	4,280.30	78.53%
01.05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA												
01.05.01	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL	Und	510.00	510.00	1.00	510.00	0.00	0.00	1.00	510.00	100.00%	0.00	0.00%
01.05.02	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA	Und	725.00	725.00	1.00	725.00	0.00	0.00	1.00	725.00	100.00%	0.00	0.00%
01.05.03	EQUIPO TEMPORAL DE SEGURIDAD	Und	640.00	640.00	1.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	100.00%	0.00	0.00%
	COSTO DIRECTO (CD)		259,933.32	116,851.85		116,851.85		30,384.88	30,384.88	148,738.73			112,816.89
	GASTOS GENERALES (10% de CD)		25,993.33	11,685.19		11,685.19		3,038.49	3,038.49	14,673.67			11,261.68
	UTILIDAD (10% de CD)		25,993.33	11,685.19		11,685.19		3,038.49	3,038.49	14,673.67			11,261.68
	sub total		311,223.98	139,622.23		139,622.23		36,451.86	36,451.86	170,084.07			135,138.91
	factor de relacion		1.000000	139,622.23		139,622.23		36,451.86	36,451.86	170,084.07			0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO		311,223.98	139,622.23		139,622.23		36,451.86	36,451.86	170,084.07			135,138.91
	PROCENTAJE DE AVANCE DE OBRA		100.00%	44.88%		44.88%		11.72%	11.72%	86.98%			43.42%

INGENIERO CIVIL
 DIANA PAOLA CASTRO LITANO
 CIP. 162223

Jose Herminio Quintana Acuña
 Ingeniero Civil
 RES-00197257

CONSORCIO UCAYALI
 José Antonio Quintana Acuña
 José Antonio Quintana Acuña
 Representante Legal
