




“Año de la Universalización de la Salud”

Belén, 16 de octubre de 2020

Oficio n.º 1666-2020-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate.
Gerente Regional de Infraestructura.
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 01 -
Septiembre 2020.

Obra: “Construcción de vías de acceso; en el (la) calle circunvalación calle Juan Pablo II, calle Luis Rengifo Alvarado y calle Roldán Tuesta Ruiz del barrio Shiringal - L =1.307.57 ML =1.31 km Distrito de Contamana, provincia Ucayali departamento de Loreto”

Ref.: a. Informe n.º 110-2020-GRL/GRI/SGSyC/DPCL
b. Carta n.º 015-2020-JKP-CU

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización n° 01 por ejecución de obra**, que asciende a la suma de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO con 01/100 soles (S/149,505.01)** aprobada y presentada por el inspector, mediante carta de la referencia a), **correspondiente a SEPTIEMBRE del 2020**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 01	S/	149,505.01
Retención de fiel cumplimiento	S/	35,455.75
Reajuste Neto	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización Adelanto por Materiales	S/	0.00
Deducción Reaj. Que No Corresp. A/D	S/	0.00
Deducción Reaj. Que No Corresp. A/M	S/	0.00
Neto a Pagar	S/	114,049.26

Asimismo, la ejecución de la obra a septiembre del 2020 tiene un avance real ejecutado acumulado de 42.17% versus un programado de 9.42%, encontrándose la obra adelantada y en ejecución.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar con el trámite respectivo a **favor de CONSORCIO UCAYALI** conforme lo detallan los documentos de la referencia.

Atentamente.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: Inspector de Obra
Ing. dpcl
SGSyC – File de obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)

TRAMITE: 1666
RFA/dap



INFORME N°110-2020-GRL/GRI/SGSyC/DPCL

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
DIRECCION REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervision y Control

05 OCT 2020

Fecha: _____ Hora: _____
N° Reg: _____

AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho
Sub Gerente de Supervisión y Control.

DE : Ing. Diana Paola Castro Litano
Inspector de Obra.

ASUNTO : **VALORIZACION DE OBRA N° 01- MES DE SETIEMBRE DEL 2020.**
OBRA.- "CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE CIRCUNVALACION CALLE JUAN PABLO II, CALLE LUIS RENGIFO ALVARADO Y CALLE ROLDAN TUESTA RUIZ DEL BARRIO SHIRINGAL - L =1.307.57 ML 1.31 KM - DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI DEPARTAMENTO DE LORETO".

REFERENCIA: a) CARTA N°15-2020-JKP-CU/ CONSORCIO UCAYALI
TRAMITE: 29599

FECHA : Iquitos, 05 de Octubre del 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentación referente a la **Valorización de Obra N°01**, correspondiente al mes de Setiembre del 2020, que mediante Proveído N°29599 de la SGSyC, se solicita su revisión e informe correspondiente.

1. ANTECEDENTES :

Mediante CARTA N°15-2020-JKP-CU/ CONSORCIO UCAYALI remite toda la documentación relacionada a la obra descrita líneas arriba con respecto a la **Valorización de Obra N°01 mes de setiembre del 2020**, de la Obra: "CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) CALLE CIRCUNVALACION CALLE JUAN PABLO II, CALLE LUIS RENGIFO ALVARADO Y CALLE ROLDAN TUESTA RUIZ DEL BARRIO SHIRINGAL - L =1.307.57 ML =1.31 KM DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA UCAYALI DEPARTAMENTODE LORETO"; La cual asciende al monto S/ 149,505.01 soles.

2. GENERALIDADES :

Del Contratista:

Nombre de la obra : "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle circunvalación calle juan pablo ii, calle Luis Rengifo Alvarado y calle roldan tuesta Ruiz del barrio Shiringal - L =1.307.57 ML =1.31 km Distrito de Contamana, provincia Ucayali departamento de Loreto"

Ubicación : Distrito de Contamana, provincia Ucayali departamento de Loreto"

Entidad : Gobierno Regional de Loreto

Contrato : N° 16-C -2020-GRL-GGR-GRI

Firma de Contrato : 13 de marzo del 2020

Valor Contratado : S/. 354,558.55



Valor Referencial : S/. 354,558.55
 Ubicación : Distrito de Contamana.
 Otorgamiento de Buena Pro : 24/02/2020
 Plazo Contratado : 60 días Calendarios
 Contratista : Consorcio Ucayali
 Modalidad de Ejecución : A precios unitarios.
 Representante Común : José Antonio Padilla Koo


3. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

El Residente de Obra manifiesta en su informe que el avance de obra presentado para la valorización N°01 setiembre de 2020 que su porcentaje de avance de obra programado acumulado es de 9.42% mientras que su porcentaje de avance de obra ejecutado acumulado es de 42.17%, lo cual indica que la obra se encuentra Adelantada.

ARTIDA	DESCRIPCION	AVANCE							SALDO	
		Presup.	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		%	Valorizado
			%	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.	%	Valorizado S/.		
01.01	OBRAS PROVISIONALES	4,423.65	0.00%	0.00	66.09%	2,923.65	66.09%	2,923.65	33.91%	1,500.00
01.02	OBRAS PRELIMINARES	44,984.93	0.00%	0.00	100.00%	44,984.93	100.00%	44,984.93	0.00%	0.00
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS	74,803.93	0.00%	0.00	100.00%	74,803.93	100.00%	74,803.93	0.00%	0.00
01.04	AFIRMADO	169,377.11	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	169,377.11
01.05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	1,875.00	0.00%	0.00	100.00%	1,875.00	100.00%	1,875.00	0.00%	0.00
	COSTO DIRECTO	295,464.62	0.00	0.00		124,587.51		124,587.51		170,877.11
	GASTOS GENERALES (10% de CD)	29,546.46	0.00	0.00		12,458.75		12,458.75		17,087.71
	UTILIDAD (10% de CD)	29,546.46	0.00	0.00		12,458.75		12,458.75		17,087.71
	sub total	354,557.54	0.00	0.00		149,505.01		149,505.01		205,052.53
000000	factor de relacion	354,557.54		0.00		0.00		0.00		0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	354,557.54	0.00	0.00		149,505.01		149,505.01		205,052.53
	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO DEL MES			0.00%		42.17%		42.17%		57.83%
	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACUMULADO			0.00%		42.17%		42.17%		100.00%



CURVA S – PROGRAMADO V/S EJECUTADO

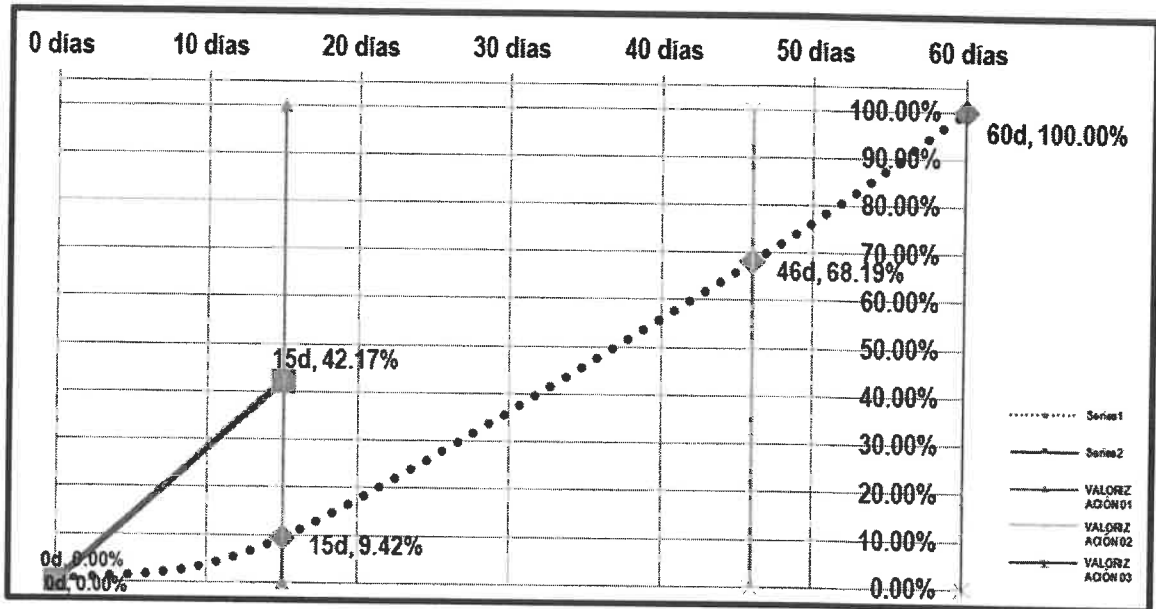

4. CONCLUSIONES:

- La presente documentación materia de su revisión, consta con los requerimientos y sustentos que derivan a la presente valorización.
- En la documentación, se adjuntan las boletas de pagos realizados a **SENCICO**, de acuerdo al porcentaje que estima la legislación vigente, pago de póliza **SCTR**.
- El avance físico del mes es: 42.17%
- El avance programado al mes de 9.42%.
- En este caso la Valorización Acumulada Ejecutada alcanzo el 42.17%, mientras que la Valorización Acumulada Programada es del 9.42%.
- Es por ello que en esta primera Valorización correspondiente al mes de setiembre- 2020, la Ejecución de la obra se encuentra **ADELANTADA**.

5. RECOMENDACIONES:

- Los metrados han sido conciliados por el Residente e Inspector de Obra por lo mismo que Da Conformidad a la Valorización N°01 correspondiente al mes de setiembre, de la obra "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle circunvalación calle Juan Pablo II, calle Luis Rengifo Alvarado y calle Roldan Tuesta Ruiz del barrio Shiringal - L =1.307.57 ML =1.31 km Distrito de Contamana, provincia Ucayali departamento de Loreto".



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

- Visto la Valorización N°01 correspondiente al mes de setiembre 2020 y otorgando la conformidad, se recomienda el pago correspondiente a la empresa **CONSORCIO UCAYALI**, siendo el monto a pagar de **S/ 149,505.01 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO con 01/100 soles)** sin IGV, como se detalla:

Valorización BRUTA N°01- setiembre del 2020	S/	149,505.01
Reajuste total de valorización n°01	S/	0.00
Deducción	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Neto Facturar	SI.	149,505.01

- Se recomienda seguir los procedimientos de acuerdo al RLCE artículo 194, y continuar con su trámite correspondiente.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente

Ing. DIANA PAOLA CASTRO LITANO
Inspector de Obra
Sub Gerencia de Supervisión y Control

CONSORCIO UCAYALI

109



Pucallpa, 02/10/2020

CARTA N° 15-2020-JPK-CU

Sr.(es): Gerente Regional de Infraestructura
EDI WISBERTO RUIZ ZARATE

Presente .-

Asunto : Remito Valorizaciones de Obra N° 01, correspondiente Al mes de Setiembre del 2020



Referencia : a) Contrato N° 16-B-2020-GRL-GGR-GRI
b) Contrato N° 16-C-2020-GRL-GGR-GRI
c) Contrato N° 16-D-2020-GRL-GGR-GRI

Obras : "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Alfonso Ugarte y calle Buenaventura Marquez I: 1,090.15 m-1.09 km distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto",

"Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Circunvalacion, calle Juan Pablo II, calle Luis Rengifo Alvarado y calle Roldan Tuesta Ruiz del Barrio Shiringal – I=1,307.57 ml – 1.31 km – Distrito de Contamana – Provincia de Ucayali – Departamento de Loreto",

"Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Palestina, calle Bellavista, calle Maracana y calle belen – aa.hh. Padre Zapico Ramos I=1,691.40 m-1.69 km, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto".



Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del compromiso contractual, establecido con el Gobierno Regional de Loreto, respecto a las ejecuciones de la Obras indicadas en la referencia ; hacerle llegar adjunto los Informes y Valorizaciones N° 01, correspondiente al mes de Setiembre del 2020, de la ejecución de las obras: "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Alfonso Ugarte y calle Buenaventura Marquez I: 1,090.15 m-1.09 km distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto", "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Circunvalacion, calle Juan Pablo II, calle Luis Rengifo Alvarado y calle Roldan Tuesta Ruiz del Barrio Shiringal – I=1,307.57 ml – 1.31 km – Distrito de Contamana – Provincia de Ucayali – Departamento de Loreto", "Construcción de vías de acceso; en el (la) calle Palestina, calle Bellavista, calle Maracana y calle belen – aa.hh. Padre Zapico Ramos I=1,691.40 m-1.69 km, Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto", las mismas que se encuentra en EJECUCION.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

29599
Ing. Diana Castro
SU
Atencion
06/10/2020



CONSORCIO UCAYALI
José Antonio Padilla Koc
Representante Legal Común

PROVEIDO N° 29599
A: S. G. S. y C.
PARA: Sr. Atencion



ADJUNTO:
VALORIZACIONES N°01
01 ORIGINAL - 03 COPIAS + CD
Cc./Archiv

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 01

*CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO EN EL (LA) CALLE CIRCUNVALACION, CALLE JUAN PABLO II, CALLE LUIS RENGLIFO ALVARADO Y CALLE ROLDAN TUESTA RUIZ DEL BARRIO SHIRINGAL - L=1,307.57 ML. - 1.31 KM - DISTRITO DE CONTAMANA - PROVINCIA DE

OBRA:

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONTRATISTA: CONSORCIO UCAYALI

RESIDENTE: ING° DIANA PAOLA CASTRO LITANO

INSPECTOR: Distrito de Contamana, Provincia de Ucayali, Departamento de Loreto°

UBICACIÓN: SETIEMBRE DEL 2020

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:
PRESUPUESTO CONTRATADO:
FACTOR DE RELACION

60 DIAS CALENDARIOS
S/.354,557.54 SIN IGV

1

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR		ACTUAL		AVANCE		ACUMULADO		SALDO	
		Und.	Metrado	P. Unid.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado
01	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO EN EL (LA) CALLE PALESTINA, CALLE BELLAVISTA, CALLE MARACAN Y CALLE BELEN DEL AA.HH. PADRE ZAPICO RAMOS - CONTAMANA, L=1,681.40 ML. - 1.68 KM													
01.01	OBRAS PROVISIONALES													
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 5.40M X 3.90M INCL. MARCO DE 2"x2", BASTIDORES, GIGANTOGRAFIA Y COLOCACION	und	1.00	923.65	923.65	0.00	0.00	1.00	923.65	1.00	923.65	100.00%	0.00	0.00%
01.01.02	ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA	mes	1.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	1.00	500.00	100.00%	0.00	0.00%
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	Und	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.50	1,500.00	0.50	1,500.00	50.00%	0.50	50.00%
01.02	OBRAS PRELIMINARES													
01.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	8,002.08	2.88	23,045.93	0.00	0.00	8,002.08	23,045.93	8,002.08	23,045.93	100.00%	0.00	0.00%
01.02.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA	m2	6,666.39	3.28	21,939.00	0.00	0.00	6,666.39	21,939.00	6,666.39	21,939.00	100.00%	0.00	0.00%
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA	km	1.33	2,137.36	2,842.69	0.00	0.00	1.33	2,842.69	1.33	2,842.69	100.00%	0.00	0.00%
01.03.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE	m2	9,335.74	4.30	40,143.68	0.00	0.00	9,335.74	40,143.68	9,335.74	40,143.68	100.00%	0.00	0.00%
01.03.03	CONFORMACION DE CUNETAS LATERALES	m	2,667.35	6.15	16,404.20	0.00	0.00	2,667.35	16,404.20	2,667.35	16,404.20	100.00%	0.00	0.00%
01.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPOS	m3	1,213.65	12.70	15,413.36	0.00	0.00	1,213.65	15,413.36	1,213.65	15,413.36	100.00%	0.00	0.00%
01.04	AFIRMADO													
01.04.01	AFIRMADO DE PLATAFORMA DE RODADURA E=10 CM (80% H. + 20% T.R.)	m2	6,666.39	25.40	169,377.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,666.39	100.00%
01.05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA													
01.05.01	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL	Und	1.00	510.00	510.00	0.00	0.00	1.00	510.00	1.00	510.00	100.00%	0.00	0.00%
01.05.02	EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA	Und	1.00	725.00	725.00	0.00	0.00	1.00	725.00	1.00	725.00	100.00%	0.00	0.00%
01.05.03	EQUIPO TEMPORAL DE SEGURIDAD	Und	1.00	640.00	640.00	0.00	0.00	1.00	640.00	1.00	640.00	100.00%	0.00	0.00%
	COSTO DIRECTO (02)				295,464.62		0.00		124,587.51		124,587.51			170,877.11
	GASTOS GENERALES (10% de C2)				29,546.46		0.00		12,458.75		12,458.75			17,087.71
	UTILIDAD (10% de C2)				29,546.46		0.00		12,458.75		12,458.75			17,087.71
	sub total				354,557.54		0.00		149,505.01		149,505.01			205,052.53
	factor de relacion		1.000000		354,557.54		0.00		149,505.01		149,505.01			205,052.53
	TOTAL DEL PRESUPUESTO				354,557.54		0.00		149,505.01		149,505.01			205,052.53
	PROCENTAJE DE AVANCE DE OBRA				100.00%		0.00%		42.17%		42.17%			57.83%

[Firma]
Cayuliro Sandoval Jose Fernando
INGENIERO CIVIL
CIP 055830

INGENIERO CIVIL
DIANA PAOLA CASTRO LITANO
CIP. 162223

083
