

"Año de la Universalización de la Salud"

8	oct-20	314,436.82				569.81	12,027.24	11,957.33	11,957.33	56,885.33	81
9	nov-20	276,878.42				576.38	56,885.33	56,885.33	56,885.33	0.00	4,53
									146,400.00		3,571
MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA											
3	feb-20	505,049.71	72,520.00	0.110	31.818%	1,136.10	10,472.68	10,404.27	10,404.27	62,115.73	-19
4	mar-20	110,729.72				1,119.62	2,296.02	2,281.02	2,281.02	59,834.71	-7
5	jul-20	482,780.51				1,119.62	8,448.61	8,393.42	8,393.42	51,441.28	-27
6	ago-20	660,478.58				1,119.62	13,913.50	13,822.62	13,822.62	37,618.67	-20
7	sep-20	266,478.60				1,119.62	5,129.68	5,096.18	5,096.18	32,522.49	-7
8	oct-20	314,436.82				1,204.18	5,612.67	5,576.00	5,576.00	26,946.49	33
9	nov-20	276,878.42				1,224.71	26,946.49	26,946.49	26,946.49	0.00	2,08
									72,520.00		-48
TOTAL			792,879.5						792,879.50	0.00	


Grethly Madeline Yori Cerna Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R. CIP. N° 211312



“Año de la Universalización de la Salud”

De acuerdo al informe presentado por el Residente y Supervisor de obra, en la que se describe, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización cuyos avances ejecutados y programados es el siguiente:

✓ Montos Valorizados Ejecutados

MES	MONTO TOTAL (Inc. IGV)		PORCENTAJES	
	PRINCIPAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL
	S/.	S/.	%	%
20-oct-2019				0.0%
30-nov-2019	962,203.98	962,203.98	24.27%	24.27%
31-dic-2019	123,998.27	1,086,202.25	3.13%	27.40%
31-ene-2020	-	-	0.00%	0.00%
28-feb-2020	505,049.71	1,591,251.96	12.74%	40.14%
31-mar-2020	110,729.72	1,701,981.68	2.79%	42.93%
30-jul-2020	482,780.51	2,184,762.19	12.18%	55.11%
31-ago-2020	660,478.58	2,845,240.77	16.66%	71.77%
30-sep-2020	266,478.60	3,111,719.37	6.72%	78.49%
31-oct-2020	314,436.82	3,426,156.19	7.93%	86.42%
30-nov-2020	276,878.42	3,703,034.61	6.98%	93.41%
27-dic-2020				

✓ Montos Valorizados Programados


MES	MONTO TOTAL (sin IGV)		PORCENTAJES	
	PRINCIPAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL
	S/.	S/.	%	%
20-oct-2019				0.00%
30-nov-2019	962,203.98	962,203.98	24.27%	24.27%
31-dic-2019	123,998.27	1,086,202.25	3.13%	27.40%
31-ene-2020	-	1,086,202.25	0.00%	27.40%
28-feb-2020	505,049.71	1,591,251.96	12.74%	40.14%
31-mar-2020	110,729.72	1,701,981.68	2.79%	42.93%
30-jul-2020	88,424.51	1,790,406.19	2.23%	45.16%
31-ago-2020	259,540.84	2,049,947.04	6.55%	51.71%
30-sep-2020	964,168.23	3,014,115.27	24.32%	76.03%
31-oct-2020	687,889.64	3,702,004.91	17.35%	93.38%
30-nov-2020	215,508.02	3,917,512.93	5.44%	98.82%
27-dic-2020	46,884.62	3,964,397.53	1.18%	100.00%

Grethy Madeline Velasco Zúñiga Espinoza
ING. CIVIL
R. CIP. N° 211312



"Año de la Universalización de la Salud"

**CURVA "S"
AVANCE DE OBRA:
PROGRAMADO VS EJECUTADO**

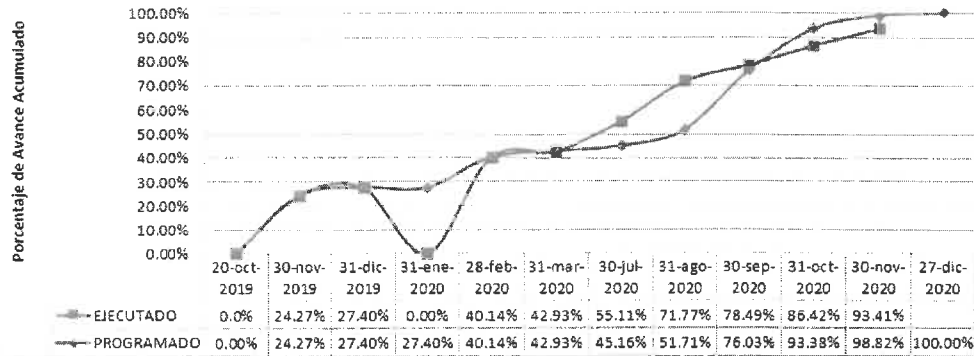

EM	DETALLE	FECHA EMISION	VALORIZ. BRUTA	REAJUSTE	AMORT AD DIRECTO	AMORT AD MATERIALES	DEDU CT. AD. DIRECTO	DEDUCT. AD. MAT.	VALORIZ. NETA	IGV	TOTAL
00	ADELANTO DIRECTO								396,440.00		396,440.00
00	ADELANTO DE MATERIALES								792,879.50		792,879.50
00	VALORIZACION N° 01	nov-19	962,203.98	9,622.04	96,220.40	-	0.00	-	875,605.62	-	875,605.62
00	VALORIZACION N° 02	dic-19	123,998.27	1,611.98	123,998.27	-	36.83	-	1,575.15	-	1,575.15
00	VALORIZACION N° 00	ene-20							-	-	-
00	VALORIZACION N° 03	feb-20	505,049.71	5,555.55	50,504.97	101,915.45	50.00	(247.39)	358,382.23		358,382.23
00	VALORIZACION N° 04	mar-20	110,729.72	1,993.14	11,072.97	29,496.43	87.71	105.23	71,960.52		71,960.52
00	VALORIZACION N° 05	jul-20	482,780.51	7,724.49	48,278.05	97,882.66	286.80	240.31	343,817.18		343,817.18
00	VALORIZACION N° 06	ago-20	660,478.58	13,209.57	66,365.34	165,102.24	458.60	1,434.54	440,327.44		440,327.44
00	VALORIZACION N° 07	sep-20	266,478.60	5,329.57		58,381.32	-	501.99	212,924.86		212,924.86
1.00	VALORIZACION N° 08	oct-20	314,436.82	9,433.10		63,878.17	-	501.99	259,489.76		259,489.76
2.00	VALORIZACION N° 09	nov-20	276,878.42	8,860.11		276,878.42		6,622.08	2,238.03		2,238.03
3.00	VALORIZACION N° 10	dic-20									
			3,703,034.61	63,339.55	396,440.00	793,534.69	919.94	2,034.67	3,493,912.50	-	3,755,640.29

Grathy Madroña Del C. Ine Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R. CIP. N° 211312



"Año de la Universalización de la Salud"

- ✓ La obra en mención tiene un avance físico acumulado al mes de noviembre 2020 de 93.41% versus calendario programado acumulado al mismo periodo de 98.82%, siendo el estado de la Obra **ATRASADA**.

DESCRIPCION	VALORIZACION ACTUAL
1.- Monto valorizado en el presente mes :	SI. 276,878.42
. Valorización del Mes	SI. 276,878.42
2.- Reajuste de las valorizaciones :	SI. 8,860.11
. Reajuste de la valorización	SI. 8,860.11
3.- Amortizaciones :	SI. 276,878.42
. Del Adelanto en Efectivo	SI. -
. Del Adelanto de Materiales	SI. 276,878.42
4.- Deduccion del reajuste que no corresponde :	SI. 6,622.08
. Por Adelanto en Efectivo	SI. -
. Por Adelanto de Materiales	SI. 6,622.08
5.- Otros :	SI. -
. Retencion	SI. -
. Multas	SI. -
A - MONTO LIQUIDO A PAGAR (1+2-3-4-5)	SI. 2,238.03
B - I.G.V. (18% de A)	
C.- MONTO EN EFECTIVO A CANCELAR AL CONTRATISTA	SI. 2,238.03


Grethly Maciel de la Cruz Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R. C.I.P. N° 211312



"Año de la Universalización de la Salud"

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ En concordancia con la Cláusula Cuarta del Contrato del Contratista describe lo siguiente: La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, en soles, en periodos de valorización mensuales.
- ✓ Según lo estipulado en el artículo 166° del RLCE, las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el Supervisor y el Contratista.
- ✓ Bajo ese contexto, el Supervisor presenta la valorización de Obra N°008 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2020, aprobandos los metrados ejecutados en obra, conforme a lo estipulado en el contrato N°009-2019-GRL-GGR-GRI.
- ✓ De acuerdo a la documentación presentada por el Supervisor, donde éste aprueba los metrados ejecutados y da conformidad a la valorización presentada por el contratista, se recomienda a la Gerencia Regional de infraestructura tramitar el pago de la valorización de obra N°009 correspondiente al mes de noviembre 2020, por el monto S/.2,238.03 dos mil doscientos treinta y ocho con 03/100 soles.

Es todo cuanto puedo informarle a usted para conocimiento y trámite respectivo; agradeciendo su atención al presente me suscribo de usted.

Atentamente


Grethly Madeleine D. Cisneros Zapata Espinoza
ING. CIVIL
R. CIP. N° 211312

MADELEINE ZAPATA ESPINOZA
Ing. Civil - Coordinadora de Obra
