



# VALORIZACION

## N.º 1



Lagunas, 22 de Enero de 2021



CARTA N° 007 – 2021 – CCL – MSCHC/RC

Señor:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Atención : Gerencia Regional de Infraestructura.


Asunto : REMITE INFORME RESPCTO A LA VALORIZACIÓN N° 01 DE CONTRATISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO”

De mi especial Consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del contrato vigente, traslado informe de JEFE DE SUPERVISOR sobre el levantamiento de las observaciones de LA VALORIZACION N° 01 DEL CONTRATISTA CONSORCIO LAGUNAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA OBRA : “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO”, para su trámite correspondiente.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS  
*Marcos Sergio Chupillón Campos*  
Marcos Sergio Chupillón Campos  
REPRESENTANTE COMÚN  
DNI N° 16419685



Lagunas, 22 de Enero de 2021

CARTA N° 007 - 2021 - CCL - MSCHC/RC

Señor:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

25 ENE 2021

Hora: 12:10 PM Firma: [Signature]

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

2177

25 ENE 2021

Hora: [Signature]

Atención : Gerencia Regional de Infraestructura

Asunto : REMITE INFORME RESPECTO A LA VALORIZACIÓN N° 01 DE CONTRATISTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO"

De mi especial Consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del contrato vigente, traslado informe de JEFE DE SUPERVISOR sobre el levantamiento de las observaciones de LA VALORIZACION N° 01 DEL CONTRATISTA CONSORCIO LAGUNAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO", para su trámite correspondiente.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Sub Gerencia de Supervisión y Control

25 ENE 2021

Fecha: 02177 Hora: 3:16 PM

N° Reg: [Signature]

CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS

[Signature]

Marcos Sergio Chupillón Campos  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 DNI N° 16419686

PROVEIDO N° 2177

A: S6S y C

PAR: Constr. y des. Ins.



PROVEIDO N° 02177

A Ing. Madeline

PARA: SU

Atención







# CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS

"Año De La Universalización De La Salud"

154 DA SIADA

Lagunas, 21 de Diciembre de 2020

**CARTA N° 012 - 2020 - CCL - MSCHC/RC**

Señor:

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

**Atención : Gerencia Regional de Infraestructura.**

**Asunto : REMITE INFORME DE VALORIZACION N° 01 DE CONTRATISTA E INFORME DE SUPERVISION N° 01, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO"**

**Referencia :**

1. INFORME N° 010 - 2020 - EPINVAS/JS.
2. Ssupervisión de la Obra: : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO"
3. Contrato N° 027- 20120- GRL/GRI

De mi especial Consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del contrato vigente, traslado informe de JEFE DE SUPERVISION sobre LA VALORIZACION N° 01 DE CONTRATISTA CONSORCIO LAGUNAS E INFORME DE SUPERVISION N° 01, CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO" , en cumplimiento del DU N° 133 -2020, para su evaluación y trámite correspondiente.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS  
*Marcos Sergio Chupillon Campos*  
Marcos Sergio Chupillon Campos  
REPRESENTANTE COMÚN  
DNI N° 16419686









**G O B I E R N O   R E G I O N A L   D E   L O R E T O**

096 SELECCIÓN LICITACION PÚBLICA N° 06-2020-CSD GRU

CONSORCIO LAGUNAS

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region    LORETO  
Provincia    ALTO AMAZONAS  
Distrito    LAGUNAS

SI. 3,872,552.12

SI. 0.00

SI. 0.00

SI. 3,872,552.12

Fecha de Inicio de Obra

Plazo de Ejecucion

1ª Paralización

2ª Paralización

3ª Paralización

Fecha es Término de Obra (mes)

Fecha de Término Contractual

01-Dic-20

180 Días

30-May-21

**VALORIZACION MENSUAL N° 01**

AL 31 DICIEMBRE DEL 2020

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARINOLEJO CUCHO

ITEM	PRESUPUESTO			AVANCE ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO			SALDO POR VALORIZAR	
	UNID	METRADO	P. UNO	SI.	SI.	PARCIAL	Valorizado		Valorizado		Valorizado		Metrado	Valorizado
							Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%		
06	m3	13.86	543.16	7,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86	7,526.20
07	m3	179.67	27.37	4,917.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.67	4,917.57
08	m3	1,210.82	46.89	56,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.82	56,533.19
09	m3	230.05	543.16	124,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.05	124,953.96
10	m2	79.12	27.37	2,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.12	2,165.51
11														
11.01	m3	67.38	803.01	40,530.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.38	40,530.81
11.02	kg	1,544.17	5.74	8,863.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.17	8,863.54
12														
12.01	m3	28.51	603.01	17,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.51	17,191.82
12.02	kg	1,475.67	5.74	8,470.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.67	8,470.35
12.03	kg	1,449.59	4.85	7,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.59	7,030.51
13														
13.01	m3	36.92	603.01	22,263.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.92	22,263.13
13.02	m2	512.21	27.37	14,019.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.21	14,019.19
13.03	kg	3,029.70	5.74	17,390.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029.70	17,390.48
13.04	kg	2,150.62	4.85	10,430.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.62	10,430.51
4														
4.01	m3	22.10	543.16	12,003.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10	12,003.84
4.02	m2	324.93	27.78	7,401.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.93	7,401.91
4.03	kg	1,532.12	5.74	8,794.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.12	8,794.37
4.04	kg	1,352.12	4.85	6,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.12	6,537.76
4.05	kg	270.30	4.34	1,173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.30	1,173.10
5														
5.01	m3	55.41	543.16	30,086.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.41	30,086.50
5.02	m2	908.53	27.37	24,866.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.53	24,866.47
5.03	kg	791.21	5.74	4,541.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.21	4,541.55
5.04	kg	3,037.26	4.85	14,730.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.26	14,730.71
6														
6.01	m3	24.84	603.01	14,978.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.84	14,978.77
6.02	m2	262.62	28.91	7,592.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.62	7,592.34
6.03	kg	2,233.21	5.74	12,918.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.21	12,918.63
6.04	kg	1,782.47	4.85	8,644.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.47	8,644.98
7														
7.01	m3	4.85	603.01	2,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85	2,924.60
7.02	m2	12.95	28.91	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95	374.38
7.03	kg	269.01	4.85	1,304.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.01	1,304.70
8														
8.01	m3	17.12	543.16	9,298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12	9,298.90
8.02	m2	244.19	24.62	6,011.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.19	6,011.96
8.03	kg	777.03	5.74	4,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.03	4,460.15
8.04	kg	1,048.54	4.85	5,085.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.54	5,085.42
8.05	kg	76.50	4.34	332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.50	332.01

Segundo Michel Gonzalez Quiqui  
REPRESENTANTE COMUN  
CONSORCIO LAGUNAS

-Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho-  
ING. CIVIL  
CIP N° 71401

000200



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

SOBRESECCION LICITACION PUBLICA N° 06-2020-CSO GRL  
 AREA CONSORCIO LAGUNAS

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA  
 LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

REGION LORETO  
 PROVINCIA ALTO AMAZONAS  
 DISTRITO LAGUNAS

MONTO SI. 3,372,652.12

SI. 0.00

SI. 0.00

SI. 3,372,652.12

Fecha de Inicio de Obra

Plazo de Ejecucion

1° Paralización

2° Paralización

3° Paralización

Fecha de Término de Obra Inicial

Fecha de Término Contractual

04-Dic-20

180 Días

30-May-21

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 01**

AL 31 DICIEMBRE DEL 2020

ITEM	PRESUPUESTO			PARCIAL			AVANCE ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO			SALDO POR VALORIZAR		
	UNID	RETORNO	P. UNID	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.
09.01	m3	1.31	543.16	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	711.54
09.02	m2	27.62	26.04	719.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62	719.22
09.03	kg	108.30	4.85	525.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.30	525.28
10.01	m3	68.75	543.16	37,342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75	37,342.25
10.02	m2	788.60	35.31	27,845.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.60	27,845.47
10.03	kg	3,839.93	4.85	18,623.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.93	18,623.66
10.04	m	431.00	43.78	18,869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	18,869.18
11.01	m3	4.95	543.16	2,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	2,688.64
11.02	m2	103.95	27.37	2,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95	2,845.11
11.03	kg	611.47	4.85	2,965.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.47	2,965.63
12.01	p2	4,279.83	9.27	39,674.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.83	39,674.02
12.02	m	2,067.78	8.87	18,344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.78	18,344.21
12.03	m	260.32	16.85	4,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.32	4,386.39
12.04	m2	1,586.27	92.07	146,047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.27	146,047.88
12.05	m	284.88	33.04	9,411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.88	9,411.77
12.06	m	131.40	74.57	9,811.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.40	9,811.64
13	pza	11.00	390.04	4,290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	4,290.44
14	pza	195.51	72.20	14,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.51	14,115.82
15	pza	38.00	85.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	3,230.00
16	m2	127.08	79.07	10,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.08	10,048.22
17	m2	1,285.13	78.84	101,319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.13	101,319.65
18	m2	515.34	65.63	33,854.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.34	33,854.58
19	m2	128.01	26.38	3,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.01	3,376.90
20	m2	2,921.05	27.85	81,351.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.05	81,351.24
21	m2	59.25	27.85	1,650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25	1,650.11
22	m2	531.63	27.85	14,805.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.63	14,805.90
23	m2	475.19	31.95	15,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.19	15,182.32
24	m2	103.95	27.85	2,895.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95	2,895.01
25	m2	731.35	30.64	22,408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.35	22,408.56
26	m2	704.44	13.03	9,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.44	9,178.85
27	m2	110.40	58.17	6,421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.40	6,421.97
28	m	1,889.75	3.62	6,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.75	6,840.90
29	m2	1,395.15	67.84	94,714.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.15	94,714.82
30	m2	37.13	37.42	1,389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.13	1,389.40
31	m2	422.67	40.66	17,185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.67	17,185.76

000199

Segundo Michel Gonzalez Cullqui  
 REPRESENTANTE COMUN  
 CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho  
 ING. CIVIL



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

REGION  
ALTO AMAZONAS  
PROVINCIA  
LAGUNAS  
DISTRITO  
01-Dic-20  
180 Días

VALOR POR VALORIZAR  
Monto  
37.21  
1,133.69  
595.33  
244.22  
1,355.00  
997.58  
164.73  
81.27  
4.50  
1,956.50  
1,456.50  
733.95  
2,000.00  
1,168.08  
1,519.35  
740.64  
769.72  
961.50  
2,538.28  
10,071.66  
1,390.84  
1,322.08  
1,005.15  
3,220.08  
393.70  
830.88  
207.28  
700.00  
3,540.00  
49.50  
10.00  
4.00  
1.00  
2.00  
1.00  
24.00  
21.00  
81.00

FECHA DE EJECUCION  
01-Dic-20  
180 Días

FECHA DE INICIO DE OBRAS  
01-Dic-20  
180 Días

FECHA DE TERMINO DE OBRAS  
30-May-21

FECHA DE INICIO DE OBRAS  
01-Dic-20  
180 Días

FECHA DE TERMINO DE OBRAS  
30-May-21

FECHA DE INICIO DE OBRAS  
01-Dic-20  
180 Días

FECHA DE TERMINO DE OBRAS  
30-May-21

FECHA DE INICIO DE OBRAS  
01-Dic-20  
180 Días

FECHA DE TERMINO DE OBRAS  
30-May-21

**VALORIZACION MENSUAL N° 01**  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2020

ITEM	PRESUPUESTO		PARCIAL SI.	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	UNID	P. UNID SI.		Monto	Valorizado	Monto	Valorizado	Monto	Valorizado	Monto	Valorizado
02	m2	37.21	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.21	2,936.51
03	m2	1,133.69	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.69	36,482.14
04	m2	595.33	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.33	20,521.00
05	m2	244.22	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.22	6,654.10
06	m	1,355.00	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	23,150.44
07	m	997.58	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.58	19,351.34
08	m2	164.73	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.73	12,952.37
09	m2	81.27	209.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.27	16,927.57
10	m2	4.50	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	550.00
11	und	1,956.50	1,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.50	1,956.50
12	und	1,456.50	1,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.50	1,456.50
13	m2	2.10	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	733.35
14	und	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
15	und	23.00	1,168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	25,565.34
16	und	18.00	1,519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	27,343.30
17	und	1.00	957.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	957.93
18	und	2.00	740.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,451.28
19	und	1.00	769.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	769.72
20	und	1.00	961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	961.50
21	und	2.00	1,269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,538.28
22	und	6.00	1,578.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10,071.66
23	und	2.00	695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,390.84
24	und	1.00	1,322.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,322.08
25	und	1.00	1,005.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,005.15
26	und	2.00	1,322.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,644.16
27	und	2.00	393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	787.40
28	und	2.00	415.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	830.88
29	m2	336.00	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	69,616.08
30	und	1.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700.00
31	und	2.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7,000.00
32	m	49.50	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,743.89
33	m	10.00	320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,200.80
34	und	4.00	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	446.08
35	und	1.00	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	586.75
36	und	2.00	526.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,053.50
37	par	167.00	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	1,606.54
38	pza	24.00	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	2,908.08
39	pza	21.00	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	1,599.57
40	und	81.00	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	1,483.11

000198

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuchio  
ING. CIVIL

Segundo Michel Gonzales Culqui  
REPRESENTANTE COMUN  
CONSORCIO LAGUNAS



OBRA  
 REGIÓN: LORETO  
 Provincia: ALTO AMAZONAS  
 Distrito: LAGUNAS  
 Fecha de Inicio de Obra: 01-Dic-20  
 Plazo de Ejecución: 180 Días

FECHA DE INICIO DE OBRA  
 01-Dic-20  
 PLAZO DE EJECUCIÓN  
 180 Días

FECHA DE TÉRMINO DE OBRA  
 30-May-21

FECHA DE TÉRMINO COMERCIAL

FECHA DE TÉRMINO COMERCIAL

FECHA DE TÉRMINO COMERCIAL

FECHA DE TÉRMINO COMERCIAL

FECHA DE TÉRMINO COMERCIAL

FECHA DE TÉRMINO COMERCIAL

ITEM	PRESUPUESTO		P. UNID	PARCIAL	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	UETRADO	S.			Moneda	Valorizado	Moneda	Valorizado	Moneda	Valorizado	Moneda	Valorizado
31		1,936.78	m2	35,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.78	35,055.72	
32		1,326.42	m2	24,684.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.42	24,684.63	
33		1,401.23	m2	25,362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.23	25,362.26	
34		130.53	m2	2,362.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.53	2,362.59	
35		620.61	m2	11,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.61	11,233.04	
36		997.58	m2	7,441.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.58	7,441.95	
37		82.75	m2	1,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75	1,020.31	
38		317.26	m2	5,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.26	5,783.65	
39		37.27	m2	679.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27	679.43	
40		176.00	m	1,365.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	1,365.76	
41		72.00	m	558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	558.72	
42		116.50	m	904.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50	904.04	
43		80.00	und	1,578.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1,578.60	
44		391.89	m2	10,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.89	10,083.33	
45		1.00	gib	1,045.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,045.49	
46		1.00	gib	247,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	247,634.00	
47		1.00	gib	525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	525.60	
48		1.00	und	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	440.43	
49		11.00	pza	3,246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3,246.54	
50		11.00	pza	2,851.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2,851.44	
51		5.00	pza	3,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3,059.25	
52		2.00	pza	538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	538.48	
53		11.00	pza	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	448.91	
54		3.00	pza	552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	552.12	
55		5.00	und	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	380.30	
56		5.00	pza	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	227.60	
57		5.00	pza	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	177.60	
58		5.00	pza	223.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	223.10	
59		4.00	pza	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	521.16	
60		38.55	m3	1,467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55	1,467.21	
61		15.00	m	496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	496.05	
62		165.00	m	3,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	3,880.80	
63		80.00	m	1,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1,315.20	
64		4.00	plo	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	293.80	
65		15.00	plo	840.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	840.45	
66		6.00	plo	391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	391.86	
67		6.00	pza	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	315.30	
68		2.00	pza	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	128.48	
69		10.00	caja	2,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,098.00	

000197

Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho  
 ING. CIVIL

REPRESENTANTE COMÚN  
 CONSORCIO LAGUNAS

Segundo Michel González Cuitiá



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region  
Loreto  
Provincia  
Alto Amazonas  
Distrito  
Lagunas

OBRA  
ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

Fecha de Inicio de Obra  
01-Dic-20  
Plazo de Ejecucion  
180 Días  
1° Paralización  
2° Paralización  
3° Paralización  
Fecha de Terminación de Obra  
30-May-21

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 01  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2020**

ITEM	PRESUPUESTO		AVANCE DE OBRA				AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR		
	UNID	IMPORTE	P. UNID	PARCIAL	AVANCE ANTERIOR	Valorizado	Metros	%	Valorizado	Metros	Valorizado
11	pza	2.00	253.88	507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	507.76
01											
01.01	pio	26.00	19.31	502.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	502.06
01.02	m	130.00	14.87	1,907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	1,907.10
01.03	m	85.00	16.84	1,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	1,431.40
01.04	m	110.00	17.54	1,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1,929.40
02											
02.01	und	32.00	8.35	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	267.20
02.02	und	8.00	8.83	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	70.64
02.03	und	5.00	9.33	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	55.98
02.04	und	20.00	8.41	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	168.20
02.05	und	6.00	9.41	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	56.46
02.06	und	6.00	9.91	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	59.46
02.07	und	14.00	10.04	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	140.56
03											
03.01	und	5.00	63.97	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	319.85
04											
04.01	m	260.62	30.80	8,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.62	8,951.10
04.02	m	253.36	23.35	5,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.36	5,915.96
04.03	und	28.00	92.16	2,580.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	2,580.48
04.04	m3	10.00	37.34	373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	373.40
04.05	m	50.00	36.23	1,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,811.50
04.06	pza	4.00	253.88	1,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,015.52
05											
05.01	gib	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00
05.02	und	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00
05.03	gib	1.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00
06											
06.01	gib	1.00	662.58	662.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	662.58
06.02	m	30.00	285.51	7,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	7,965.30
06.03	m	30.00	125.11	3,753.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3,753.30
06.04	m	30.00	34.51	1,035.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,035.30
06.05	m	7.00	14.78	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	103.46
06.06	m	13.00	41.85	544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	544.05
06.07	sq	1.00	100,246.21	100,246.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100,246.21
07											
07.01	gib	1.00	351.31	351.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	351.31
08											
08.01	m	30.00	14.35	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	430.50
08.02	und	12.00	6.82	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	81.84
08.03	und	1.00	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	77.95
08.04	und	1.00	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	78.21
08.05	und	1.00	2,355.78	2,355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,355.78

Segundo Michel Gonzalez Cujul  
REPRESENTANTE COMUN  
CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho  
ING. CIVIL

000196



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

REGISTRACION LICITACION PUBLICA N° 06-2020-C50 GRL  
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR 82066 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region Loreto  
Provincia ALTO AMAZONAS  
Distrito LAGUNAS

SI. 3.872.652.12

SI. 0.00

SI. 0.00

SI. 3.872.652.12

Fecha de Inicio de Obra  
Plazo de Ejecucion  
1° Paralización  
2° Paralización

01-Dic-20  
180 Días

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

3° Paralización

30-May-21

**VALORIZACION MENSUAL N° 01  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2020**

TEC	PREPUESTO		AVANCE DE OBRA				AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR		
	UNID	METRADO	P. UNO	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		Metrado	Metrado	Metrado	Valorizado
				Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado				
<b>TANQUE ELEVADO</b>											
1	m	20.00	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	520.60
2	m	15.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	173.70
3	und	1.00	1,804.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,804.91
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>											
<b>SALIDAS</b>											
1	plo	148.00	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	7,351.16
2	plo	23.00	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	1,548.13
3	plo	18.00	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	1,221.30
4	plo	61.00	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	4,012.58
5	plo	2.00	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	139.42
6	plo	45.00	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	2,235.15
7	plo	15.00	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,017.75
<b>CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS</b>											
1	m	841.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.26	4,014.29
2	m	258.76	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.76	1,756.98
3	und	1.00	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70.52
<b>CONDUCTORES Y/O CABLES</b>											
1	m	80.00	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2,156.80
2	m	80.00	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1,154.40
3	m	175.00	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	6,988.50
4	m	40.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	403.20
5	m	193.00	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	5,506.29
6	m	193.00	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	2,485.54
7	m	948.40	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.40	5,140.33
8	m	1,144.03	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.03	5,605.75
<b>TABLEROS Y PUCHILLAS</b>											
1	und	1.00	987.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	987.43
2	und	1.00	1,072.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,072.86
3	und	1.00	1,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,646.80
4	und	4.00	1,747.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6,991.44
5	und	1.00	1,087.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,087.86
<b>ARTEFACTOS ELECTRICOS</b>											
1	pza	54.00	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	5,539.32
2	pza	93.00	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	6,629.97
3	pza	4.00	192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	770.32
4	und	15.00	132.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,992.30
5	und	45.00	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	16,708.50

000195

*Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho*  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401

Segundo Michel Gonzales Culqui  
REPRESENTANTE COMUN  
CONSORCIO LAGUNAS








"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Belén, 26 de enero de 2021

**CARGO**

Oficio n° 0235-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente



Asunto: Conformidad de valorización de obra n°  
01 - diciembre 2020 – Periodo 01.

Obra: "Mejoramiento de la Oferta Educativa Nivel  
Primaria en la Institución Educativa de Educación  
Básica Regular n.° 62056, Villa Lagunas del distrito de  
Lagunas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento  
de Loreto".

Ref.: a. Informe n° 030-2021-GRL-GRI-SGSyC/GMCZE  
b. Carta n° 007-2021-CCL-MSCHC/RC

Tengo el agrado de saludarle, en atención a la referencia a), remitir la valorización n° 01 por ejecución de obra, correspondiente a **diciembre de 2020** – periodo 01, revisada y aprobada por el Supervisor, el mismo que asciende a la suma de **Doscientos ochenta y nueve mil ciento trece con 41/100 Soles (S/. 289 113.41)**, sin incluir IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 01 diciembre 2020 – Periodo 01	S/. 289 113.41
Reajuste Actual	S/. 0.00
Amortización Adelanto Directo	S/. 28 911.34
Amortización Adelanto Materiales	S/. 0.00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/. 260 202.07</b>

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación que sustenta la supervisión, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO LAGUNAS**. Se adjunta Factura Electrónica E001-6.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
  
Ing. RAUL FLORES AGUEPUCHO  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: SGSyC – File obra (01)  
SGSyC – File correlativo (01)  
SGSyC – File personal (01)  
RFA – S.G.  
dap – Sec.  
TRAMITE: 02177





"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

**INFORME N°030-2021-GRL-GRI-SGSyC-GMCZE**

AL : Raúl Flores Aquepucho  
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

DE : Ing. Madeleine Zapata Espinoza  
COORDINADORA DE OBRA

ASUNTO : Remite Informe respecto a pago de valorización de Obra N°01  
**PROYECTO:** "Mejoramiento de la Oferta Educativa nivel primaria en la Institución Educativa de Educación Básica Regular N°62056 de Villa Lagunas del distrito de Lagunas- provincia de Alto Amazonas departamento de Loreto"

ASUNTO : Carta N°007-2021-CCL-MSCHC/RC

FECHA : Iquitos, 26 de ENERO DEL 2021.



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la presente documentación.

**1. GENERALIDADES DE OBRA**

Nombre de Obra : "Mejoramiento de la Oferta Educativa Nivel Primaria en la Institución Educativa de Educación Básica Regular 62056 de Villa Lagunas del Distrito de Lagunas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento de Loreto"

Ubicación : LAGUNAS – ALTO AMAZONAS - LORETO

Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Número de Proceso : LP N° 006-2020-CSO-GRL – (I Convocatoria)

**Contratista** : **CONSORCIO LAGUNAS**

Número de Contrato : 038-2020-GRL-GRI. (01-10-2020)

Modalidad de Ejecución : Suma Alzada

Fuente Financiamiento : Recursos Determinado - FIDICOMISO

Monto Contratado : S/ 3'872,652.12 (sin I.G.V.)

Plazo de Ejecución de Obra : 180 días calendario

Residente de Obra : Ing. Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho

Fecha de Entrega de Terreno : 16 De Octubre Del 2020

Fecha de Inicio Contractual : 01 de Diciembre del 2020

**Supervisor** : **CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS**

Número de Contrato : 027-2020-GRL-GGR-GRI (31-01-2020)

Modalidad de Ejecución : Esquema Mixto

Fuente Financiamiento : Recursos Determinado - FIDICOMISO

Plazo de Ejecución de Obra : 210 días calendario

Jefe de Supervisión : Eduardo Pinchi Vásquez

Grathy Madeleine Del Oliva Zapata Espinoza  
ING. CIVIL  
R. C.I.P. N° 211312



## 2. ANTECEDENTES

- ✓ Con fecha 11 de setiembre del 2020, el comité de selección de Obras adjudicó la buena pro de la LICITACION PUBLICA N°006-2020-CSO-GRL (I CONVOCATORIA) para la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N°62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO", a la Empresa Contratista CONSORCIO LAGUNAS, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del contrato
- ✓ Con fecha 01 de octubre del 2020, se suscribió el Contrato N°038-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa Contratista CONSORCIO LAGUNAS, para la ejecución de la obra mencionada, por un monto de S/ 3'872,652.12 (tres millones ochocientos setenta y dos seiscientos cincuenta y dos mil con 12/100 soles), y con un plazo de ejecución de cuatrocientos veinte (180) días calendario.
- ✓ Con fecha 28 de agosto del 2020, el comité de selección de Obras adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°009-2020-CSO-GRL (I CONVOCATORIA) para la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N°62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO", a la Empresa Contratista CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del contrato
- ✓ Con fecha 09 de setiembre del 2020, se suscribió el Contrato N°027-2020-GRL-GRI, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa Contratista CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS, para la ejecución de la obra mencionada, por un monto de S/ 316,522.50 (trescientos dieciséis mil quinientos veintidós con 50/100 soles), y con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario.
- ✓ La entrega de Terreno se dio el día 01 de diciembre del 2020
- ✓ Mediante Carta N°007-2021-CCL-MSCHC/RC, El Consorcio Supervisor Lagunas remite la Valorización de Obra N°01 para su pago correspondiente al periodo 01 al 31 de diciembre.





"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

### 3. ANÁLISIS


De acuerdo al informe presentado por el Residente y Supervisor de obra, en la que se describe, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización cuyos avances ejecutados y programados es el siguiente:

#### ✓ AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO

MES DE LA VALORIZACION	MONTO VALORIZADO	AMORTIZACION		SALDO POR AMORTIZAR (SIN I.G.V.)
		A/C * V DEL MES	AMORTIZACION ACUMULADA	
dic-20	289,113.41	28,911.34	28,911.34	358,353.87
ene-21	0.00	0.00	0.00	0.00
feb-21	0.00	0.00	0.00	0.00
mar-21	0.00	0.00	0.00	0.00
abr-21	0.00	0.00	0.00	0.00
may-21	0.00	0.00	0.00	0.00

#### ✓ PORCETAJE EJECUTADO VS PROGRAMADO

N° VAL.	PERIODO	CALENDARIO PROGRAMADO ACTUALIZADO				AVANCE EJECUTADO			
		SOLES		PORCENTAJE		SOLES		PORCENTAJE	
		MENSUAL	ACUMUL.	MENSUAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
1	01/12/2020	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DICIEMBRE 2020	355,167.44	355,167.44	9.17%	9.17%	289,113.41	289,113.41	7.47%	7.47%
3	ENERO 2021	425,782.03	780,949.47	10.99%	20.17%				
4	FEBRERO 2021	1,277,802.60	2,058,752.07	33.00%	53.16%				
5	MARZO 2021	673,923.39	2,732,675.46	17.40%	70.56%				
6	ABRIL	546,346.87	3,279,022.33	14.11%	84.67%				
7	MAYO 2021	593,609.32	3,872,631.65	15.33%	100.00%				
	TOTAL	3,872,631.65		100.00%		ESTADO DE LA OBRA			-1.71%

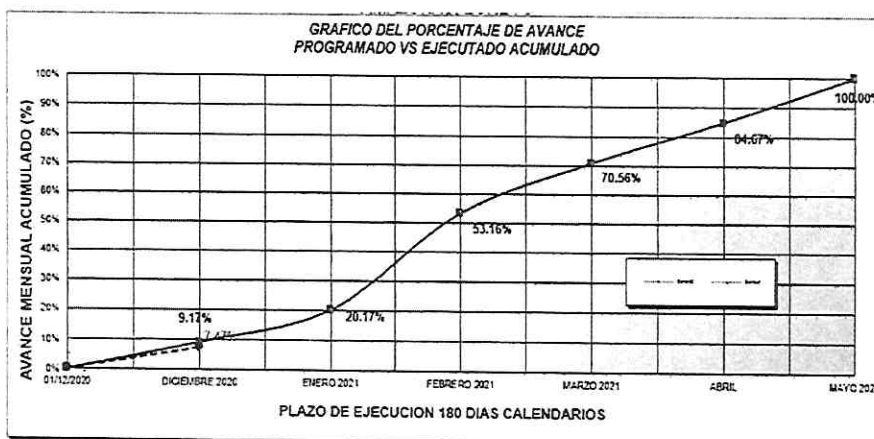

*[Signature]*  
Gruha Mediana y Pequeña Espinosa  
ING. CIVIL  
R. O.P. N° 211312





"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

- ✓ La obra en mención tiene un avance físico acumulado al mes de diciembre 2020 de 7.47% versus calendario programado acumulado al mismo periodo de 9.17%, siendo el estado de la Obra ATRASADA.

1. VALORIZACION N° 01 - Diciembre 2020

Monto Bruto ( a ) 289,113.41

Amortización

Adelanto Directo (10.00%) 28,911.34

Adelanto por Materiales (Según D.S. N° 079-VC, Ampliatorias y Modificatorias) -

28,911.34

260,202.07

2. REAJUSTES DE LA VALORIZACION N° 01

Monto Bruto

Deducción de reajuste que no corresponde ( b ) -

- Del adelanto directo -

- Del adelanto por materiales -

-

('b)

-

3. REGULARIZACION DE REAJUSTE VAL. N° 01

Monto Bruto

Deducción de reajuste que no corresponde ( c ) -

- Del adelanto directo -

- Del adelanto por materiales -

-

('c)

-

4. TOTAL A PAGAR

260,202.07

2'1) Valorización N° 01  
Deducción de reajuste que no  
corresponde

260,202.07

4) TOTAL A PAGAR

5. SENCICO

(  
(a)+(b)+(c)  
) x 2/1000 S/. 520.40



#### 4. COMENTARIO Y CONCLUSIONES

- ✓ En concordancia con la Cláusula Cuarta del Contrato N°038-2020-GRL-GRI, del Contratista describe lo siguiente: La Entidad se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, en soles, en periodos de valorización mensuales.
- ✓ Según lo estipulado en el artículo 194° del RLCE, las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el Supervisor y el Contratista.
- ✓ Bajo ese contexto, el Supervisor presenta la valorización de Obra N°01 correspondiente al mes de diciembre 2020, aprobando los metrados ejecutados en obra, conforme a lo estipulado en el contrato N°038-2020-GRL-GRI.
- ✓ De acuerdo a la documentación presentada por el Supervisor, donde éste aprueba los metrados ejecutados y da conformidad a la valorización presentada por el contratista, se recomienda a la Gerencia Regional de infraestructura tramitar el pago de la valorización de obra N°004 correspondiente al mes de diciembre 2020, por el monto **S/.260,202.07** **doscientos sesenta mil doscientos dos con 07/100 soles.**

Es todo cuanto informo a Ud. para los fines convenientes.

Atentamente,

  
Gredy Madeleine Dey Uscio Zapata Espinoza  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 211312

MADELEINE ZAPATA ESPINOZA  
Ing. Civil – Coordinadora de Obra



"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"

## PANEL FOTOGRÁFICO



VISTA DE LA IE N° 62056



Ing. Eduardo Pinchi Vásquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP: N° 55689

gundo Michel Gonzales Culqui  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho  
ING: CIVIL  
CIP: N° 41401


COLOCACION DE CARTEL DE OBRA



"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"



MAQUINARIA EN PUNTO DE OBRA

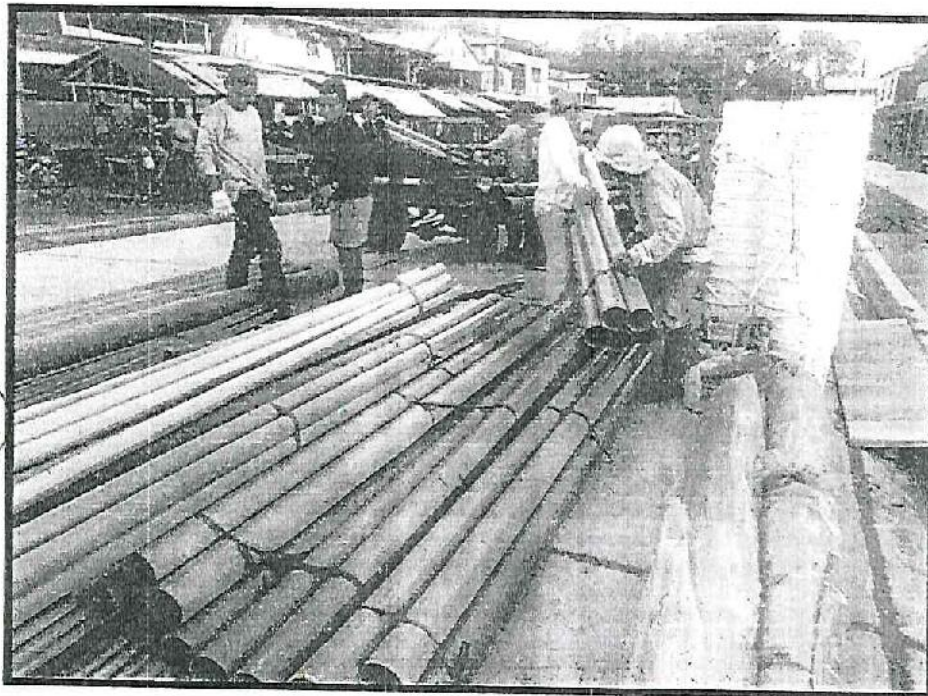

DESCARGUIO DE MATERIALES EN OBRA

*Segundo Michel Gonzales Cutqui*  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO LAGUNAS

*Ing. Eduardo Pinchi Vásquez*  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 55689

*Alfredo Ricardo Mármoledo Cucho*  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41402




"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"



TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO



  
Ing. Eduardo Pinchi Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689

TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO


  
Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401




"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"



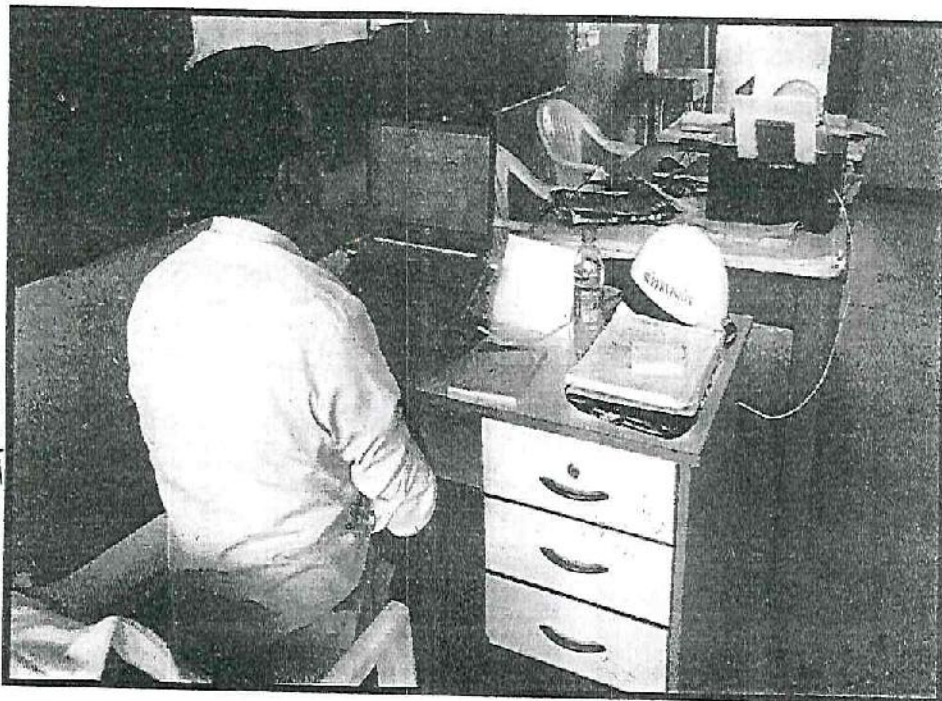

TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO



COORDINACION DE GABINETE CON EL SUPERVISOR DE OBRA


  
Segundo Michel Gonzales Cutqui  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO LAGUNAS

  
Ing. Eduardo Pinchi Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 55689

  
Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401




"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"

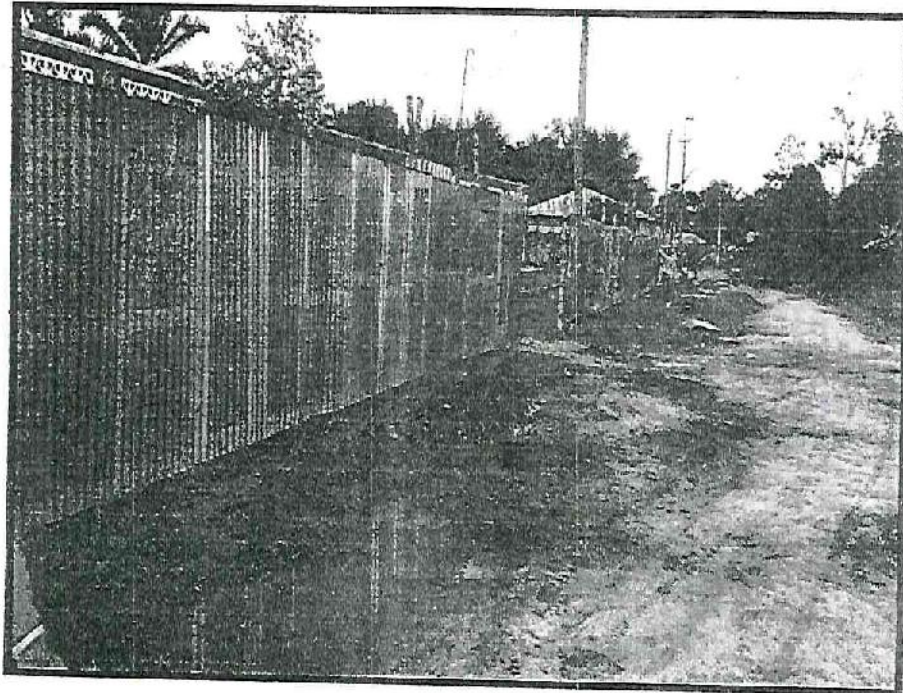

CERCO PERIMETRICO DE SEGURIDAD EN OBRA



CERCO PERIMETRICO DE SEGURIDAD EN OBRA


  
Ing. Eduardo Pinchi Vásquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689

  
Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401


  
do Michel Gonzales Cuzqui  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO LAGUNAS



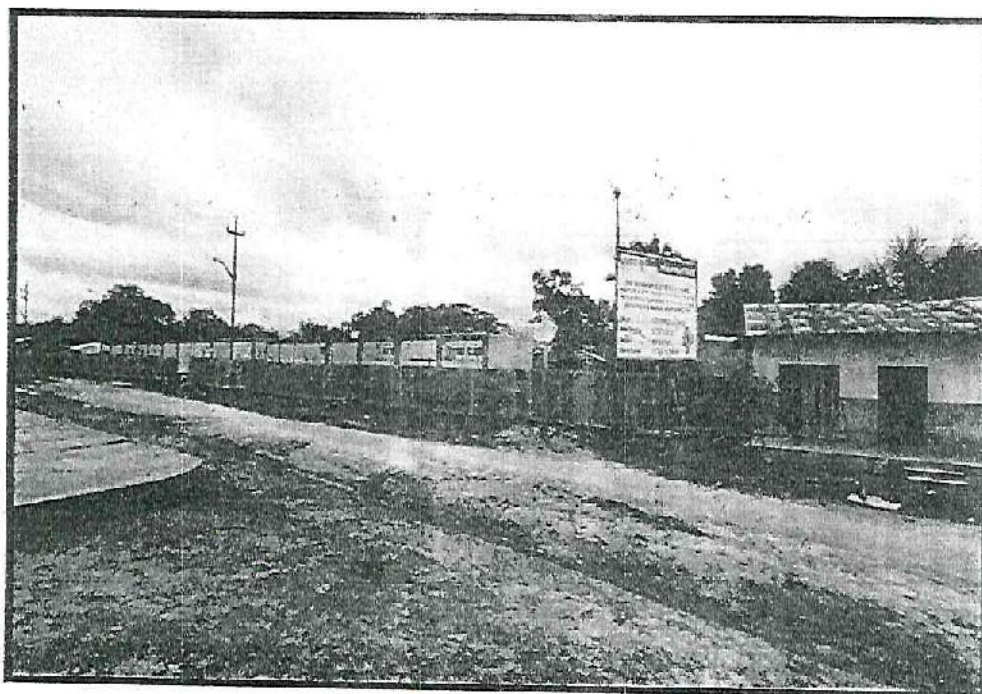

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"

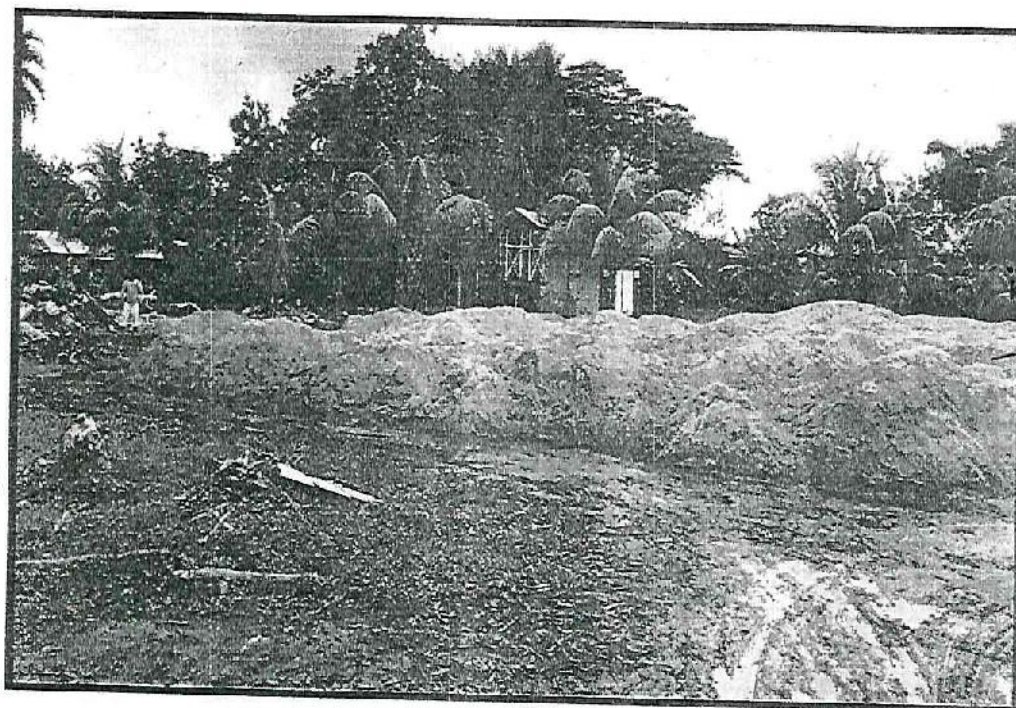


CERCO PERIMETRICO DE SEGURIDAD EN OBRA Y CARTEL DE OBRA



  
Ing. Eduardo Pinchi Vásquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689

  
Michel Gonzales Culqui  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO LAGUNAS

PUNTO DE ACOPIO DE ARENA EN OBRA

  
Alfredo Ricardo Marmolejo Cuzco  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401





# VALORIZACION

## N.º 2



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

**ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL**

**CONTRATO N° 038-2020-GRL-GGR-GRI**

**LICITACIÓN PÚBLICA 006-2020-CSO-GRL – (PRIMERA CONVOCATORIA)**

**"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – DEPARTAMENTO DE LORETO"**

Por la presente Acta, suscrita por una parte por el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO – SEDE CENTRAL, con RUC N° 20493196902, con domicilio legal en Av. Abelardo Quiñonez km 1.5 Belén – Maynas – Loreto, en adelante LA ENTIDAD, debidamente representado por el Gerente Regional de Infraestructura Ingeniero EDI WISBERTO RUIZ ZARATE, identificado con DNI N° 32914247, con las facultades que le confiere la Resolución Ejecutiva Regional N° 235-2019-GRL-GR, de fecha 26 de Marzo del 2019; y de otra parte el CONSORCIO LAGUNAS, con RUC N° 20606575191, con domicilio legal en Av. Jose Abelardo Quiñones Mz. B Lte. 07 – San Juan Bautista – Maynas – Loreto; consorcio conformado por las Empresas; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA E.I.R.L., con RUC N° 20528388869, con domicilio legal en Av. Jose Abelardo Quiñones Mz. B. Lte 07 – San Juan Bautista – Maynas – Loreto, inscrita en la Partida Electrónica N° 11040744, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Maynas, con una participación del 90%, debidamente representado por su Titular Gerente, Señor SEGUNDO MICHEL GONZALES CULQUI, identificado con DNI N° 43795812, según poder inscrito en inscrita en la Partida Electrónica N° 11040744, Asiento C00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Maynas; y la Empresa CONSTRUCTORA PREIMAQ S.A.C., con RUC N° 20393633990, con domicilio legal en Carretera Manantay km 2.5 (Ex Papelera) – Ucayali – Coronel Portillo – Manantay, inscrita en la Partida Electrónica N° 11051324, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Pucallpa, con una participación del 10%, debidamente representado por su Gerente General, Señor EDWIN PIO BARRIOS VARGAS, con DNI N° 40879153, según poder inscrito en la Partida Registral N° 11051324, Asiento N° C00001, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Pucallpa; que en común acuerdo designan como Representante Común del Consorcio al Señor SEGUNDO MICHEL GONZALES CULQUI, identificado con DNI N° 43795812, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:



CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS  
Marcos Sergio Chupillon Campos  
REPRESENTANTE COMÚN  
DNI N° 45419686

**I. ANTECEDENTES**

Con fecha 11 de Setiembre del 2020, el comité de selección de Obras adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 006-2020-CSO-GRL, para la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – DEPARTAMENTO DE LORETO", a la empresa contratista CONSORCIO LAGUNAS, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Con fecha 01 de Octubre del 2020, LA ENTIDAD suscribió el CONTRATO N° 038-2020-GRL-GGR-GRI entre el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO y la empresa contratista CONSORCIO LAGUNAS, para la ejecución de la obra mencionada, por un monto de S/ 3'872,652.12 (Tres Millones Ochocientos Setenta y dos Seiscientos Cincuenta y Dos Mil con 12/100 soles), y con un plazo de ejecución de Ciento Ochenta (180) días calendario.

Mediante Carta N° 066/2021-CCL-MSCHC/RC, de fecha 08 de Enero del 2021, el Consorcio Supervisor Lagunas el señor Marcos Sergio Chupillon Campos, Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS, remite a la GERENCIA REGIONAL DE

Segundo Michel Gonzales Culqui  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO LAGUNAS





"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFRAESTRUCTURA, con atención al Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zarate, Remite Informe de Jefe de Supervisión sobre Suspensión de Actividades en Ejecución de obra, para lo cual adjunta el Informe N° 005/2021-CSLAGUNAS/JS.EPINVAS, de fecha 07 de Enero del 2021 y las anotaciones del cuaderno de obra del Residente; con fecha 01 de enero del 2021, el residente de obra mediante el asiento N° 40, da a conocer a esta supervisión, la necesidad de Suspender la Ejecución de Trabajos Programados en la Ejecución de la Obra "Mejoramiento de la Oferta Educativa Nivel Primaria en la Institución Educativa de Educación Básica Regular N° 62056 de Villa Lagunas del Distrito de Laguna – Provincia de Alto Amazonas Departamento de Loreto" por presencia de lluvias intensas en días sucesivos, que pone en riesgo la normal ejecución de los trabajos programados y aprobados por la entidad, y aún más solicitud que nace en salvaguarda de los intereses de la entidad, y aún más solicitudes que nace en salvaguarda de los intereses de la entidad, tal como podemos verificar en el asiento correspondiente que corre a folios 029 del cuaderno de obra respectivo.

Con fecha 01 de enero del 2021, esta supervisión al ser comunicado la necesidad de suspender las actividades de ejecución de obra por parte de la contratista, mediante cuaderno de obra de folio 029, asiento N° 40 del Residente, y habiendo evidenciado cada uno de los sucesos citados en la misma es que procede a aprobar la Suspensión Respectiva en el asiento N° 41 de los folios 029 del cuaderno de obra, con fecha 01 de enero del 2021. Que el evento fortuito, presencia de lluvias, no atribuye a las partes vienen siendo verificadas por esta supervisión desde el inicio de lo citado por la residencia; que es necesidad técnica, administrativa y económica, proceder a la suspensión abierta de ejecución de obras en el Proyecto "Mejoramiento de la Oferta Educativa Nivel Primaria en la Institución Educativa de Educación Básica Regular N° 62056 de Villa Lagunas del Distrito de Lagunas – Provincia de Alto Amazonas Departamento de Loreto"; por las razones explicadas por la residencia.

Teniendo en cuenta las anotaciones del cuaderno de obra en donde el Residente y el Supervisor acuerdan Suspender el plazo Contractual de Obra debido a factores climatológicos desfavorables (lluvias)

## II.- MARCO NORMATIVO

Artículo 142° del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

"142.7. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, según corresponda al objeto de la contratación; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. (...)".

Artículo 178° del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

"178.1. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. (...). 178.3. Cuando se produzca la suspensión del contrato de obra según lo previsto en el numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspensión del contrato de supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Esta disposición también se aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en este numeral resulta aplicable a los contratos de supervisión de servicios. (...)".



CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS  
Marco Sempit Rupillón Campos  
REPRESENTANTE COMÚN  
DNI N° 10419686

Segunda Michel Gonzales Cullqui  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO LAGUNAS



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

**III.- ACUERDOS**

1. SUSPENDER EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – DEPARTAMENTO DE LORETO" y por ende, paralizar la ejecución de las actividades que forman parte contractual, a partir del **01 de Enero del 2021**, hasta que culmine los eventos (lluvias) causales de esta suspensión, y se pueda reiniciar los trabajos en obra.
2. Durante el Plazo de la suspensión del plazo de ejecución de la obra, las partes acuerdan que no irroga el reconocimiento de mayores gastos. Por lo que en este acto el Representante del CONSORCIO LAGUNAS, renuncia de forma voluntaria a los mismos.
3. Una vez cumplido el plazo señalado en el presente acuerdo, el Contratista presentará los calendarios actualizados, en la cual se detalle las modificaciones de las fechas de ejecución de la obra, respetando los términos en los que se acordó la suspensión; conforme lo señala el numeral 142.8 del artículo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
4. Lo indicado en el numeral 178.1 del artículo 178° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado es aplicable al contrato de supervisión.
5. El contrato de supervisión también se suspende, en las mismas condiciones descritas en los acuerdos precedentemente citados dando fe con la suscripción de la misma.

En señal de conformidad con lo señalado en el contenido de la presente Acta, en la ciudad de Iquitos, al 02 de Febrero del Año Dos Mil Veintiuno.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
*[Signature]*  
Ing. Edi Wisberno Ruiz Zarate  
Gerente Regional de Infraestructura  
LA ENTIDAD

*[Signature]*  
Segundo Michel Gonzales Quiqui  
REPRESENTANTE COMÚN  
CONSORCIO LAGUNAS

EL CONTRATISTA

CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS  
*[Signature]*  
Marcos Sergio Chapillon Campos  
REPRESENTANTE COMÚN  
DNI N° 16419686  
SUPERVISIÓN





# VALORIZACION

## N.º 3

SI. 3,872,652.12  
SI. 0.00  
SI. 0.00  
SI. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra  
Plazo de Ejecucion  
1° Paralización  
2° Paralización  
3° Paralización  
Fecha de Término de Obra Inicial  
Fecha de Término Contractual

01-Dic-20  
180 Días

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

**VALORIZACION MENSUAL N° 2**  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

30-May-21

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

UNID	METRADO	PRESUPUESTO		PARCIAL SI.	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
		P. UNID SI.	SI.		Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
M3	2.38	18.67	44.43	0.00	2.00	37.34	2.00	37.34	37.34	84.04	0.38	7.09
M3	1.52	18.84	28.64	0.00	1.00	18.84	1.00	18.84	18.84	65.78	0.52	9.80
M3	0.86	9.33	8.02	0.00	0.50	4.67	0.50	4.67	4.67	58.23	0.36	3.35
UND	38.00	101.08	3,841.04	0.00	24.00	2,425.92	24.00	2,425.92	2,425.92	63.16	14.00	1,415.12
UND	124.24	33.47	4,158.31	0.00	120.00	4,016.40	120.00	4,016.40	4,016.40	96.59	4.24	141.91
M	570.34	6.67	3,804.17	0.00	100.00	667.00	100.00	667.00	667.00	17.53	470.34	3,137.17
M2	698.72	10.91	7,623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.72	7,623.04
UND	10.00	546.73	5,467.30	0.00	10.00	5,467.30	10.00	5,467.30	5,467.30	100.00	0.00	0.00
M	428.82	10.24	4,391.12	0.00	350.00	3,584.00	350.00	3,584.00	3,584.00	81.62	78.82	807.12
M2	352.69	29.06	10,249.17	0.00	300.00	8,718.00	300.00	8,718.00	8,718.00	85.06	52.69	1,531.17
M	30.63	9.31	285.17	0.00	20.00	185.20	20.00	185.20	185.20	0.63	10.63	98.97
M2	278.29	25.89	7,204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.29	7,204.93
M2	25.08	25.89	649.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08	649.32
M2	25.08	8.11	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08	203.40
M2	13.61	22.24	302.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	302.69
UND	3.00	477.13	1,431.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1,431.39
UND	4.00	411.71	1,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,646.84
UND	2.00	361.71	723.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	723.42
UND	1.00	364.27	364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	364.27
UND	1.00	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	86.28
UND	37.00	90.19	3,337.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	3,337.03
UND	8.00	74.86	598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	598.88
UND	2.00	8.17	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.34
UND	20.00	6.78	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	135.60
M3	1.98	13.07	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	25.88
M3	0.28	13.07	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	3.66
M3	1.49	18.84	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	28.07
M2	5.70	32.94	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	187.76
M3	1.34	9.33	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	12.50
UND	1.00	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	169.92

000248

INGENIERO CIVIL  
Ing. Eduardo Pinchi Vasquez  
CIP N° 55689

Segundo Michel Gonzales Culqui  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho  
ING. CIVIL  
CIP N° 41401







**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region Loreto  
Provincia Alto Amazonas  
Distrito Lagunas

SI. 3,872,652.12  
SI. 0.00  
SI. 0.00  
SI. 3,872,652.12


Fecha de Inicio de Obra 01-Dic-20  
Plazo de Ejecucion 180 Dias  
1ª Paralización  
2ª Paralización  
3ª Paralización  
Fecha de Término de Obra Inicial 30-May-21  
Fecha de Término Contractual


**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 2  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

UNID	METRADO	P. UNID	PASCAL	PRESUPUESTO		AVANCE ANTERIOR		AVANCE DE OBRA		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
				Metrado	P. UNID	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
3	2.00	7.86	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	15.72
3 CODO PVC SAP 90° DE 2"													
INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES													
CENTRO DE LUZ Y ARTEFACTOS DE ALUMBRADO													
PTO	17.00	184.21	3,131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	3,131.57
CENTRO DE LUZ con conductor de Cu THW 2-1x2.5mm2 en Tubería PVC SEL de 20mm													
UND	17.00	90.22	1,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	1,533.74
EQUIPO FLUORESCENTE 2*36 W 220V-60Hz													
UND	5.00	24.19	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	120.95
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO SIMPLE 15A-250V-60Hz													
UND	3.00	26.19	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	78.57
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DOBLE 15A-250V-60Hz													
SALIDA DE FUERZA - BAJA TENSION													
PTO	13.00	105.87	1,376.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	1,376.31
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR CON PUESTA A TIERRA - PARA USO GENERAL													
TABLEROS ELECTRICOS													
JGO	1.00	1,594.83	1,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,594.83
TABLERO GENERAL TG-2 220V-60Hz DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS													
M3	0.68	23.84	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	16.21
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OTROS PARA TENDIDO DE CABLES EXCAVACION DE ZANJA PARA TENDIDO DE CABLES ALIMENTADORES SUBTERRANEOS													
M3	0.65	10.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	6.50
RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO													
UND	6.00	142.32	853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	853.92
CAJA DE MORTERO PARA PASO DE CONDUCTORES ELECTRICOS													
M	65.00	6.70	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	435.50
CAJA DE MORTERO PARA PASO DE 0.35M*0.35M INCLUYE TAPA CONDUCTORES ELECTRICOS													
M	70.00	8.95	626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	626.50
COND. CU. THW 2*2.5 mm2 en tub. PVC-SEL DIAM. 3/4"													
M	10.00	11.65	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	116.50
COND. CU. THW 2*4mm2 + 2*2.5mm2 EN TUB. PVC-SEL DE 3/4"													
COND. CU. FREETOX N2XOH 0.6/1 KV 3-1*4 + 1 *4mm2 en tub. PVC SEL DE 3/4"													
JGO	1.00	1,004.68	1,004.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,004.68
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA													
JGO	1.00	1,004.68	1,004.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,004.68
POZO DE PUESTA A TIERRA - PARA TABLERO GENERAL													
PLAN COVID-19 (E)													
M2	322,655.34	0.03	9,679.66	0.00	0.00	161,327.67	4,839.83	161,327.67	4839.83	161,327.67	4839.83	161,327.67	4,839.83
LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL CENTRO DE TRABAJO													
DESINFECCION DE LA ZONA DE TRABAJO													
UND	48.00	28.24	1,355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	1,355.52
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR PREVIO AL REGreso O REINCORPORACION AL CENTRO DE TRABAJO													
UND	4.00	1,856.38	7,425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	7,425.52
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR ANTES DE INGRESAR AL TRABAJO													
UND	24.00	59.08	1,417.92	0.00	0.00	24.00	1,417.92	24.00	1,417.92	24.00	1,417.92	24.00	1,417.92
LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO													
UND	2.00	558.50	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,117.00
LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO													
UND	3.00	226.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	678.00
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE TRABAJO													
UND	2.00	1,117.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,234.00
SEÑALIZACION PREVENTIVA -PANELES INFORMATIVOS COVID-19													
UND	3.00	226.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	678.00
MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACION COLECTIVA													
UND	2.00	558.50	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,117.00
LIMPIEZA Y DESINFECCION ANTES DE INGRESAR A AREAS COMUNES													
UND	3.00	226.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	678.00
CONTENEDORES SANITARIOS PARA EQUIPO DE PROTECCION USADOS													

000245

  
**Ing. Eduardo Pinjar Vasquez**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. N° 55669

  
**Segundo Michel Gonzales Cuiqui**  
 Representante Común  
 CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuzco  
 INGE. CIVIL  
 CIP. N° 41401



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

1 LICITACION PUBLICA N° 06-2024-CSO GRL  
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62066 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region LORETO  
Provincia ALTO AMAZONAS  
Distrito LAGUNAS

SI. 3,872,652.12  
SI. 0.00  
SI. 0.00  
SI. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra  
Plazo de Ejecucion  
1° Paralización  
2° Paralización  
3° Paralización  
Fecha de Término de Obra Inicial  
Fecha de Término Contractual

ING. EDUARDO PINCHYASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO  
**VALORIZACION MENSUAL N° 2**  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

30-May-21

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

UND	METRADO	P. UND	PARCIAL	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
				Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
UND	180.00	15.00	2,700.00	0.00	0.00	90.00	1,350.00	90.00	1,350.00
UND	180.00	222.00	39,960.00	0.00	0.00	60.00	13,320.00	120.00	26,640.00
UND	1.00	4,728.00	4,728.00	0.00	0.00	1.00	4,728.00	0.00	0.00
UND	1.00	6,127.50	6,127.50	0.00	0.00	1.00	6,127.50	0.00	0.00
UND	1.00	10,716.00	10,716.00	0.00	0.00	1.00	10,716.00	0.00	0.00
UND	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00
UND	8,640.00	1.00	8,640.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	5,760.00	5,760.00
UND	180.00	176.94	31,849.20	0.00	0.00	60.00	10,616.40	120.00	21,232.80
UND	5.00	14.20	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	71.00
UND	5.00	14.20	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	71.00
UND	5.00	113.16	565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	565.80
UND	5.00	672.00	3,360.00	0.00	0.00	1.50	1,008.00	3.50	2,352.00
UND	53.00	151.04	8,005.12	0.00	0.00	53.00	8,005.12	0.00	0.00
TON	0.50	150.00	75.00	0.00	0.00	0.50	75.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL ( A+B+C+D+E)</b>			<b>3,872,652.12</b>	<b>261,230.94</b>	<b>591,801.89</b>	<b>853,032.83</b>	<b>853,032.83</b>	<b>3,019,619.29</b>	<b>3,019,619.29</b>
<b>FACTOR DE RELACION =</b>			<b>3,872,652.12</b>	<b>261,230.94</b>	<b>591,801.89</b>	<b>853,032.83</b>	<b>853,032.83</b>	<b>3,019,619.29</b>	<b>3,019,619.29</b>
				6.75%	15.28%	22.03%	77.97%	100.00%	100.00%

000245

Ing. Eduardo Pinchyr Vásquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689

Segundo Michel Gonzales Ciliqui  
Representante CONIUD  
CONSORCIO LAGUNAS

PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL AL MES DE FEBRERO 2,021  
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO AL MES DE FEBRERO 2,021







"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**CARGO**

Belén, 18 de marzo de 2021

Oficio n° 0810-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mg. Artemio Del Águila Panduro  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente



Asunto: Conformidad de valorización de obra n° 02  
Febrero 2021.

Obra: "Mejoramiento de la Oferta Educativa Nivel  
Primaria en la Institución Educativa de Educación  
Básica Regular n.° 62056, Villa Lagunas del distrito de  
Lagunas – Provincia de Alto Amazonas – Departamento  
de Loreto".

Ref.: a. Informe n° 0042-2021-GRL-GRI-SGSyC/CDPBG  
b. Carta n° 011-2021-CCL-MSCHC/RC  
c. Informe n° 014-2021-CSLAGUNAS/JS.EPINVAS  
d. Carta n° 013-2021-CL

Tengo el agrado de saludarle, en atención a la referencia a), remitir la valorización n° 02 por ejecución de obra, correspondiente a **febrero del 2021**, revisada y aprobada por el Supervisor, el mismo que asciende a la suma de **Quinientos noventa y un mil ochocientos uno con 17/100 Soles (S/. 591 801.17)**, sin incluir IGV, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 02 febrero 2021	S/. 591 801.17
Reajuste Actual	S/. 0.00
Amortización Adelanto Directo	S/. 59 180.12
Amortización Adelanto Materiales	S/. 130 991.56
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/. 401 629.50</b>

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación que sustenta la supervisión, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO LAGUNAS**. Se adjunta Factura Electrónica E001-8.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO  
Sub Gerente de Supervisión y Control



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

**INFORME N°0042-2021-GRL-GRI-SGSyC-CDPBG**



AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho  
**SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

DE : Arq. Carolina del Pilar Baneo Garate  
**COORDINADORA DE OBRA**

ASUNTO : REMITO INFORME DE DOCUMENTACION, VALORIZACION DE OBRA  
N° 02 – FEBRERO 2021 (CONTRATISTA)

REFERENCIA: (1) Obra: **“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”**.  
(02) Carta N°011-2021-CLC-MSCHR/RC  
(03) Informe N° 014-2021-CCL-MSCHR/RC  
(03) Carta N° 013-2021/CL  
(04) Trámite: 4863

FECHA : Iquitos, 09 de marzo del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la presente documentación de la obra: **“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”**, respecto a la Valorización N° 02 correspondiente al mes de febrero del 2021.

**1. DATOS TECNICOS**

**• DATOS DE LA OBRA**

Nombre de la obra : **“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”**,

Ubicación :  
Localidad : Lagunas  
Distrito : Lagunas  
Provincia : Alto Amazonas  
Región : Loreto

COORDINADORA DE OBRA: ARQ. Baneo GARATE, CAROLINA DEL PILAR  
– REG. CAP. N° 18391

MONTO CONTRATADO : S/. 3,872,652.12 (sin I.G.V.)





“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

INICIO DE OBRA : 01 de diciembre del 2020  
PLAZO DE EJECUCION : 180 Días Calendario.

SUSPENSIÓN DE PLAZO 01 : 10 Días calendario  
Fecha de Acta de Suspensión 01 : 01/02/2021  
Nuevo Termino de Plazo : 08/07/2021

ESTADO DE OBRA : **EJECUCION.**  
ADELANTO DIRECTO : 387,625.12 SOLICITADO  
ADELANTO DE MATERIALES : 774,530.42 SOLICITADO  
AVANCE FISICO DEL MES : 15.28%  
AVANCE FISICO ACUMULADO : 22.75%  
%Avance Programado al mes :14.45%  
%Avance Programado Acumulado: 21.91 %

• **DATOS DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA : **CONSORCIO LAGUNAS**  
CONCURSO : L.P. N° 006-2020-CSO-GRL  
RESIDENTE : **ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO**  
CONTRATO : N° 038-2020-GRL-GGR-GRI.  
MONTO CONTRATADO : S/ 3'872,524.99, con IGV.  
FIRMA DE CONTRATO : 01 de octubre del 2020.  
PLAZO DE EJECUCION : 180 Días Calendarios.

• **DATOS DE LA SUPERVISION**

CONSULTOR : **CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS**  
JEFE DE SUPERVISIÓN : **ING. PINCHI, VASQUEZ, EDUARDO. – REG. CIP. 55689.**  
CONTRATO : N° 027-2020-GRL-GGR-GRI.  
PLAZO DE EJECUCION : 240 Días Calendarios.

**2. ANTECEDENTES DE OBRA:**

- ✓ **Con fecha 27 de febrero del 2019:**  
Se aprueba el Expediente Técnico de “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”, mediante Resolución de alcaldía N° 050-2019-MDL/A.020
- ✓ **Con fecha 11 de setiembre del 2020**  
Se adjudica la buena pro de la Licitación Publica N° 0006-2020-CSO-GRL de la obra en mención.
- ✓ **Con fecha 01 de octubre del 2020:**  
Se firma el contrato de ejecución de la obra en mención, entre el Gobierno Regional de Loreto y el CONSORCIO LAGUNAS, mediante Contrato N° 038-GRL-GRI
- ✓ **Con fecha 25 de noviembre del 2020:**



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Mediante Carta N° 923-2020-GRL-GRI-SGSYC, se comunica al CONSORCIO LAGUNAS la reformulación de la Formula Polinómica.

- ✓ **Con fecha 15 de noviembre del 2020:**  
Se realiza la entrega de terreno
  
- ✓ **Con fecha 01 de Diciembre del 2020:**  
Se da inicio a la obra: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRTITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”.
  
- ✓ **Con fecha 01 de Enero del 2021:**  
Mediante Acta de suspensión de Plazo de Ejecución del Contrato N° 038-2020-GRL-GGR-GRI, se suspenden las actividades de ejecución de obra por motivos de presencia de lluvia, que imposibilitan el desarrollo de las actividades.
  
- ✓ **Con fecha 05 de marzo del 2021:**  
Mediante Carta N° 011-2021-CCL-MSCHC/RCCSA-RC CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS presenta segunda Valorización – correspondiente al mes FEBRERO DEL 2021.

### 3. **DOCUMENTOS PRESENTADOS:**

Con Carta N° 013-2021/CL CONSORCIO LAGUNAS recepcionada por el Supervisor el 01 de marzo del 2021, el Contratista presenta al Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA la Valorización de Ejecución de Obra N° 02 correspondiente al mes de febrero del 2021, en la cual hace de conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA
- CARTA N° N° 013-2021/CL DEL CONTRATISTA
- ANEXO N° 01 – REQUISITOS PARA PAGO DE VALORIZACION
- FACTURA ELECTRONICA E001-7
- COPIA DE COMPROBANTES DE PAGO
- DOCUMENTACION TECNICA
- RESUMEN DE PAGOS DE VALORIZACIONES
- AMORTIZACIONES DE ADELANTOS
  - ADELANTO DIRECTO
  - ADELANTO DE MATERIALES
- COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO
- INDICE UNIFICADO
- CALENDARIO PROGRAMADO VALORIZADO ACTUALIZADO
- CONTROL DE CALIDAD
- PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
- CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE
- PAGO DE TRIBUTOS
  - SENCICO
  - ESSALUD
  - ONP
  - SCTR
  - CONAFOVICER
  - COPIA DE PLANILLAS DE JORNALES





- COPIA DE DECLARACION PDT – SUNAT
- COPIA EL CUADERNO DE OBRA  
DESDE EL ASIENTO N° 44 AL ASIENTO N° 71 – MES DE FEBRO 2021
- RELACION DE PERSONAL TECNICO
- INFORME DE ACTIVIDADES  
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
- PANEL FOTOGRAFICO
- COPIA DE CARTAS FIANZAS  
FIEL CUMPLIENTO  
ADELANTO DIRECTO  
ADELANTO DE MATERIALES  
PLAN COVID 19  
ANEXOS  
REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y SATURACION DE OXIGENO DE CADA TRABAJADOR.

**4. ASPECTO LEGAL DE OBRA**

- ✓ **01 de octubre del 2020**  
*Contrato de Ejecución de Obra N° 038-2020-GRL-GGR-GRI*
- ✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento N° 30225 modificado por Decreto Legislativo N° 1444 aprobado por D.S. N° 344-2018-EF y el Código Civil Vigente.
- ✓ Con fecha 17 de agosto del 2020, el Sub Gerente de Supervisión y Control emite Carta N°0159-2021-GRL/GRI-SGSyC asignando funciones de Coordinadora a la suscrita.

**5. CONTROL DE VIGENCIAS DE CARTAS FIANZAS DE OBRA**

Del control de cartas fianzas de Obra, tenemos:

ESTADO DE CARTAS FIANZAS					
N°	CONCEPTOS	DOCUMENTO QUE SUSTENTA SOLICITUD DE DESEMBOLSO	MONTO (\$/)	INICIO DE VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA
1	Fiel Cumplimiento	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	387,265.21	22 de septiembre del 2020.	18 de Junio del 2021
2	Adelanto Directo	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	368,015.30	05 de enero del 2021.	05 de Abril del 2021
3	Adelanto de Materiales	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	774,530.42	02 de marzo del 2021.	31 de mayo del 2021

**6. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS**

Con respecto a los Metrados de la Valorización N° 02 de la obra en mención en la referencia (1), se informa que en gabinete se ha efectuado la revisión de la



documentación alcanzada a la suscrita, para lo cual el supervisor indica en folio 262 al 257 del file presentado a la Entidad.

## 7. RESUMEN DE VALORIZACION

De acuerdo a la documentación presentada por la Supervisión con respecto a la **Valorización N° 02** de la obra mencionada en la referencia (1), se informa que se ha revisado en gabinete la documentación alcanzada a la suscrita luego de que los metrados para la elaboración de la valorización fuesen aprobados por el Residente y el Supervisor de la obra, para lo cual se presenta un resumen de la misma, tenemos:

VALORIZACION N° 02 - FEBRERO 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	S/591,801.17
REAJUSTE NETO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/59,180.12
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	S/130,991.56
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/401,629.50
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/401,629.50

*“De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Art. 194° Valorizaciones y metrados:*

*194.1 Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.*

*...*

*194.6 El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.*

*194.7 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.” Revisarlo en el RLCE.*

## 8. ESTADO FISICO FINANCIERO ACTUAL DE OBRA

Del estado físico financiero actual de Obra, tenemos:






“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

N° VAL.	PERIODO	CALENDARIO PROGRAMADO ACTUALIZADO				AVANCE EJECUTADO			
		SOLES		PORCENTAJE		SOLES		PORCENTAJE	
		MENSUAL	ACUMUL.	MENSUAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DICIEMBRE 2020	289,113.41	289,113.41	7.47%	7.47%	289,113.41	289,113.41	7.47%	7.47%
3	FEBRERO 2021	559,576.01	848,689.42	14.45%	21.91%	591,801.17	880,914.58	15.28%	22.75%
4	MARZO 2021	684,242.68	1,532,932.10	17.67%	39.58%				
5	ABRIL 2021	772,779.48	2,305,711.58	19.95%	59.54%				
6	MAYO 2021	610,404.79	2,916,116.37	15.76%	75.30%				
7	JUNIO 2021	561,472.16	3,477,588.53	14.50%	89.80%				
8	JULIO 2021	395,063.59	3,872,652.12	10.20%	100.00%				
<b>TOTAL</b>		<b>3,872,652.12</b>		<b>100.00%</b>		<b>ESTADO DE LA OBRA</b>	<b>EN TIEMPO</b>		<b>0.83%</b>

- o De la figura tenemos, al término del Noveno mes contractual del plazo de ejecución de obra (febrero del 2021), el estado de **AVANCE ACUMULADO** de obra respecto a lo programado es **ADELANTADA**.
- o De la figura tenemos, al término del Segundo mes contractual del plazo de ejecución de obra (febrero del 2021), el estado de **AVANCE MENSUAL EJECUTADO ES DE 15.28 % respecto al AVANCE PROGRAMADO de 14.45%** teniendo que la **OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA EN UN 0.83%**.

### 9. CURVA DE AVANCE DE OBRA

Del Avance de Obra comparado entre el Avance Programado vs. Avance Ejecutado, tenemos:

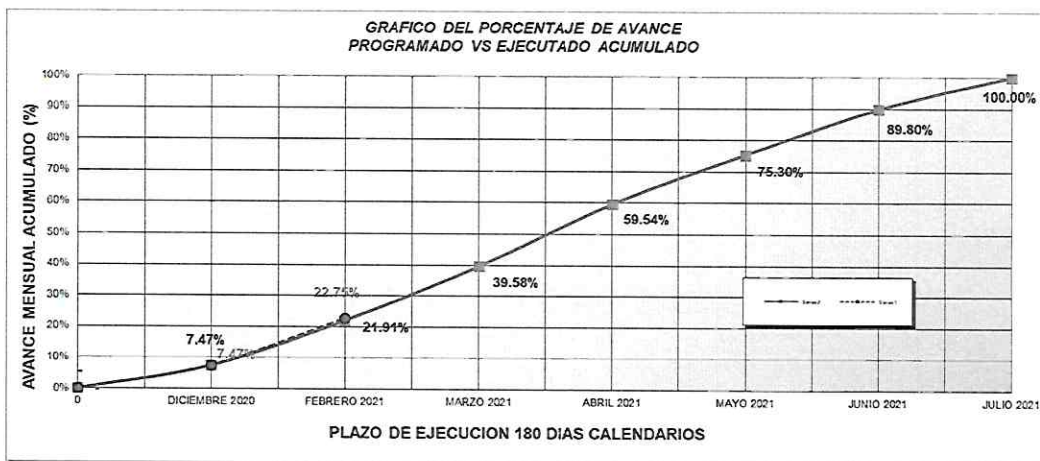

Mediante el grafico se observa que el avance físico de la obra correspondiente al mes de febrero del 2021 es de 15.28%, el avance físico acumulado es de 22.75%

### 10. AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO DE OBRA

De la Amortización del Adelanto Directo de Obra, tenemos:



AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

M. CONTRATADO C = S/. 3,872,652.12 S/IGV  
A OTORGADO A = S/. 387,265.21 S/IGV  
A/C= 10.00%

AMORTIZACION = A/C \* V

MES DE LA VALORIZACION	MONTO VALORIZADO	AMORTIZACION		SALDO POR AMORTIZAR (SIN I.G.V.)
		A/C * V DEL MES	AMORTIZACION ACUMULADA	
Dic-20	289,113.41	28,911.34	28,911.34	358,353.87
Ene-21	-	-	-	-
Feb-21	591,801.17	59,180.12	88,091.46	299,173.75
Mar-21	0.00	0.00	0.00	0.00
Abr-21	0.00	0.00	0.00	0.00
May-21	0.00	0.00	0.00	0.00
Jun-21	0.00	0.00	0.00	0.00

De la figura tenemos, la Amortización del Adelanto Directo en el mes de **FEBRERO DEL 2021** es **S/ 59,180.12 (CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA CON 12/100 SOLES)**.

**11. OBSERVACIONES LA DOCUMENTACION:**

- ✓ De la documentación tramitada por el Contratista y Supervisión, se evidencia:
  - Se hace notar que en lo posible para los registros fotográficos se evidencie la presencia del Ingeniero Residente de obra.

**12. CONCLUSIONES**

- ✓ Se comunica que la suscrita ha realizado la verificación y análisis de la documentación presentada por el Supervisor **CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS**. en gabinete, donde previamente se da conformidad a los Metrados conciliados en conjunto por el Jefe de Supervisión y el Residente de Obra los mismos que fueran anotados en el Cuaderno de Obra.
- ✓ Se comunica que en la presente Valorización el **AVANCE REAL PARCIAL DE OBRA** de **15.28 %**, logrando un **AVANCE REAL ACUMULADO DE OBRA** del **22.75 %**, RESPECTO A LO PROGRAMADO **21.91%**, **AL MES DE FEBRERO**. Por tanto, la Obra se encuentra **ADELANTADA** según lo programado. Dichos porcentajes se han verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 02 – FEBRERO del 2020 alcanzadas a la suscrita.
- ✓ Se comunica que el Monto Total Valorizado por el Contratista es de **S/ 591,801.17 (QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS UNO CON 17/100 SOLES)**; debiéndosele pagar un Monto Total **S/ 401,629.49 (CUATROCIENTOS UN MIL SEIS CIENTOS VEINTI NUEVE CON 50/100**





“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

**SOLES**); dicho monto se ha verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 02 – FEBRERO del 2021 alcanzados a la suscrita y aprobados por la Supervisión – CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONIA.

VALORIZACION N° 02 - FEBRERO 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	S/591,801.17
REAJUSTE NETO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/59,180.12
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	S/130,991.56
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/401,629.50
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/401,629.50

### 13. RECOMENDACIONES


- ✓ Se recomienda proceder de acuerdo a L.C.E. y R.L.C.E. a fin de corresponder con los trámites administrativos pertinentes.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

  
.....  
Carolina Del Pilar Baneo Gárate  
ARQUITECTA  
C.A.P. N°18391

Arq. Carolina del Pilar Baneo Gárate.  
COORDINADORA DE OBRA





"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

Lagunas, 04 de Febrero de 2021

**CARTA N° 011 – 2021 – CCL – MSCHC/RC**

Señor:

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

Atención : Gerencia Regional de Infraestructura.

Asunto : REMITE INFORME DE VALORIZACION N° 02 DE LA CONTRATISTA – CONSORCIO LAGUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO"

Referencia :

1. INFORME N° 14 – 2021 – CSLAGUNAS/JS.EPINVAS
2. Ssupervisión de la Obra : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO"
3. Contrato N° 027– 20120– GRL/GRI

De mi especial Consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del contrato vigente, traslado informe de JEFE DE SUPERVISOR sobre LA VALORIZACION N° 02 DEL CONTRATISTA CONSORCIO LAGUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO", para su evaluación y trámite correspondiente.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS

Marcos Sergio Obujón Campos  
REPRESENTANTE DOMIN  
DNI N° 16419686

PROVEIDO N° 04863  
A Arg. Carolina Bar. e



04 file  
01/02  
PROVEIDO N° 4863  
03/03/2021  
Arg. Carolina Bar. e









**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

LORETO  
ALTO AMAZONAS  
LAGUNAS

Region  
Provincia  
Distrito

01-Dic-20  
180 Días

OBRA  
"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

SI, 3.872.652.12  
SI, 0.00  
SI, 0.00  
SI, 3.872.652.12

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 2  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

30-May-21

Fecha de Inicio de Obra  
Plazo de Ejecucion  
1ª Paralización  
2ª Paralización  
3ª Paralización  
Fecha de Término de Obra Inicial  
Fecha de Término Contractual

UNO	METRADO	PRESUPUESTO		PARCIAL		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
		P. UNO	S.	S.	SI.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
m3	123.56	489.53	60,486.33	0.00	0.00	12,546.65	25.63	12,546.65	25.63	12,546.65	20.74	97.93	47,939.88
m2	276.58	27.37	7,569.99	0.00	0.00	6,842.50	250.00	6,842.50	250.00	6,842.50	90.39	26.58	727.49
m3	13.86	543.16	7,528.20	0.00	0.00	3,394.75	6.25	3,394.75	6.25	3,394.75	45.09	7.61	4,133.45
m2	179.67	27.37	4,917.57	0.00	0.00	2,272.80	83.04	2,272.80	83.04	2,272.80	46.22	96.63	2,644.77
m3	1,210.82	46.69	56,533.19	0.00	0.00	1,692.24	36.03	1,692.24	36.03	1,692.24	2.38	1,174.79	54,850.95
m3	230.05	543.16	124,953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.05	124,953.96
m2	79.12	27.37	2,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.12	2,165.51
<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>													
<b>ZAPATAS</b>													
m3	67.38	603.01	40,630.81	0.00	0.00	37,881.09	62.82	37,881.09	62.82	37,881.09	93.23	4.56	2,749.72
kg	1,544.17	5.74	8,863.54	0.00	0.00	8,697.06	1,509.94	8,697.06	1,509.94	8,697.06	97.78	34.23	196.48
<b>VIGA DE CIMENTACION</b>													
m3	28.51	603.01	17,191.82	0.00	0.00	17,191.82	28.51	17,191.82	28.51	17,191.82	100.00	0.00	0.00
kg	1,475.67	5.74	8,470.35	0.00	0.00	8,470.35	1,475.67	8,470.35	1,475.67	8,470.35	100.00	0.00	0.00
kg	1,449.59	4.85	7,030.51	0.00	0.00	6,479.12	1,335.90	6,479.12	1,335.90	6,479.12	92.16	113.69	551.39
<b>COLUMNAS</b>													
m3	36.92	603.01	22,263.13	0.00	0.00	14,058.16	23.31	14,058.16	23.31	14,058.16	63.14	13.61	8,206.97
m2	512.21	27.37	14,019.19	0.00	0.00	10,022.89	366.20	10,022.89	366.20	10,022.89	71.49	146.01	3,996.30
kg	3,029.70	5.74	17,390.48	0.00	0.00	16,808.56	2,928.32	16,808.56	2,928.32	16,808.56	96.65	101.38	581.92
kg	2,150.62	4.85	10,430.51	0.00	0.00	10,430.51	2,150.62	10,430.51	2,150.62	10,430.51	100.00	0.00	0.00
<b>COLUMNETAS</b>													
m3	22.10	543.16	12,003.84	0.00	0.00	3,899.89	7.18	3,899.89	7.18	3,899.89	32.49	14.92	8,103.95
m2	324.93	22.78	7,401.91	0.00	0.00	1,969.56	86.46	1,969.56	86.46	1,969.56	26.61	238.47	5,432.35
kg	1,532.12	5.74	8,794.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.12	8,794.37
kg	1,352.12	4.85	6,557.78	0.00	0.00	4,912.61	1,012.91	4,912.61	1,012.91	4,912.61	74.91	339.21	1,645.17
kg	270.30	4.34	1,173.10	0.00	0.00	1,128.23	259.50	1,128.23	259.50	1,128.23	96.00	10.80	46.87
<b>PANTALLAS Y SOBRECIMENTOS ARMADOS</b>													
m3	55.41	543.16	30,096.50	0.00	0.00	19,271.32	35.48	19,271.32	35.48	19,271.32	64.03	19.93	10,825.18
m2	908.53	27.37	24,866.47	0.00	0.00	19,219.21	702.20	19,219.21	702.20	19,219.21	77.29	206.33	5,647.26
kg	791.21	5.74	4,541.55	0.00	0.00	8,470.35	1,475.67	8,470.35	1,475.67	8,470.35	186.51	-684.46	-3,928.80
kg	3,037.26	4.85	14,730.71	0.00	0.00	9,236.10	1,904.35	9,236.10	1,904.35	9,236.10	62.70	1,132.91	5,494.61
<b>VIGAS</b>													
m3	24.84	603.01	14,978.77	0.00	0.00	4,148.71	6.88	4,148.71	6.88	4,148.71	27.70	17.96	10,830.06
m2	282.62	28.91	7,592.34	0.00	0.00	2,217.69	76.71	2,217.69	76.71	2,217.69	29.21	185.91	5,374.65
kg	2,233.21	5.74	12,818.63	0.00	0.00	2,900.71	505.35	2,900.71	505.35	2,900.71	22.63	1,727.86	9,917.92
kg	1,782.47	4.85	8,644.98	0.00	0.00	1,757.45	362.36	1,757.45	362.36	1,757.45	20.33	1,420.11	6,887.53
<b>LOSA MACIZA</b>													
m3	4.85	603.01	2,924.60	0.00	0.00	1,206.02	2.00	1,206.02	2.00	1,206.02	41.24	2.85	1,718.58
m2	12.95	28.91	374.38	0.00	0.00	291.99	10.10	291.99	10.10	291.99	77.99	2.85	82.39
kg	289.01	4.85	1,304.70	0.00	0.00	631.96	130.30	631.96	130.30	631.96	48.44	138.71	672.74
<b>VIGAS Y DIENTES</b>													
m3	17.12	543.16	9,298.91	0.00	0.00	2,237.82	4.12	2,237.82	4.12	2,237.82	24.07	13.00	7,061.08
m2	244.19	24.62	6,011.91	0.00	0.00	1,478.53	60.06	1,478.53	60.06	1,478.53	24.60	184.13	4,533.28

000253

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ  
CIP. N° 53689

Alfredo Ricardo Marmolejo Cucto  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401

Segundo Michel Gonzales Cuitqui  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS



LICITACION PUBLICA N° 06-2028-CSO GRL  
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region LORETO  
Provincia ALTO AMAZONAS  
Distrito LAGUNAS

SI: 3,872,652.12  
SI: 0,00  
SI: 0,00  
SI: 3,872,652.12

Fecha de inicio de Obra  
Plazo de Ejecucion  
1° Paralización  
2° Paralización  
3° Paralización  
Fecha de Término de Obra Inicial  
Fecha de Término Contractual

01-Dic-20  
180 Días

ING. EDUARDO PINCH VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

30-May-21

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 2  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

UNID	METRADO	PRESUPUESTO		PARCIAL SI.	AVANCE ANTERIOR		AVANCE DE OBRA		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
		P. UNID SI.	SI.		Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
kg	777.03	5.74	4,460.15	0.00	35.48	203.65	35.48	203.66	4.57	741.55	4,256.49	
kg	1,048.54	4.85	5,065.42	0.00	519.22	2,518.22	519.22	2,518.22	49.52	529.32	2,967.20	
kg	76.50	4.34	332.01	0.00	51.80	224.81	51.80	224.81	67.71	24.70	107.20	
<b>MESAS DE CONCRETO</b>												
m3	1.31	543.16	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	711.54	
m2	27.62	26.04	719.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62	719.22	
kg	108.30	4.85	525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.30	525.26	
<b>CUNETAS</b>												
m3	68.75	543.16	37,342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75	37,342.25	
m2	788.60	35.31	27,845.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.60	27,845.47	
kg	3,839.93	4.85	18,623.66	0.00	3,839.93	18,623.66	3,839.93	18,623.66	0.00	3,839.93	18,623.66	
m	431.00	43.78	18,869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	18,869.18	
<b>GRADERIA</b>												
m3	4.95	543.16	2,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	2,688.64	
m2	103.95	27.37	2,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95	2,845.11	
kg	611.47	4.85	2,965.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.47	2,965.63	
<b>ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA</b>												
p2	4,279.83	9.27	39,674.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.83	39,674.02	
m	2,067.78	8.87	18,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.78	18,341.21	
m	260.32	16.85	4,366.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.32	4,366.39	
m2	1,586.27	92.07	146,047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.27	146,047.88	
m	284.86	33.04	9,411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.86	9,411.77	
m	131.40	74.67	9,811.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.40	9,811.64	
<b>CUJMBRERA CO POLIPROPILENO</b>												
pza	11.00	390.04	4,290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	4,290.44	
pza	195.51	72.20	14,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.51	14,115.82	
pza	36.00	85.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	3,060.00	
m2	127.08	79.07	10,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.08	10,048.22	
<b>ARQUITECTURA</b>												
m2	1,285.13	78.84	101,319.65	0.00	642.57	50,659.82	642.57	50,659.82	50.00	642.57	50,659.83	
m2	515.84	65.63	33,854.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.84	33,854.58	
m2	128.01	26.38	3,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.01	3,376.90	
m2	2,921.05	27.85	81,351.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.05	81,351.24	
m2	59.25	27.85	1,650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25	1,650.11	
m2	531.63	27.85	14,805.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.63	14,805.90	
m2	475.19	31.95	15,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.19	15,182.32	
m2	103.95	27.85	2,895.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95	2,895.01	
m2	731.35	30.64	22,408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.35	22,408.56	
m2	704.44	13.03	9,178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.44	9,178.55	
m2	110.40	58.17	6,421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.40	6,421.97	
m	1,889.75	3.62	6,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.75	6,840.90	

00025

  
 Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho  
 ING. CIVIL  
 CIP. N° 41401

  
 Segundo Michel Gonzales Cuiqui  
 Representante Común  
 CONSORCIO LAGUNAS



OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"  
 Region: LORETO  
 Provincia: ALTO AMAZONAS  
 Distrito: LAGUNAS

Fecha de Inicio de Obra: 01-Dic-20  
 Plazo de Ejecucion: 180 Dias  
 1ª Paralización:  
 2ª Paralización:  
 3ª Paralización:  
 Fecha de Término de Obra Inicial: 30-May-21  
 Fecha de Término Contractual:

SI: 3,872,652.12  
 SI: 0.00  
 SI: 0.00  
 SI: 3,872,652.12


**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 2**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

UNID	METRADO	PRESUPUESTO		PARCIAL SI	AVANCE ANTERIOR		AVANCE DE OBRA		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
		P. UNID SI	SI		Mitrado	Valorizado	Mitrado	Valorizado	Mitrado	Valorizado	Mitrado	Valorizado
<b>CIELORRASOS</b>												
m2	1,396.15	67.84	94,714.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.15	94,714.82
m2	37.13	37.42	1,389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.13	1,389.40
<b>PISOS Y PAVIMENTOS</b>												
m2	422.67	40.66	17,185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.67	17,185.76
m2	37.21	78.92	2,936.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.21	2,936.61
m2	1,133.69	32.18	36,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.69	36,482.14
m2	595.33	34.47	20,521.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.33	20,521.03
m2	244.22	27.37	6,684.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.22	6,684.30
<b>JUNTA DE DILATACION</b>												
m	1,356.00	17.08	23,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	23,160.48
<b>ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS</b>												
m	997.58	19.90	19,851.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.58	19,851.84
m2	164.73	78.81	12,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.73	12,982.37
<b>CARPINTERIA DE MADERA</b>												
m2	81.27	209.03	16,987.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.27	16,987.87
m2	4.50	220.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	990.00
<b>CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA</b>												
und	1.00	1,956.50	1,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,956.50
und	1.00	1,456.50	1,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,456.50
m2	2.10	349.50	733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	733.95
und	2.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,000.00
<b>VENTANA (V-1) de vidrio 6mm. con prote. rejas de fierro cuadrado 1/2"; L=3.83m; H=1.40m</b>												
und	23.00	1,168.08	26,865.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	26,865.84
<b>VENTANA (V-2) de vidrio 6mm. con prote. rejas de fierro cuadrado 1/2"; L=2.65m; H=0.90m</b>												
und	18.00	1,519.35	27,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	27,348.30
<b>VENTANA (V-3) de vidrio 6mm. con prote. rejas de fierro cuadrado 1/2"; L=2.65m; H=0.90m</b>												
und	1.00	957.93	957.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	957.93
<b>VENTANA (V-4) de vidrio 6mm. con prote. rejas de fierro cuadrado 1/2"; L=1.20m; H=0.90m</b>												
und	2.00	740.64	1,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,481.28
<b>VENTANA (V-5) de vidrio 6mm. con prote. rejas de fierro cuadrado 1/2"; L=1.30m; H=0.90m</b>												
und	1.00	769.72	769.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	769.72
<b>VENTANA (V-6) de vidrio 6mm. con prote. rejas de fierro cuadrado 1/2"; L=2.47m; H=0.90m</b>												
und	1.00	961.50	961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	961.50
<b>VENTANA (V-7) de vidrio 6mm. con prote. rejas de fierro cuadrado 1/2"; L=2.30m; H=1.70m</b>												
und	2.00	1,269.14	2,538.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,538.28
<b>VENTANA (V-8) de vidrio 6mm. con prote. rejas de fierro cuadrado 1/2"; L=3.75m; H=1.70m</b>												
und	6.00	1,678.61	10,071.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10,071.66
<b>VENTANA (V-9) de vidrio 6mm. con prote. rejas de fierro cuadrado 1/2"; L=1.20m; H=0.60m</b>												
und	2.00	695.42	1,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,390.84
<b>VENTANA (V-10) de vidrio 6mm. con prote. rejas de fierro cuadrado 1/2"; L=3.75m; H=1.00m</b>												
und	1.00	1,322.08	1,322.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,322.08

000253

  
**Ing. Eduardo Pinchi Vásquez**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 56689

  
**Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho**  
 ING. CIVIL  
 CIP N° 41401

  
**Segundo Michel Gonzales Cuidi**  
 Representante Común  
 CONSORCIO LAGUNAS



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

LICITACION PUBLICA N° 06-2020-CSO GRL  
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region LORETO  
Provincia ALTO AMAZONAS  
Distrito LAGUNAS

SI: 3.872.652.12  
SI: 0.00  
SI: 3.872.652.12

Fecha de Inicio de Obra  
Plazo de Ejecucion  
1° Paralización  
2° Paralización  
3° Paralización  
Fecha de Término de Obra Inicial  
Fecha de Término Contractual

01-Dic-20  
180 Días

**PRESUPUESTO INTEGRAL**  
**VALORIZACION MENSUAL N° 2**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2021**

30-May-21

ING. EDUARDO PINCHIVASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

UNID	METRADO	PRESUPUESTO		PARCIAL	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORAR	
		P. UNID	SI.		Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
und	1.00	1,005.15	1,005.15	1,005.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,005.15
und	2.00	1,322.08	2,644.16	2,644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,644.16
und	2.00	393.70	787.40	787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	787.40
und	2.00	415.44	830.88	830.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	830.88
m2	336.00	207.28	69,646.08	69,646.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	69,646.08
und	1.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700.00
und	2.00	3,500.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7,000.00
m	49.50	35.23	1,743.89	1,743.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,743.89
m	10.00	320.08	3,200.80	3,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,200.80
m	4.00	111.52	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	446.08
und	1.00	586.75	586.75	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	586.75
und	2.00	526.75	1,053.50	1,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,053.50
par	167.00	9.62	1,606.54	1,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	1,606.54
pza	24.00	121.17	2,908.08	2,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	2,908.08
pza	21.00	76.17	1,599.57	1,599.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	1,599.57
und	81.00	18.31	1,483.11	1,483.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	1,483.11
m2	1,936.78	18.10	35,055.72	35,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.78	35,055.72
m2	1,326.42	18.61	24,684.68	24,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.42	24,684.68
m2	1,401.23	18.10	25,362.26	25,362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.23	25,362.26
m2	130.53	18.10	2,362.59	2,362.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.53	2,362.59
m2	620.61	18.10	11,233.04	11,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.61	11,233.04
m2	997.58	7.45	7,441.95	7,441.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.58	7,441.95
m2	82.75	12.33	1,020.31	1,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75	1,020.31
m2	317.26	18.23	5,783.65	5,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.26	5,783.65
m2	37.27	18.23	679.43	679.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27	679.43
m	176.00	7.76	1,365.76	1,365.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	1,365.76
m	72.00	7.76	558.72	558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	558.72
m	116.50	7.76	904.04	904.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50	904.04
und	60.00	26.31	1,578.60	1,578.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,578.60
m2	391.89	25.73	10,083.33	10,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.89	10,083.33
gib	1.00	1,045.49	1,045.49	1,045.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,045.49
gib	1.00	247,634.00	247,634.00	247,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	247,634.00
gib	1.00	525.60	525.60	525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	525.60
und	1.00	440.43	440.43	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	440.43

000252

Ing. Eduardo Pinchivasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689

Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401

Segundo Michel Gonzales Cujuy  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

LICITACION PUBLICA N° 06-2020-CSD GRL  
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region Loreto  
Provincia Alto Amazonas  
Distrito Lagunas

SI. 3,872,652.12  
SI. 0.00  
SI. 0.00  
SI. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra  
Riño de Ejecucion  
1ª Paginación  
2ª Paginación  
3ª Paginación  
Fecha de Término de Obra Inicial  
Fecha de Término Contractual

01-Dic-20  
180 Días

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

**VALORIZACION MENSUAL N° 2**

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

30-May-21

UNID	PRESUPUESTO		PARCIAL	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	METRADO	P. UNO		SI.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado
<b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>											
pza	11.00	295.14	3,246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3,246.54
pza	11.00	241.04	2,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2,651.44
pza	5.00	611.85	3,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3,059.25
pza	2.00	269.24	538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	538.48
pza	11.00	40.81	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	448.91
pza	3.00	184.04	552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	552.12
und	5.00	76.06	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	380.30
pza	5.00	35.52	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	177.60
pza	5.00	44.62	223.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	223.10
pza	4.00	130.29	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	521.16
m3	38.55	38.06	1,467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55	1,467.21
m	15.00	33.07	496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	496.05
m	165.00	23.52	3,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	3,880.80
m	60.00	21.92	1,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,315.20
plo	4.00	73.45	293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	293.80
plo	15.00	56.03	840.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	840.45
plo	6.00	65.31	391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	391.86
pza	6.00	52.55	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	315.30
pza	2.00	64.24	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	128.48
pza	10.00	209.80	2,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,098.00
pza	2.00	253.88	507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	507.76
<b>SISTEMA DE AGUA FRIA</b>											
<b>RED DE DISTRIBUCION</b>											
plo	26.00	19.31	502.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	502.06
m	130.00	14.67	1,907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	1,907.10
m	85.00	16.84	1,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	1,431.40
m	110.00	17.54	1,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1,929.40
<b>COLOCACION Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE AGUA</b>											
und	32.00	8.35	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	267.20
und	8.00	8.83	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	70.64
und	6.00	9.33	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	55.98
und	20.00	8.41	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	168.20
und	6.00	9.41	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	56.46
und	6.00	9.91	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	59.46
und	14.00	10.04	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	140.56
<b>VALVULAS</b>											
und	5.00	63.97	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	319.85
<b>SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL</b>											
m	290.62	30.80	8,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.62	8,951.10

000251

Ing. Eduardo Pinchi Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689

Segundo Michel Gonzales Cuiqui  
Representante Comunitario  
CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuctio  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 41401



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

LORETO  
ALTO AMAZONAS  
LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62066 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

OBRA

LECTICACION PUBLICA N° 06-2020-CSO GRU

CONSORCIO LAGUNAS

S/ 3,872,652.12

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra

Plazo de Ejecucion

1° Parafinacion

2° Parafinacion

3° Parafinacion

Fecha de Término de Obra Inicial

Fecha de Término Contractual

01-Dic-20

180 Días

30-May-21

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 2**

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

UNID	METRADO	P. UNID S/	PARCIAL S/	PRESUPUESTO		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
				Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado		
m	253.36	23.35	5,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.36	5,915.96	
m	28.00	92.16	2,580.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	2,580.48	
m3	10.00	37.34	373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	373.40	
m	50.00	36.23	1,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,811.50	
pza	4.00	253.88	1,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,015.52	
gib	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00	
und	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	
gib	1.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00	
gib	1.00	662.58	662.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	662.58	
m	30.00	265.51	7,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	7,965.30	
m	30.00	125.11	3,753.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3,753.30	
m	30.00	34.51	1,035.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,035.30	
m	7.00	14.78	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	103.46	
m	13.00	41.95	544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	544.05	
eq	1.00	100,246.21	100,246.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100,246.21	
gib	1.00	351.31	351.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	351.31	
m	30.00	14.35	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	430.50	
und	12.00	6.82	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	81.84	
und	1.00	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	77.95	
und	1.00	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	78.21	
und	1.00	2,355.78	2,355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,355.78	
m	20.00	26.03	520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	520.60	
m	15.00	11.58	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	173.70	
und	1.00	1,804.91	1,804.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,804.91	
plo	148.00	49.67	7,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	7,351.16	
plo	23.00	67.31	1,548.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	1,548.13	
plo	18.00	67.85	1,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	1,221.30	
plo	61.00	65.78	4,012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	4,012.58	
plo	2.00	69.71	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	139.42	
plo	45.00	49.67	2,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	2,235.15	
plo	15.00	67.85	1,017.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,017.75	
m	641.26	6.26	4,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.26	4,014.29	
m	288.76	6.79	1,756.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.76	1,756.98	

000250

Ing. Ricardo Marmolejo Cucho  
ING.-CHVAL  
CIP- N° 41101

Ing. Eduardo Pinchi Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIR N° 55689

Segundo Michel Gonzales Cuchi  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

LORETO  
ALTO AMAZONAS  
LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

ORCA

LICITACION PUBLICA N° 06-2020-CSO GRU  
CONSORCIO LAGUNAS

SI. 3,872,652.12  
SI. 0.00  
SI. 0.00  
SI. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra  
Plazo de Ejecucion  
1° Paralización  
2° Paralización  
3° Paralización  
Fecha de Inicio de Obra Inicial  
Fecha de Término de Obra Inicial  
Fecha de Término de Obra Final

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

30-May-21

**VALORIZACION MENSUAL N° 2**

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			PARGAL		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	UNID	METRADO	P. UNID	SI.	SI.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
CAJA DE PASE SUBTERRANEO	und	1.00	70.52	70.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	70.52
CONDUCTORES Y/O CABLES	m	80.00	26.96	2,156.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2,156.80
CONDUCTOR DE CU. NYHYKY DE 3-1X35 mm2 (INC. EXCAV. + RELLENO DE ZANJAS 0.25 X 0.60m)	m	80.00	14.43	1,154.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	1,154.40
CONDUCTOR DE CU. NYHYKY DE 1X35 mm2	m	175.00	39.82	6,968.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	6,968.50
CONDUCTOR DE CU. NYHYKY DE 4-1X16 mm2 (INC. EXCAV. + RELLENO DE ZANJAS 0.25 X 0.60m)	m	40.00	10.08	403.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	403.20
CONDUCTOR DE CU. NYHYKY DE 1X16mm2	m	193.00	28.53	5,506.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	5,506.29
CONDUCTOR DE CU. NYHYKY DE 4-1X10 mm2 (INC. EXCAV. + RELLENO DE ZANJAS 0.25 X 0.60m)	m	193.00	12.78	2,466.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	2,466.54
CONDUCTOR DE 4.0 mm2 THW/0.6 KV (N°12 AWG)	m	948.40	5.42	5,140.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.40	5,140.33
CONDUCTOR DE CU THW/0.6 KV DE 1x25mm2	m	1,144.03	4.90	5,605.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.03	5,605.75
TABLEROS Y CUCHILLAS	und	1.00	987.43	987.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	987.43
TABLERO GENERAL MONOFASICO 220V-60HZ CFON BARRAS DE COBRA 8 CIRCUITOS	und	1.00	1,072.86	1,072.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,072.86
TABLERO GENERADOR 220V-60HZ CFON BARRAS DE COBRE 6 CIRCUITOS	und	1.00	1,646.80	1,646.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,646.80
TABLERO DE TRANSFERENCIA MANUAL/AUTOM. 380/220 (3Ø + N)	und	4.00	1,747.85	6,991.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6,991.44
TABLERO DE DISTRIBUCION 220V 60 HZ CON BARRAS DE COBRE 16 CIRCUITOS	und	1.00	1,087.86	1,087.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,087.86
TABLERO DE DISTRIBUCION 220V 60 HZ CON BARRAS DE COBRE 8 CIRCUITOS	und	54.00	102.58	5,539.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	5,539.32
ARTEFACTOS ELECTRICOS	pza	93.00	71.29	6,629.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	6,629.97
COMPLETO	pza	4.00	192.58	770.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	770.32
ARTEFACTO DE ALUMBRADO CILINDRICO 1x32 MOD. MPR	pza	15.00	132.82	1,992.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,992.30
ARTEFACTO REFLECTOR HALOGENO METALICO 250W	und	45.00	371.30	16,708.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	16,708.50
ARTEFACTO DE ALUMBRADO CILAMPARAS DE EMERGENCIA	und	3.00	1,004.68	3,014.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3,014.04
VENTILADOR DE TECHO 3 ASPAS Inc. Accesorios	und	1.00	2,079.25	2,079.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,079.25
POZO A TIERRA Y PARARRAYOS	und	1.00	1,187.16	1,187.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,187.16
POZO CONEXION A TIERRA PARA SISTEMA ELECTRICO	und	1.00	61,768.96	61,768.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61,768.96
PARARRAYO TIPO TETRAPUNTAL DE ACERO QUIRURGICO	und	1.00	1,187.16	1,187.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,187.16
EQUIPOS ESPECIALES	und	1.00	61,768.96	61,768.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61,768.96
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA DE 4 HILO 380/220-60HZ 15/120A	und	1.00	2,353,716.31	2,353,716.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,353,716.31
GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO DE 25KW, 380/220 V, 60-HZ	und	1.00	235,371.63	235,371.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	235,371.63
<b>TOTAL COSTO DIRECTO (A)</b>				2,964,105.32		211,923.16	398,465.86	398,465.86	610,389.02	610,389.02	610,389.02	2,553,716.31	
<b>GASTOS GENERALES (B)</b>				296,410.53		21,192.32	39,846.59	39,846.59	61,038.90	61,038.90	61,038.90	235,371.63	
<b>UTILIDAD (C)</b>				393,242.53		28,115.46	52,863.75	52,863.75	80,979.21	80,979.21	80,979.21	312,263.31	
<b>TOTAL (D)</b>				76,769.80		0.00	27,589.17	27,589.17	27,589.17	27,589.17	27,589.17	49,200.33	
<b>PLAN DE CONTINGENCIAS (D)</b>													
OBRAS PRELIMINARES	TON	5.42	150.00	813.00		0.00	3.42	513.00	3.42	513.00	3.42	2.00	300.00
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	M2	303.37	2.62	794.83		0.00	270.00	707.40	270.00	707.40	270.00	33.37	87.43
LIMPIEZA DE TERRENO (CON PICO, LAMPAS Y CARRETERILLA)	M2	303.37	4.53	1,374.21		0.00	270.00	1,223.10	270.00	1,223.10	270.00	33.37	151.17
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO													
MOVIMIENTO DE TIERRAS													

**INGENIERO CIVIL**  
**CIP- N° 55689**  
**Segundo Michel González Curiqi**  
**Representante Común**  
**CONSORCIO LAGUNAS**

**INGENIERO CIVIL**  
**CIP- N° 41401**  
**Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho**

000249



LICITACION PUBLICA N° 06-2009-CSO GRIL  
CONSORCIO LAGUNAS

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Proyecto: LORETO  
Provincia: ALTO AMAZONAS  
Distrito: LAGUNAS

SI: 3,872,652.12  
SI: 0.00  
SI: 0.00  
SI: 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra: 01-06-20  
Fecha de Ejecucion: 180 Dias  
Fecha de Finalizacion:  
2º Pagos:  
3º Pagos:  
Fecha de Terminación de Obra Final: 30-May-21  
Fecha de Terminación de Obra Final: 30-May-21

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 2**  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

ING. EDUARDO FINCH VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARQUELEJO CUCHO

UNO	METRADO	P. UNO	F. UNO	S/	S/	FABRICAL	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
							Metros	Valorizado	Metros	Valorizado	Metros	Valorizado	Metros	Valorizado
kg	777.03	5.74	4,460.15	0.00	0.00	203.60	35.48	203.60	4.57	761.95	4,256.49	2,967.20	107.20	
kg	1,048.54	4.85	5,065.42	0.00	0.00	2,519.22	519.22	2,519.22	49.52	529.32	2,967.20	107.20	107.20	
kg	76.50	4.34	332.01	0.00	0.00	224.81	51.80	224.81	67.71	24.70	107.20	107.20	107.20	
m3	1.31	543.16	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	711.54	711.54	711.54	
m2	27.62	26.04	719.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62	719.22	719.22	719.22	
kg	108.30	4.85	525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.30	525.26	525.26	525.26	
m3	68.75	543.16	37,342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75	37,342.25	37,342.25	37,342.25	
m2	788.60	35.31	27,845.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.60	27,845.47	27,845.47	27,845.47	
kg	3,839.93	4.85	18,623.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.93	18,623.66	18,623.66	18,623.66	
m	431.00	43.78	18,699.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	18,699.18	18,699.18	18,699.18	
m3	4.95	543.16	2,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	2,688.64	2,688.64	2,688.64	
m2	103.95	27.37	2,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95	2,845.11	2,845.11	2,845.11	
kg	611.47	4.85	2,965.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.47	2,965.63	2,965.63	2,965.63	
g2	4,278.83	9.27	39,674.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,278.83	39,674.02	39,674.02	39,674.02	
m	2,087.78	8.07	18,341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.78	18,341.21	18,341.21	18,341.21	
m	250.32	16.85	4,386.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.32	4,386.39	4,386.39	4,386.39	
m2	1,586.27	92.07	146,047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.27	146,047.88	146,047.88	146,047.88	
m	294.86	33.04	9,411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.86	9,411.77	9,411.77	9,411.77	
m	131.40	74.67	9,811.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.40	9,811.64	9,811.64	9,811.64	
pza	11.00	390.04	4,290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	4,290.44	4,290.44	4,290.44	
pza	195.51	72.20	14,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.51	14,115.82	14,115.82	14,115.82	
pza	36.00	85.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	
m2	127.08	79.07	10,046.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.08	10,046.22	10,046.22	10,046.22	
m2	1,285.13	78.84	101,319.65	0.00	0.00	0.00	642.57	50,658.82	50.00	642.57	50,658.82	50,658.82	50,658.82	
m2	515.84	65.63	33,854.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.84	33,854.68	33,854.68	33,854.68	
m2	128.01	26.38	3,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.01	3,376.90	3,376.90	3,376.90	
m2	2,921.65	27.85	81,351.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921.65	81,351.24	81,351.24	81,351.24	
m2	59.25	27.85	1,650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25	1,650.11	1,650.11	1,650.11	
m2	531.63	27.85	14,805.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.63	14,805.90	14,805.90	14,805.90	
m2	475.19	31.95	15,182.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.19	15,182.32	15,182.32	15,182.32	
m2	103.95	27.85	2,895.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95	2,895.01	2,895.01	2,895.01	
m2	731.35	30.64	22,408.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.35	22,408.95	22,408.95	22,408.95	
m2	704.44	13.03	9,178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.44	9,178.85	9,178.85	9,178.85	
m2	110.40	58.17	6,421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.40	6,421.97	6,421.97	6,421.97	
m	1,889.75	3.82	6,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.75	6,840.90	6,840.90	6,840.90	

000254

Ing. Eduardo Finch Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689

Alfredo Ricardo Marquelojo Cuzco  
ING. CIVIL  
CIP N° 41401

Segundo Michel Gonzales Quiji  
Representante Comunal  
CONSORCIO LAGUNAS





**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

LICITACION PUBLICA N° 66-2020-C50-GR/L  
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 620956 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Región LORETO  
Provincia ALTO AMAZONAS  
Distrito LAGUNAS

S/ 3,872,852.12  
S/ 0.00  
S/ 0.00  
S/ 3,872,852.12

Fecha de Inicio de Obra  
Fin de Ejecucion  
Fase de Evaluacion  
Fase de Pago  
Fase de Terminacion

01-Dic-20  
180 Días

ING. EDUARDO PINCHA VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARWOLEJO CUCHO

**VALORIZACION MENSUAL N° 2**  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

30-May-21

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

UNID	PRESUPUESTO		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALIFICAR	
	RETRADO	# UNID	MONED.	VALORADO	MONED.	VALORADO	MONED.	VALORADO	MONED.	VALORADO
VENTANA (N-11) de vidrio firm. con prot. rejas de fierro cuadrado 1/2", L=3.75m - H=0.70m	1.00	1,005.15	1,005.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,005.15
VENTANA (N-12) de vidrio firm. con prot. rejas de fierro cuadrado 1/2", L=4.15m - H=1.00m	2.00	1,327.06	2,644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,644.16
VENTANA (N-13) con prot. rejas de fierro cuadrado 1/2", L=2.15m - H=0.65m	2.00	393.70	787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	787.40
VENTANA (N-14) con prot. rejas de fierro cuadrado 1/2", L=2.35m - H=0.65m	2.00	415.44	830.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	830.88
CERCO DE MALLA OLIMPICA METALICA DE 2" X 2"	335.00	207.28	69,446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	69,446.08
SUBMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE VOLEY 6m. maña y accesorios	1.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700.00
SUBMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTSAL CISOPORTE PITABLERO DE BASQUETBOL (inc. ref. accesorios)	2.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7,000.00
BARANDA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO	49.50	35.23	1,743.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,743.89
ESCALERA DE GATO - TANQUE ELEVADO	10.00	300.08	3,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,200.80
POSTE DE TUBO DE FIERRO PARA LUMINARIA DE LOSA	4.00	111.52	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	446.08
MASTIL DE F" G" PABANDERA DE 9.00 M.	1.00	586.75	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	586.75
MASTIL DE F" G" PABANDERA DE 7.00 M.	2.00	526.75	1,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,053.50
<b>CERRAJERIA</b>										
BISAGRA ALUMINIZADA 3 1/2" x 1 1/2"	167.00	9.62	1,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	1,606.54
CERRADURA PARA PUERTAS DE DOS GOLPES	24.00	121.17	2,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	2,908.08
CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR	21.00	76.17	1,599.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	1,599.57
CERRILLO DE 3" ALUMINIZADO PARA PUERTAS	81.00	18.31	1,483.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	1,483.11
<b>PINTURA</b>										
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (2 manos) inc. masillado	1,936.78	18.10	35,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.78	35,055.72
PINTURA ESMALTE EN MURO PERIMETRICO, COLUMNAS, VIGAS Y PANTALLAS	1,326.42	18.61	24,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.42	24,684.68
PINTURA LATEX EN SUPERBORDO	1,401.23	18.10	25,362.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.23	25,362.26
PINTURA LATEX EN CIELRASO DE CEMENTO	130.53	18.10	2,362.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.53	2,362.59
PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS (2 Manos) inc masillado	620.61	18.10	11,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.61	11,233.04
PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOCCALOS H=0.30 Masillado	997.58	7.45	7,441.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.58	7,441.95
PINTURA EN PUERTAS DE MADERA CIBANIZ 02 MANOS	82.75	12.33	1,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75	1,020.31
PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS (REJAS Y VENTANAS DE FIERRO)	317.26	18.23	5,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.26	5,783.65
PINTURA CON ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA	37.27	18.23	679.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27	679.43
PINTURA DE TRAFICO COLOR AZUL	176.00	7.76	1,385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	1,385.76
PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	72.00	7.76	558.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	558.72
PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO	116.50	7.76	904.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50	904.04
<b>VARIOS</b>										
SIEMBRA DE PLANTONES INCLUTE TAPADO DE HOYOS	60.00	26.31	1,578.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,578.60
SIEMBRA DE GRASS	391.89	25.73	10,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.89	10,083.33
LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	1.00	1,045.49	1,045.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,045.49
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62056	1.00	247,634.00	247,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	247,634.00
SERIALIZACIONES DE SEGURIDAD Y CONTRA-NEFAS	1.00	525.60	525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	525.60
PLACA RECORDATORIA	1.00	440.43	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	440.43
INSTALACIONES SANITARIAS										

000252

Ing. Eduardo Pincha Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 65689

Segundo Michel Gonzales Cujuy  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS

Alfredo Ricardo Marwolejo Cuzco  
ING. CIVIL  
CIP. N° 81401

LICITACION PUBLICA N° 06-2020-C50 GIRL  
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Proyecto: LORETO  
Distrito: ALTO AMAZONAS  
Lagunas

SI: 3,872,652.12  
SI: 8.00  
SI: 8.00  
SI: 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra  
Fecha de Ejecucion  
Fecha de Terminacion  
Fecha de Terminacion Contractual

01-Dic-20  
180 Días

ING. EDUARDO PINCH VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLERO CUCHO

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 2**  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

30 May 21

UNO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		FABRICAL SI.	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE RECALCULADO		SALDO POR VALORIZAR	
		BETASO	P. UNO SI.		Moneda	%	Moneda	%	Moneda	%	Moneda	%
	<b>APARATOS SAMITARIOS Y ACCESORIOS</b>											
pza	INDODOR TANQUE BAJO CON ACCESORIOS COMPLETOS	11.00	295.14	3,246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3,246.54
pza	LAVATORIO DE LOSA TIPO OVAL IN 1 LLAVE	11.00	241.04	2,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	2,651.44
pza	LAVATORIO DE PEDESTAL BLANCO	5.00	611.85	3,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3,059.25
pza	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA	2.00	269.24	538.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	538.48
pza	PAPELERA DE LOSA BLANCA DE 0.15 X 0.15 M	11.00	40.81	448.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	448.91
pza	URINARIO DE LOSA DE PICO COLOR BLANCO	3.00	184.04	552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	552.12
unf	DUCHA CROMADA Y LLAVE INCL. ACCESORIOS	5.00	76.06	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	380.30
pza	TOMALLERA DE PLASTICO 2" DE COLOR	5.00	45.52	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	227.60
pza	JARONERA DE LOSA BLANCA SIMPLE DE 0.15 X 0.15 M	5.00	35.52	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	177.60
pza	BARRAS PARA CORTINA	5.00	44.62	223.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	223.10
pza	APOYABRAZOS PARA DISCAPACITADOS	4.00	130.29	521.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	521.16
m3	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	38.55	38.06	1,467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55	1,467.21
m	EXCAVACION DE ZANJAS DE TERRENO NORMAL PICOLOCAC. TUBO DE 6", 4" Y 2"	15.00	33.07	496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	496.05
m	RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIAS PVC SAL DE 6"	165.00	23.52	3,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	3,880.80
m	RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIAS PVC SAL DE 4"	60.00	21.92	1,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,315.20
glo	SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2"	15.00	56.03	840.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	840.45
glo	SALIDA PARA DESAGUE PVC-SAL 2"	6.00	65.31	391.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	391.86
pza	SUMIDERO CON TRAMPA DE 2"	8.00	52.55	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	315.30
pza	REGISTRO DE BRONZE CROMADO DE 4"	2.00	64.24	128.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	128.48
pza	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" INCLUYE TAPA	10.00	209.80	2,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,098.00
pza	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 24" INCLUYE TAPA	2.00	253.88	507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	507.76
	<b>SISTEMA DE AGUA FRIA</b>											
glo	RED DE DISTRIBUCION	26.00	19.31	502.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	502.06
m	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC - SAP 1/2"	130.00	14.67	1,907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	1,907.10
m	RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA 1/2" PVC-SAP	85.00	16.84	1,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	1,431.40
m	RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA 3/4" PVC-SAP	110.00	17.54	1,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1,929.40
unf	RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA 1" PVC-SAP	32.00	8.35	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	267.20
unf	CODO PVC SAP DE 1/2" X 90°	8.00	8.83	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	70.64
unf	CODO PVC SAP 3/4" X 90°	6.00	9.33	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	55.98
unf	CODO PVC SAP 1" X 90°	20.00	6.41	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	128.20
unf	TEE PVC SAP 1/2"	6.00	9.41	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	56.46
unf	TEE PVC SAP 3/4" X 1/2"	6.00	9.91	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	59.46
unf	TEE PVC SAP 1"	14.00	10.04	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	140.56
unf	REDUCCION PVC DE 1" A 3/4"	5.00	63.97	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	319.85
	<b>VALVULAS</b>											
unf	VALVULA COMPUERTA CON UNION UNIVERSAL DE 1/2"	290.62	30.80	8,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.62	8,951.10
	<b>SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL</b>											
	CAÑALETA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL											

000251

Ing. Eduardo Pinch Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689

Alfredo Ricardo Marmolejo Cucto  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401

Segundo Michel Gonzales Colqui  
Representante Comunit  
CONSORCIO LAGUNAS



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

LOTACION PUBLICA N° 05-2020-C50 GRIL  
CONSORCIO LAGUNAS

CIENA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

LORETO  
ALTO AMAZONAS

S/. 3,872,452.12

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 3,872,452.12

Fecha de Inicio de Obra

Plazo del Expediente

1ª Planificación

2ª Planificación

3ª Planificación

Fecha de Término de Obra

Fecha de Término Contractual

01-Dic-20

180 Días

30-May-21

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 2**

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHIVASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARWOLEJO CUCHO

UNO	PRESUPUESTO		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	METRADO	F. LUD	Bravado	Voluntade	Bravado	Voluntade	Bravado	Voluntade	Bravado	Voluntade
		SI								
MONTANTE DE 4" BALADA DE AGUAS PLUVIALES	253.36	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.36	5,915.95
PROTECTOR DE MONTANTE DE AGUAS PLUVIALES DE 1.20 M	28.00	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	2,480.48
EXCAVACION DE ZANJAS DE TERRENO NORMAL PIVOCLOCAC. TUBO DE 6", 4" Y 2"	10.00	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	373.46
RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIAS PVC SAL DE 6"	50.00	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,811.50
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 24" INCLUYE TAPA	4.00	253.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,015.52
POZO PERFORADO										
ESTUDIO Y TRABAJOS PRELIMINARES	1.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00
ESTUDIO DE PROSPECCION PARA POZO PERFORADO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00
ESTUDIO BACTERIOLOGICO	1.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00
TRASLADO PERSONAL ESPECIALIZADO DE SALUD AMBIENTAL										
TRABAJOS DE PERFORACION Y ENTUBADO										
MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASTILLO DE PERFORACION	30.00	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	7,865.30
PERFORACION DE POZO CON EQUIPO DE ROTACION BROCA 8"	30.00	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3,753.30
ENTUBADO CON TUBO PVC SAP DE 8" CLASE 10 (RAMURADO) (PERFORACION)	30.00	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,035.30
ENTUBADO CON TUBO PVC SAP DE 6" CLASE 10 (PERFORACION)	7.00	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	105.46
TUBERIA PVC SAP DE 1 1/4" CLASE 10 AGUA POTABLE	13.00	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	544.05
FILTRO DE GRANA	1.00	100,246.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100,246.21
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA - TANQUE DE ACERO CUIRURGICO										
PRUEBA DE RENDIMIENTO + DESINFECCION DE POZO TUBULAR	1.00	351.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	351.31
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS ESPECIALES										
TUBERIA DE IMPULSION PVC SAP DE 1" C-10 AGUA POTABLE	12.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	81.84
CODO PVC SAP 1" X 90°	1.00	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	77.95
VALVULA CHECK DE 1"	1.00	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	78.21
VALVULA CUPIERTA DE BRONCE DE 1"	1.00	2,355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,355.78
BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP INCLUYE ACCESORIOS										
TANQUE ELEVADO										
TUBERIA DE ALIMENTACION PVC SAP 1"	20.00	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	520.60
TUBERIA DE REBOSE DE 2"	15.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	173.70
TANQUE DE POLIPROPILENO DE 2.5 M3 CON ACCESORIOS	1.00	1,804.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,804.91
INSTALACIONES ELECTRICAS										
SALIDAS										
SALIDA DE CENTRO DE LUZ (TECHO)	148.00	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	7,351.16
SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE	23.00	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	1,548.13
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE	18.00	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	1,221.30
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE - PUESTA A TIERRA	61.00	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	4,012.58
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE - A PRUEBA DE AGUA	2.00	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	139.42
SALIDA PARA TOMACORRIENTES DE TECHO	45.00	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	2,235.15
SALIDA ESPECIAL PARA INTERRUPTOR DE VENTILADOR	15.00	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,017.75
CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS										
TUBERIA PVC SEL DE 3/4" SIN EMPOTRAR TECHO-PARED	641.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.26	4,014.29
TUBERIA PVC SEL DE 1" SIN EMPOTRAR PISO-PARED	258.78	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.78	1,756.98

000250

Ing. Eduardo Pinchivasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP: N° 556889

Alfredo Ricardo Marwolejo Cucho  
ING.-CIVIL  
CIP: N° 41401

Segundo Michel Gonzales Cuchi  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS








Proceso de encofrado en columna.



Encofrado de columna con éxito.



  
Segundo Michel Gonzales Cuzqui  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS

  
Alfredo Ricardo Maca  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401



Limpieza de probetas para el ensayo de compresión.

.....  
Ing. Eduardo Pinchi Vásquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689




Probeta de los cimientos para el ensayo de compresión.

.....  
Ing. Eduardo Pinchi Vásquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689



  
Alfredo Ricardo Marmolejo Cucha  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401

  
Segundo Michel Gonzales Culqui  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS



# PANEL FOTOGRÁFICO


Limpieza de terreno.



Trazados para la excavación de zanjas.



Ing. Eduardo Sánchez Vazquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689

  
Alfredo Ricardo Marmotejo Cuervo  
ING. CIVIL  
CIP N° 42401

  
Segundo Michel Gonzales Culqui  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS



Excavación de zanja.



Proceso estructural para el sobrecimiento.

  
Ing. Eduardo Pinchi Vazquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689



  
Alfredo Ricardo Marmolejo Lucho  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401

  
Segundo Michel Gonzalez Cullqui  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS




Encofrado de columna.




  
Ing. Eduardo Vinchi Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689

Solado de falsa zapatas.



  
Alfredo Ricardo  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 81401

  
Segundo Michel Gonzales Cujqui  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS




Encofrado de cimiento corrido.




Vaceo de cimiento corrido.



  
Ing. Eduardo Pinchi Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689

  
Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401

  
Segundo Michel Gonzales Cujqui  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS





# VALORIZACION

## N.º 4



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Belén, 11 de mayo de 2021



Oficio n°1405-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mag. Artemio del Águila Panduro  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 04  
Abril de 2021.

Obra: “Mejoramiento de la Oferta Educativa  
Nivel Primaria en la Institución  
Educativa de Educación Básica  
Regular n.° 62056, Villa Lagunas del  
distrito de Lagunas – Provincia de Alto  
Amazonas – Departamento de Loreto.

Ref. : a. Informe n°104-2021-GRL/GRI/SGSyC/CDPBG  
b. Carta n° 021-2021-CCL-MSCHC/RC

Tengo el agrado de saludarle cordialmente y en  
relación al documento de la referencia a), remitirle la valorización n° 04 por ejecución de  
obra, correspondiente a abril de **2021**, aprobada por el supervisor y revisada por la  
coordinadora de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización n° 04 – Abril 2021	S/.	572 963.67
Reajuste Neto	S/.	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/.	57 296.37
Amortización de adelanto de materiales	S/.	116 499.47
Deducción de Reajuste Adelanto Directo	S/.	0.00
Deducción de Reajuste Adelanto de Materiales	S/.	0.00
Monto Neto a Pagar de Valorización	S/.	399 167.83
IGV 18%	S/.	0.00
Retención del 10% Fondo de Garantía	S/.	0.00
<b>Monto a Pagar al Contratista</b>	<b>S/.</b>	<b>399 167.83</b>

Asimismo, la obra a abril del 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de 19.95%,  
versus un avance programado de 51.89%, teniendo en cuenta que la obra se encuentra  
atrasada en un 7.65%.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación que sustenta la coordinadora,  
solicito continuar con el trámite respectivo a favor del **CONSORCIO LAGUNAS**.

Atentamente,

Copia: SGSyC – File obra (01)  
SGSyC – File obra (01)  
SGSyC – File correlativo (01)  
SGSyC – File personal (01)  
RFA – S.G.  
dap – Sec.  
Tramite: 10182

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
  
Ing. RAUL FLORES AQUILINO  
Sub Gerente de Supervisión y Control  
CIP. 83350







**INFORME N°0104-2021-GRL-GRI-SGSyC-CDPBG**



AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho  
**SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

DE : Arq. Carolina del Pilar Baneo Garate  
**COORDINADORA DE OBRA**

ASUNTO : **REMITO INFORME DE DOCUMENTACION, VALORIZACION DE OBRA N° 04 – ABRIL 2021 (CONTRATISTA)**

REFERENCIA : (01) Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"**.  
(02) Carta N°021-2021-CLC-MSCHR/RC  
(03) Informe N° 021-2021-CCL-MSCHR/RC  
(03) Carta N° 022-2021/CL  
(04) Trámite: 10182

FECHA : Iquitos, 06 de mayo del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la presente documentación de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"**. Respecto a la Valorización N° 04 correspondiente al mes de abril del 2021.

**1. DATOS TECNICOS**

**• DATOS DE LA OBRA**

Nombre de la obra : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO".

Ubicación :  
Localidad : Lagunas  
Distrito : Lagunas  
Provincia : Alto Amazonas  
Región : Loreto

COORDINADORA DE OBRA : ARQ. Baneo Garate, Carolina del Pilar – REG. CAP. N° 18391

MONTO CONTRATADO : S/. 3,872,652.12 (sin I.G.V.)

ENTREGA DE TERRENO : 16 de octubre del 2020.

INICIO DE OBRA : 01 de diciembre del 2020

PLAZO DE EJECUCION : 180 Días Calendario.

SUSPENSIÓN DE PLAZO 01 : 10 Días calendario

Fecha de Acta de Suspensión 01 : 01/02/2021

Reinicio de ejecución : 10/02/2021

Nuevo Término de Plazo : 08/07/2021





“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÙ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

SUSPENSION DE PLAZO 02 : 08 días calendario  
Fecha de Acta de Suspensión 02 : 06/04/2021  
Reinicio de ejecución : 14/04/2021  
Nuevo Término de Plazo : 16/07/2021

ESTADO DE OBRA : **EJECUCION - ATRASADA**  
ADELANTO DIRECTO : 387,625.12 SOLICITADO  
ADELANTO DE MATERIALES : 774,530.42 SOLICITADO  
AVANCE FISICO DEL MES : 14.80%  
AVANCE FISICO ACUMULADO : 51.89%  
%Avance Programado al mes : 19.95%  
%Avance Programado Acumulado : 59.54 %

• **DATOS DEL CONTRATISTA**

CONTRATISTA : **CONSORCIO LAGUNAS**  
CONCURSO : L.P. N° 006-2020-CSO-GRL  
RESIDENTE : **ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO**  
CONTRATO : N° 038-2020-GRL-GGR-GRI.  
MONTA CONTRATADO : S/ 3'872,524.99, con IGV.  
FIRMA DE CONTRATO : 01 de octubre del 2020.  
PLAZO DE EJECUCION : 180 Días Calendarios.

• **DATOS DE LA SUPERVISION**

CONSULTOR : **CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS**  
JEFE DE SUPERVISIÓN : **ING. PINCHI, VASQUEZ, EDUARDO. – REG. CIP. 55689.**  
CONTRATO : N° 027-2020-GRL-GGR-GRI.  
PLAZO DE EJECUCION : 240 Días Calendarios.

2. **ANTECEDENTES DE OBRA:**

- ✓ **Con fecha 27 de febrero del 2019:**  
Se aprueba el Expediente Técnico de “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRTITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”, mediante Resolución de alcaldía N° 050-2019-MDL/A.020
- ✓ **Con fecha 11 de setiembre del 2020**  
Se adjudica la buena pro de la Licitación Publica N° 0006-2020-CSO-GRL de la obra en mención.
- ✓ **Con fecha 01 de octubre del 2020:**  
Se firma el contrato de ejecución de la obra en mención, entre el Gobierno Regional de Loreto y el CONSORCIO LAGUNAS, mediante Contrato N° 038-GRL-GRI
- ✓ **Con fecha 25 de noviembre del 2020:**  
Mediante Carta N° 923-2020-GRL-GRI-SGSYC, se comunica al CONSORCIO LAGUNAS la reformulación de la Formula Polinómica.
- ✓ **Con fecha 15 de noviembre del 2020:**  
Se realiza la entrega de terreno
- ✓ **Con fecha 01 de Diciembre del 2020:**  
Se da inicio a la obra: “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA ISNTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DELL DISTRTITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”.
- ✓ **Con fecha 01 de Enero del 2021:**  
Mediante Acta de suspensión de Plazo de Ejecución del Contrato N° 038-2020-GRL-GGR-GRI, se suspenden las actividades de ejecución de obra por motivos de presencia de lluvia, que imposibilitan el desarrollo de las actividades.



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

- ✓ **Con fecha 05 de marzo del 2021:**  
Mediante Carta N° 011-2021-CCL-MSCHC/RCCSA-RC CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS presenta segunda Valorización – correspondiente al mes FEBRERO DEL 2021.
- ✓ **Con fecha 09 de abril del 2021:**  
Mediante Carta N° 023-2021-CCL-MSCHC/RCCSA-RC CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS presenta tercera Valorización – correspondiente al mes MARZO DEL 2021.
- ✓ **Con fecha 05 de mayo del 2021:**  
Mediante Carta N° 021-2021-CCL-MSCHC/RCCSA-RC CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS presenta cuarta Valorización – correspondiente al mes ABRIL DEL 2021.

**3. DOCUMENTOS PRESENTADOS:**

Con Carta N° 021-2021/CL CONSORCIO LAGUNAS recepcionada por el Supervisor el 05 de MAYO del 2021, el Contratista presenta al Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS la Valorización de Ejecución de Obra N° 04 correspondiente al mes de abril del 2021, en la cual hace de conocimiento que se han ejecutado los metros del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA
- CARTA N° N° 021-2021/CL DEL CONTRATISTA
- FACTURA ELECTRONICA
- DOCUMENTACION TECNICA
- RESUMEN DE PAGOS DE VALORIZACIONES
- AMORTIZACIONES DE ADELANTOS
  - ADELANTO DIRECTO
  - ADELANTO DE MATERIALES
- COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO
- INDICE UNIFICADO
- CALENDARIO PROGRAMADO VALORIZADO ACTUALIZADO – ABRIL 2021
- CONTROL DE CALIDAD
- PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
- CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE
- PAGO DE TRIBUTOS
  - SENCICO
  - ESSALUD
  - ONP
  - SCTR
  - CONAFOVICER
- COPIA DE PLANILLAS DE JORNALES
- COPIA DE DECLARACION PDT – SUNAT
- COPIA EL CUADERNO DE OBRA
  - DESDE EL ASIENTO N° 108 AL ASIENTO N° 150 – MES DE ABRIL 2021
- COPIA DEL ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO N° 038-2020-GRL-GRI
- COPIA DE DOCUMENTO DE REINICIO DE ACTIVIDADES
- RELACION DE PERSONAL TECNICO
- INFORME DE ACTIVIDADES
  - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
  - INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
- PANEL FOTOGRAFICO
- COPIA DE CARTAS FIANZAS
  - FIEL CUMPLIENTO
  - ADELANTO DIRECTO





“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

**ADELANTO DE MATERIALES**

- INFORME COVID 19
- ANEXOS
- REGISTRO DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y SATURACION DE OXIGENO DE CADA TRABAJADOR.

**4. ASPECTO LEGAL DE OBRA**

- ✓ **01 de octubre del 2020**  
Contrato de Ejecución de Obra N° 038-2020-GRL-GGR-GRI
- ✓ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento N° 30225 modificado por Decreto Legislativo N° 1444 aprobado por D.S. N° 344-2018-EF y el Código Civil Vigente.

**5. CONTROL DE VIGENCIAS DE CARTAS FIANZAS DE OBRA**

Del control de cartas fianzas de Obra, tenemos:

ESTADO DE CARTAS FIANZAS					
N°	CONCEPTOS	DOCUMENTO QUE SUSTENTA SOLICITUD DE DESEMBOLSO	MONTO (S/)	INICIO DE VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA
1	Fiel Cumplimiento	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	387,265.21	22 de septiembre del 2020.	18 de Junio del 2021
2	Adelanto Directo	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	299,173.68	05 de abril del 2021.	10 de julio del 2021
3	Adelanto de Materiales	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	774,530.42	02 de marzo del 2021.	31 de mayo del 2021

**6. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS**

Con respecto a los Metrados de la Valorización N° 04 de la obra en mención en la referencia (1), se informa que en gabinete se ha efectuado la revisión de la documentación alcanzada a la suscrita, para lo cual el supervisor indica en folio 347 al 351 del file presentado a la Entidad.

**7. RESUMEN DE VALORIZACION**

De acuerdo a la documentación presentada por la Supervisión con respecto a la **Valorización N° 04** de la obra mencionada en la referencia (1), se informa que se ha revisado en gabinete la documentación alcanzada a la suscrita luego de que los metrados para la elaboración de la valorización fuesen aprobados por el Residente y el Supervisor de la obra, para lo cual se presenta un resumen de la misma, tenemos:



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

VALORIZACION N° 04	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	S/572,963.67
REAJUSTE NETO	S/0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/57,296.37
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	S/116,499.47
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/399,167.83
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/399,167.83

“De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Art. 194° Valorizaciones y metrados:

194.1 Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

...

194.6 El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

194.7 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.” Revisarlo en el RLCE.

## 8. ESTADO FISICO FINANCIERO ACTUAL DE OBRA

Del estado físico financiero actual de Obra, tenemos:

N° VAL.	PERIODO	CALENDARIO PROGRAMADO ACTUALIZADO				AVANCE EJECUTADO			
		SOLES		PORCENTAJE		SOLES		PORCENTAJE	
		MENSUAL	ACUMUL.	MENSUAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DICIEMBRE 2020	289,113.41	289,113.41	7.47%	7.47%	289,113.41	289,113.41	7.47%	7.47%
3	FEBRERO 2021	559,576.01	848,689.42	14.45%	21.91%	591,801.17	880,914.58	15.28%	22.75%
4	MARZO 2021	684,242.68	1,532,932.10	17.67%	39.58%	555,623.48	1,436,538.06	14.35%	37.09%
5	ABRIL 2021	772,779.48	2,305,711.58	19.95%	59.54%	572,963.67	2,009,501.73	14.80%	51.89%
6	MAYO 2021	610,404.79	2,916,116.37	15.76%	75.30%				
7	JUNIO 2021	561,472.16	3,477,588.53	14.50%	89.80%				
8	JULIO 2021	395,063.59	3,872,652.12	10.20%	100.00%				
	TOTAL	3,872,652.12		100.00%		ESTADO DE LA OBRA		EN TIEMPO	7.65%

De la figura tenemos, al término del mes de abril del 2021, el estado de **AVANCE ACUMULADO** de obra respecto a lo programado es **ATRASADA**.

- o De la figura tenemos, al término del CUARTO MES contractual del plazo de ejecución de obra (abril del 2021), el estado de **AVANCE MENSUAL EJECUTADO ES DE 14.80 % respecto al AVANCE PROGRAMADO PARCIAL es de 19.95%, y un ACUMULADO EJECUTADO DE 51.89% Y AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE 59.54%** teniendo que la **OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 7.65%**.






“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÙ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

**9. CURVA DE AVANCE DE OBRA**

Del Avance de Obra comparado entre el Avance Programado vs. Avance Ejecutado, tenemos:

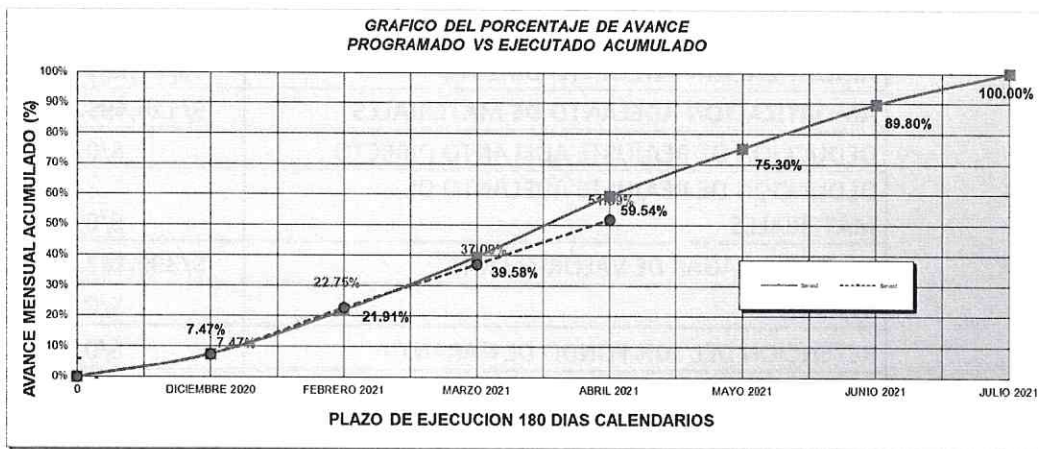

Mediante el grafico se observa que el avance ejecutado acumulado de la obra correspondiente al mes de abril del 2021 es de 51.89%, el avance programado acumulado es de 59.54 %.

**10. AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO DE OBRA**

De la Amortización del Adelanto Directo de Obra, tenemos:

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04				
AL 30 DE ABRIL DEL 2021				
OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"			
Modalidad de ejecución	A SUMA ALZADA			
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO			
UBICACIÓN	VILLA LAGUNAS			
RAZON SOCIAL	CONSORCIO LAGUNAS			
SUPERVISOR DE OBRA	ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ			
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO				
M. CONTRATADO	C =	S/. 3,872,652.12 S/IGV		
A. OTORGADO	A =	S/. 387,265.21 S/IGV		
	A/C=	10.00%		
<b>AMORTIZACION = A/C * V</b>				
MES DE LA VALORIZACION	MONTO VALORIZADO	AMORTIZACION		SALDO POR AMORTIZAR (SIN I.G.V.)
		A/C * V DEL MES	AMORTIZACION ACUMULADA	
Dic-20	289,113.41	28,911.34	28,911.34	358,353.87
Feb-21	591,801.12	59,180.11	88,091.45	299,173.76
Mar-21	555,623.48	55,562.35	143,653.80	243,611.41
Abr-21	572,963.67	57,296.37	200,950.17	186,315.04
May-21	0.00	0.00	0.00	0.00
Jun-21	0.00	0.00	0.00	0.00




"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

De la figura tenemos, la Amortización del Adelanto Directo en el mes de ABRIL DEL 2021 es S/ 57,296.37 (CINCUENTA Y SIETE MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 37/100 SOLES).

**11. CONCLUSIONES**

- ✓ Se comunica que la suscrita ha realizado la verificación y análisis de la documentación presentada por el Supervisor **CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS** en gabinete, donde previamente se da conformidad a los Metrados conciliados en conjunto por el Jefe de Supervisión y el Residente de Obra los mismos que fueran anotados en el Cuaderno de Obra.
- ✓ Se comunica que en la presente Valorización el **AVANCE REAL ACUMULADO DE OBRA** de 51.89%, con un **AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE OBRA** del 59.54% AL MES DE ABRIL. Por tanto, la Obra se encuentra **ATRASADA** según lo programado. Dichos porcentajes se han verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 04 – ABRIL del 2021 alcanzadas a la suscrita.
- ✓ Se comunica que el Monto Total Valorizado por el Contratista es de **S/ 572,963.67 (QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 67/100 SOLES)**; debiéndosele pagar un Monto Total **S/ 399,167.83 (TRES CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 83/100 SOLES)**; dicho monto se ha verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 04 – ABRIL del 2021 alcanzados a la suscrita y aprobados por la Supervisión – CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS.



VALORIZACION N° 04	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	S/572,963.67
REAJUSTE NETO	S/0.00
<b>AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO</b>	<b>S/57,296.37</b>
<b>AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES</b>	<b>S/116,499.47</b>
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	<b>S/399,167.83</b>
IGV 18%	S/0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	<b>S/399,167.83</b>

**12. RECOMENDACION**

- ✓ Se recomienda proceder de acuerdo a L.C.E. y R.L.C.E. a fin de corresponder con los trámites administrativos pertinentes.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,



Carolina Del Pilar Baneo Garate  
ARQUITECTA

Arq. Carolina Del Pilar Baneo Garate.  
COORDINADORA DE OBRA







# CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**Gobierno Regional de Loreto**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
 05 MAYO 2021  
 Hora: 11:24 am  
 Reg. N°

**Lagunas 04 de Mayo 2021 LORETO**  
**OFICINA DE ADM. DOCUMENTARIA**  
**UNIDAD TECNICA DOCUMENTARIO**  
 10182  
 05 MAY 2021  
 Fecha: RECEPCION

CARTA N° 021 - 2021 - CCL - MSCIC/RC

Señor:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

Atención : Gerencia Regional de Infraestructura

Asunto : REMITE INFORME DE VALORIZACION N° 04 DE LA CONTRATISTA

CONSORCIO LAGUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA

**Gobierno Regional de Loreto**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**  
**Sub Gerencia de Supervisión y Control**  
 Referencia :  
 00 MAY 2021  
 Fecha: 10182  
 Hora: 9:24 am  
 N° Reg: A

LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO"

INFORME N° 021 - 2021 - CSLAGUNAS/JS.EPINVAS

- Supervisión de la Obra : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO"
- Contrato N° 027- 20120- GRL/GRI

De mi especial Consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y en cumplimiento del contrato vigente, traslado informe de JEFE DE SUPERVISOR sobre LA VALORIZACION N° 04 DEL CONTRATISTA CONSORCIO LAGUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO" , para su evaluación y trámite correspondiente.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS  
 Marcos Sergio Chaparro Campos  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 DNI N° 16419685



10182  
 A. Supervision y Control  
 PARA SU EVALUACION

06/05/21

230165  
33077-940





PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
A: Arq. Carolina Bante  
SU  
Atencion

000359

**INFORME N° 21 – 2021 –CSLAGUNAS/JS.EPINVAS**

RECIBIDO  
"CONSORCIO SUPERVISION LAGUNAS"  
FECHA: 3/5/21 HORA: 10 AM  
FIRMA: 

A : Sr. MARCOS SERGIO CHUPILLON CAMPOS  
REPRESENTANTE COMUN CONSORCIO SUPERVISOR LAGUNAS

DE : Ing. Eduardo Pinchi Vásquez  
Jefe de Supervisión.

ASUNTO : REMITE INFORME DE VALORIZACION N° 04 DE LA CONTRATISTA "CONSORCIO LAGUNAS",  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA  
EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS  
DEPARTAMENTO DE LORETO"

**REFERENCIA:**

1. Carta N°22-2021-CL
2. Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS- PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO LORETO."
3. Contrato N° 027-2020-GRL-GRI


FECHA : Lagunas, 03 de Mayo de 2021.

De mi especial Consideración:

Es grato dirigirme a Usted, con la finalidad de hacer llegar el **Informe Mensual N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021**, de la obra **DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS – PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO"**, elaborada por el contratista **CONSORCIO LAGUNAS**, luego de su respectiva evaluación técnica y administrativa no presenta observación alguna, por lo que esta supervisión aprueba el contenido del mismo, se sugiere elevar a la instancia correspondiente para continuar con el trámite respectivo.

Se adjunta al presente la carta de la referencia y 02 copias de la valorización, sin otra particular me suscribo de usted.

Atentamente,

  
Ing. Eduardo Pinchi Vásquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689



CON LICITACION PUBLICA N° 06-2020-CSO ORL  
CONSORCIO LAGUNAS

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR  
62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO

REGION  
FIENNES  
DISTRITO  
LAGUNAS

SI. 1.872.632.12  
SI. 0.00  
SI. 0.00  
SI. 1.872.632.12

Fecha de Inicio de Obra  
01-Dic-20  
Plazo de Ejecucion  
180 Dias

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

30-May-21

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLERO CUCHO

**VALORIZACION MENSUAL N° 4  
AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

UNO	METRADO	P. UNO SI.	PARCIAL SI.	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE DE OBRA		SALDO POR VALORIZAR	
				Mtszds	%	Mtszds	%	Mtszds	%	Mtszds	%
<b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</b>											
<b>OBRAS PROVISIONALES</b>											
und		1.00	678.83	1.00	678.83	6.00	0.00	1.00	100.00	678.83	100.00
CARTEL DE OBRA 3.60 M x 2.40 M				4.00	2,600.00	1.00	500.00	5.00	83.33	2,500.00	1.00
ALQUILER DE ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANA		6.00	3,000.00	0.50	2,000.00	0.50	0.00	0.50	0.50	2,000.00	0.50
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y		1.00	4,000.00	300.00	6,261.00	0.00	0.00	300.00	100.00	6,261.00	0.00
CERCO PERIMETRICO DE SEGURIDAD DE OBRA		300.00	20.87	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,400.00	0.00
ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION		1.00	1,400.00	1.00	1,400.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,400.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL		6.00	300.00	4.00	1,200.00	1.00	300.00	5.00	83.33	1,500.00	1.00
FLETE ACUATICO YURMAGUAS - LAGUNAS		1,145.00	150.00	1,140.00	171,000.00	0.00	0.00	1,140.00	99.56	171,000.00	5.00
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>											
DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS		10.00	47.50	0.00	0.00	10.00	47.50	10.00	100.00	47.50	0.00
DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS DE FIERRO		35.00	621.95	35.00	621.95	0.00	0.00	35.00	100.00	621.95	0.00
DESMONTAJE DE CIELORASO DE TRIPLAY		2.22	1,312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESMONTAJE DE COBERTURA Y TUBERIALES		591.00	1,932.57	591.00	1,932.57	0.00	0.00	591.00	100.00	1,932.57	0.00
DESMONTAJE DE ALBAÑILERIA (MURD)		479.93	2,279.07	479.93	2,279.07	0.00	0.00	479.93	100.00	2,279.07	0.00
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO		10.13	1,323.89	10.13	1,323.89	0.00	0.00	10.13	100.00	1,323.89	0.00
DEMOLICION DE PISO DE FALSO PISO Y PISOS		591.00	2,943.18	591.00	2,943.18	0.00	0.00	591.00	100.00	2,943.18	0.00
<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>											
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL		1.00	5,580.00	1.00	5,580.00	0.00	0.00	1.00	100.00	5,580.00	0.00
PLAN DE SEGURIDAD, PRIMEROS AUXILIOS Y SEÑALIZACION		1.00	2,500.00	1.00	2,500.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,500.00	0.00
MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y MONITOREO DE RUIDOS		1.00	760.00	0.70	546.00	0.00	0.00	0.70	70.00	546.00	0.30
<b>ESTRUCTURA</b>											
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>											
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL		5,400.00	2.62	4,550.00	11,921.00	44.26	115.50	4,550.00	85.08	12,095.96	805.74
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR		3,318.39	4.53	3,118.39	14,128.31	100.00	453.00	3,218.39	96.99	14,579.31	100.00
<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>											
CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA RENDIMIENTO = 600 M3/DIA		1,068.31	5.94	1,068.31	6,523.96	0.00	0.00	1,068.31	100.00	6,523.96	0.00
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO		2,165.40	67.43	1,715.40	148,012.92	0.00	0.00	2,095.40	96.77	141,292.82	70.00
EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATA		189.95	43.56	185.40	8,274.66	0.00	0.00	185.40	97.60	8,078.02	4.56
EXCAVACION DE ZANJA PARA VIGAS DE CIMENTACION		177.03	37.34	177.03	6,610.30	0.00	0.00	177.03	100.00	6,610.30	0.00
EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTO CORRIDO		150.16	37.34	150.16	5,990.37	0.00	0.00	150.16	100.00	5,990.37	0.00
EXCAVACION DE ZANJA PARA GUINETAS		76.94	37.34	76.94	2,872.94	0.00	0.00	76.94	100.00	2,872.94	0.00
RELLENO DE ZANJAS APISONADO CON MATERIAL PRIMO EN CAPAS DE 0.20 M		209.78	105.34	209.78	22,098.23	0.00	0.00	209.78	100.00	22,098.23	0.00
RELLENO CON MATERIAL DE CHACRA DEE=0 10M		74.93	52.89	0.00	3,963.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE		1,858.81	21.78	1,456.81	40,441.32	0.00	0.00	1,666.81	89.77	36,303.12	180.00
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL		3,249.01	4.01	3,249.01	13,028.53	0.00	0.00	3,249.01	63.07	82,166.53	1,200.00
CAMA DE ARENA #=2, COMPACTADA		2,555.13	13.04	2,555.13	33,318.90	0.00	0.00	2,555.13	100.00	33,318.90	0.00
CAMA DE ARENA #=4, COMPACTADA		784.99	18.53	84.59	1,538.45	100.00	3,335.40	264.59	4902.85	33.72	530.00
<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>											
SOLADO ZAPATA H=4' (c=100 Kg/Cm2)		160.84	20.94	157.04	3,357.99	0.00	0.00	157.04	97.64	3,286.42	3.80
SOLADO PARA VIGA DE CIMENTACION H=4' (c=100 Kg/Cm2)		48.65	20.94	48.65	1,018.73	0.00	0.00	48.65	100.00	1,018.73	0.00
SOLADO PARA MURO PERIMETRICO H=2' (c=100 Kg/Cm2)		69.12	11.95	69.12	825.08	0.00	0.00	69.12	825.08	825.08	0.00
CONCRETO (c = 140 kg/cm2 EN CIMENTOS)		123.56	489.53	93.56	60,466.33	0.00	0.00	93.56	91.51	55,591.03	10.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CIMENTOS		276.58	27.37	200.58	7,569.99	0.00	0.00	200.58	92.41	6,995.22	21.00
CONCRETO (c = 175 kg/cm2 EN SOBRECIMENTOS)		13.85	543.16	9.86	7,528.20	0.00	0.00	9.86	85.57	6,441.98	2.00

000316

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuchu  
CIP. N° 41401



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

3ra LICITACION PUBLICA N° 06-2020-CSO GIRL  
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR  
62656 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region LORETO  
Provincia ALTO AMAZONAS  
Distrito LAGUNAS

S/. 3,872,652.12  
S/. 0.00  
S/. 3,872,652.12

61-Dic-20  
180 Días

Fecha de Inicio de Obra  
Plazo de Ejecución  
1° Fase/Inicio  
2° Fase/Inicio  
3° Fase/Inicio

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

**VALORIZACION MENSUAL N° 4**  
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

30-May-21

UNO	METRADO	P. UNO SI	PARCIAL SI	PREVIUUESTO			AVANCE ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE DE OBRA			SALDO POR VALORIZAR	
				METRADO	P. UNO SI	PARCIAL SI	Monto	Valorizado	%	Monto	Valorizado	%	Monto	Valorizado	%	Monto	Valorizado
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO	m2	179.67	27.37	4,917.57	159.87	4,370.17	10.00	273.70	169.67	4643.87	94.43	10.00	273.70				
CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 EN FALSO PISO	m3	1,210.82	46.69	56,533.19	810.82	37,857.19	100.00	4,669.00	910.82	42,526.19	75.22	300.00	14,007.00				
CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 EN LOSA DEPORTIVA Y PATIOS	m3	230.05	543.16	124,953.96	0.00	0.00	230.05	124,953.96	230.05	124,953.96	100.00	0.00	0.00				
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DEPORTIVA Y PATIOS	m2	78.12	27.37	2,165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.12	2,165.51				
OBRAS DE CONCRETO ARMADO																	
ZAPATAS																	
CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 EN ZAPATAS	m3	67.38	603.01	46,630.81	62.82	37,881.09	0.00	0.00	62.82	37,881.09	93.23	4.56	2,749.72				
ACERO CORRUGADO DE Ø 12" Y=4200 kg/cm2	kg	1,544.17	5.74	8,863.54	1,509.94	8,687.06	0.00	0.00	1,509.94	8,687.06	97.78	34.23	196.48				
VIGA DE CIMENTACION																	
CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 EN VIGAS DE CIMENTACION	m3	28.51	603.01	17,191.82	28.51	17,191.82	0.00	0.00	28.51	17,191.82	100.00	0.00	0.00				
ACERO CORRUGADO DE Ø 12" Y=4200 kg/cm2	kg	1,475.67	5.74	8,470.35	1,475.67	8,470.35	0.00	0.00	1,475.67	8,470.35	100.00	0.00	0.00				
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" Y=4200 kg/cm2	kg	1,449.69	4.85	7,030.51	1,449.69	7,030.51	0.00	0.00	1,449.69	7,030.51	100.00	0.00	0.00				
COLUMNAS																	
CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 EN COLUMNAS	m3	36.92	603.01	22,263.13	20.92	16,233.03	9.20	5,547.69	36.12	21,760.72	97.83	0.80	462.41				
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	512.21	27.37	14,019.19	312.21	8,545.19	190.00	5,200.30	512.21	13,745.49	98.05	10.00	273.70				
ACERO CORRUGADO DE Ø 12" Y=4200 kg/cm2	kg	3,029.70	5.74	17,380.49	2,939.70	16,873.89	70.00	401.60	3,009.70	17,275.68	99.34	20.00	114.80				
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" Y=4200 kg/cm2	kg	2,150.62	4.85	10,430.51	2,150.62	10,430.51	0.00	0.00	2,150.62	10,430.51	100.00	0.00	0.00				
COLUMNETAS																	
CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 EN COLUMNETAS	m3	22.10	543.16	12,033.84	12.10	6,572.24	3.00	1,628.48	15.10	8,201.72	68.33	7.00	3,802.12				
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS	m2	324.93	22.76	7,401.91	124.83	2,845.91	60.00	1,139.00	174.93	3,984.91	53.84	150.00	3,417.00				
ACERO CORRUGADO DE Ø 12" Y=4200 kg/cm2	kg	1,532.12	5.74	8,794.37	532.12	3,054.37	280.00	1,435.00	782.12	4,489.37	81.05	750.00	4,305.00				
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" Y=4200 kg/cm2	kg	1,352.12	4.85	6,957.78	1,052.12	5,102.78	100.00	485.00	1,152.12	5,587.78	85.21	200.00	970.00				
ACERO CORRUGADO DE Ø 1/4" Y=4200 kg/cm2	kg	270.30	4.34	1,173.10	270.30	1,173.10	0.00	0.00	270.30	1,173.10	100.00	0.00	0.00				
PANTALLAS Y SOBRECIMENTOS ARMADOS																	
CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 EN SOBRECIMIENTO ARMADO	m3	55.41	543.16	30,096.50	49.41	26,837.54	3.00	1,628.48	52.41	28,467.02	94.59	3.00	1,629.48				
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO ARMADO	m2	908.53	27.37	24,866.47	888.53	24,319.07	0.00	248.96	896.53	24,538.03	98.68	12.00	328.44				
ACERO CORRUGADO DE Ø 12" Y=4200 kg/cm2	kg	791.21	5.74	4,541.55	791.21	4,541.55	0.00	0.00	791.21	4,541.55	100.00	0.00	0.00				
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" Y=4200 kg/cm2	kg	3,037.26	4.85	14,730.71	2,737.26	13,275.71	160.00	777.50	2,987.26	14,003.21	95.06	160.00	727.50				
VIGAS																	
CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 EN VIGAS	m3	24.84	603.01	14,978.77	14.84	8,948.87	7.00	4,221.07	21.84	13,169.74	87.92	3.00	1,809.03				
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	262.82	28.91	7,992.34	112.82	3,555.84	100.00	2,891.00	212.82	6,148.84	80.96	50.00	1,445.50				
ACERO CORRUGADO DE Ø 12" Y=4200 kg/cm2	kg	2,233.21	5.74	12,818.63	2,233.21	12,818.63	800.00	4,592.00	2,033.21	11,670.63	91.04	200.00	1,148.00				
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" Y=4200 kg/cm2	kg	1,782.47	4.85	8,644.96	782.47	3,784.69	800.00	3,590.00	1,582.47	7,674.96	88.78	200.00	970.00				
LOSA MACIZA																	
CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 EN LOZA MACIZA	m3	4.85	603.01	2,924.60	2.00	1,206.02	0.00	0.00	2.00	1,206.02	41.24	2.85	1,718.25				
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA	m2	12.95	28.91	374.36	10.10	291.99	0.00	0.00	10.10	291.99	77.99	2.85	82.39				
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" Y=4200 kg/cm2	kg	269.91	4.85	1,304.70	130.30	631.96	0.00	0.00	130.30	631.96	48.44	130.71	672.74				
VIGAS Y DIENTES																	
CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 EN VIGAS Y DIENTES	m3	17.12	543.16	9,298.90	7.12	3,867.30	10.00	5,431.60	17.12	9,298.90	100.00	0.00	0.00				
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS Y DIENTES	m2	244.19	24.62	6,011.96	104.19	2,565.16	140.00	3,449.80	244.19	6,011.96	100.00	0.00	0.00				
ACERO CORRUGADO DE Ø 12" Y=4200 kg/cm2	kg	777.03	5.74	4,460.15	777.03	4,460.15	700.00	4,018.00	777.03	4,460.15	100.00	0.00	0.00				
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" Y=4200 kg/cm2	kg	1,048.54	4.85	5,085.42	588.54	2,787.42	480.00	2,328.00	1,048.54	5,085.42	100.00	0.00	0.00				
ACERO CORRUGADO DE Ø 1/4" Y=4200 kg/cm2	kg	76.50	4.34	332.01	76.50	332.01	0.00	0.00	76.50	332.01	100.00	0.00	0.00				
MESAS DE CONCRETO																	
CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 EN MESAS DE CONCRETO	m3	1.31	543.16	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	711.54				

000315

*Alfredo Ricardo Marmolejo Cuchio*  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

2da LICITACION PUBLICA N° 06-2020-CSO GRL  
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR  
620556 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region LORETO  
Provincia ALTO AMAZONAS  
Distrito LAGUNAS

SI. 3,872,552.12  
SI. 0.00  
SI. 0.00  
SI. 3,872,552.12

Fecha de Inicio de Obra 01-Dic-20  
Plazo de Ejecucion 180 Dias  
1ª Evaluacion  
2ª Evaluacion  
3ª Evaluacion  
Fecha de Término de Obra Social  
Fecha de Término de Obra Civil

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLERO CUCHO

**VALORIZACION MENSUAL N° 4  
AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

30-May-21

UNO	METRADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE DE OBRA		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			M2	P. UNO	Valorizado	Metodo	Valorizado	Metodo	Valorizado	Metodo	Valorizado	Metodo	Valorizado	Metodo
			SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.
ENCOFRADO Y DESCOFRADO EN MESAS DE CONCRETO	m2	27.62	26.04	719.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62	719.22
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" Y=4200 kg/cm2	kg	108.30	4.85	525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.30	525.26	
CUNETAS	m3	68.75	543.16	37,342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.75	37,342.25	
CONCRETO fe = 175 kg/cm2 EN CUNETAS	m3	788.60	35.31	27,845.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.60	27,845.47	
ENCOFRADO Y DESCOFRADO DE CUNETA	m2	3,839.93	4.85	18,623.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.93	18,623.66	
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" Y=4200 kg/cm2	kg	431.00	43.78	18,669.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	18,669.18	
TAPA DE CONCRETO ARMADO	m2	4.95	543.16	2,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	2,688.64	
GRADERIA	m3	103.95	27.37	2,845.11	103.95	2,845.11	0.00	0.00	103.95	2,845.11	2845.11	0.00	0.00	
CONCRETO fe = 175 kg/cm2 EN GRADERIA	m3	611.47	4.85	2,965.63	611.47	2,965.63	0.00	0.00	611.47	2,965.63	2965.63	0.00	0.00	
ENCOFRADO Y DESCOFRADO EN GRADERIA	m2	4,279.83	9.27	39,674.02	4,008.46	37,139.68	153.37	1,421.74	4,159.83	38,561.62	97.29	130.00	1,112.40	
ACERO CORRUGADO DE Ø 3/8" Y=4200 kg/cm2	kg	2,067.78	8.87	18,341.21	1,887.04	16,738.04	0.00	0.00	1,887.04	16,738.04	16,738.04	160.74	1,603.17	
ARRIOSTRES LONGITUDINALES ENTRE TIJERAS DE MADERA 2" X 4"	m	260.32	16.85	4,385.39	241.72	4,072.08	0.00	0.00	241.72	4,072.08	4,072.08	16.00	313.41	
COBERTURA CON PLANCHAS DE POLIPROPILENO	m2	1,598.27	92.07	146,047.88	268.27	26,366.88	905.00	83,323.35	1,191.27	106,680.23	75.10	395.00	36,367.65	
FRISOS CON POLIPROPILENO	m	284.86	33.04	9,411.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.86	9,411.77	
CUBRERA CO POLIPROPILENO	m	131.40	74.67	9,811.64	0.00	0.00	101.40	7,571.54	101.40	7,571.54	77.37	30.00	2,240.10	
ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA	m2	11.00	390.04	4,290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	4,290.44	
TIJERA METALICO TM -01 (L=4.5 M)	m	195.51	72.20	14,115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.51	14,115.82	
CORREA METALICAS	m	36.00	85.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	3,060.00	
ANCLAJE PARA TIJERAS METALICO	m2	127.08	79.07	10,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.08	10,048.22	
COBERTURA CON PLANCHAS DE POLIPROPILENO ONDULADA	m2	1,285.13	78.84	101,319.65	1,064.79	83,947.65	90.35	7,123.19	1,155.14	91,070.84	89.88	130.00	10,248.61	
ARQUITECTURA	m2	515.84	65.63	33,854.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.84	33,854.58	
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA	m2	128.01	26.38	3,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.01	3,376.90	
MUJO DE LADRILLO TUBULAR APAREJO DE SOGA JUNTA 15 cm - C.A. 1.5	m2	2,921.05	27.85	81,551.24	1,063.83	29,683.37	600.00	13,825.00	1,565.83	43,608.37	53.81	1,355.22	37,742.87	
CEMTO DE MADERA L=184.23 m. H=2.80 m	m2	59.25	27.85	1,650.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.25	1,650.11	
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	m2	531.63	27.85	14,805.90	0.00	0.00	251.63	7,007.90	251.63	7,007.90	47.33	280.00	7,798.00	
TARRAJEO FROTACHADO EN SARDINELES Y PAPEROS C.A. 1.5 e=1.5 cm	m2	475.19	31.95	15,182.32	0.00	0.00	185.19	5,916.82	185.19	5,916.82	38.87	280.00	9,265.50	
TARRAJEO FROTACHADO EN SARDINELES Y PAPEROS C.A. 1.5 e=1.5 cm	m2	103.95	27.85	2,895.01	103.95	2,895.01	0.00	0.00	103.95	2,895.01	100.00	0.00	0.00	
TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS	m2	731.35	30.64	22,408.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.35	22,408.55	
REVESTIMIENTO DE GRADAS C.A. 1.5 e=1.5 cm	m2	704.44	13.03	9,178.85	0.00	0.00	354.44	4,618.35	354.44	4,618.35	50.32	350.00	4,950.50	
TARDEADO PULIDO EN CUNETAS	m2	110.40	58.17	6,421.97	0.00	0.00	40.40	2,350.07	40.40	2,350.07	36.59	70.00	4,071.90	
VESTIDURA DE DERRAMES C.A= 1.5 e= 1.5 cm	m2	1,869.75	3.62	6,740.90	145.00	524.50	600.00	1,810.00	645.00	2,334.50	34.13	1,244.75	4,505.00	
CONFECCION DE PIZARRA DE MORTERO	m	1,395.15	67.84	94,714.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.15	94,714.82	
BRUNAS	m2	37.13	37.42	1,389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.13	1,389.40	
CIELORRASOS	m2	422.67	40.66	17,185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.67	17,185.76	
CIELORRASO DE PLANCHAS DE SUPERBOARD	m2	37.21	78.92	2,936.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.21	2,936.61	
CIELORRASO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PISOS Y PAVIMENTOS	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRAPISOS DE 30MM MEZCLA 1:5 BASE 3cm	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PISO DE CERAMICA 0.30 X 0.30 ANTIDESLIZANTE	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

000314

*Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho*  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

CON LICITACION PUBLICA N° 05-2020-CSO GRL.  
CONSORCIO LAGUNAS

CIASA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 620556 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Región: LORETO  
Provincia: ALTO AMAZONAS  
Distrito: LAGUNAS

S/. 3,872,632.12

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 3,872,632.12

Fecha de inicio de Obra

Plazo de Ejecución

1° Paralelos

2° Paralelos

3° Paralelos

01-Dic-20

180 Días

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

**VALORIZACION MENSUAL N° 4**

Fecha de Término de Obra Social

Fecha de Término Contractual

30-May-21

UNO	METRADO	P. UNO	PARCIAL	PRESUPUESTO		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE DE OBRA		SALDO POR VALORIZAR	
				SI.	SI.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
m2	1,133.09	32.18	36,487.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.09	36,487.14
m2	595.33	34.47	20,521.03	0.00	0.00	210.00	7,238.70	210.00	7,238.70	36.27	36.27	385.33	13,282.33
m2	244.22	27.37	6,684.30	0.00	0.00	80.00	2,189.60	80.00	2,189.60	32.76	32.76	164.22	4,494.70
m	1,356.00	17.08	23,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	23,160.48
m	597.58	19.90	19,851.84	0.00	0.00	119.58	2,379.64	119.58	2,379.64	11.99	11.99	878.00	17,472.20
m2	154.73	78.81	12,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.73	12,982.37
m2	81.27	269.03	16,987.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.27	16,987.87
m2	4.50	220.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	990.00
Repente	1.00	1,956.50	1,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,956.50
CONSUMO DE LAGUNAS	1.00	1,456.50	1,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,456.50
m2	2.10	349.50	733.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	733.95
und	2.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,000.00
und	23.00	1,168.08	26,865.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	26,865.84
und	18.00	1,519.35	27,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	27,348.30
und	1.00	957.93	957.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	957.93
und	2.00	740.64	1,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,481.28
und	1.00	769.72	769.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	769.72
und	1.00	961.50	961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	961.50
und	2.00	1,269.14	2,538.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,538.28
und	6.00	1,678.61	10,071.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10,071.66
und	2.00	595.42	1,190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,190.84
und	1.00	1,327.08	1,327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,327.08
und	1.00	1,005.15	1,005.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,005.15
und	2.00	1,322.08	2,644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,644.16
und	2.00	393.70	787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	787.40
und	2.00	415.44	830.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	830.88
m2	336.00	207.26	69,646.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	69,646.08
und	1.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700.00
und	2.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7,000.00
hr	49.50	35.23	1,743.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	1,743.89
m	10.00	320.08	3,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,200.80
m	4.00	111.52	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	446.08
m	1.00	586.75	586.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	586.75
m	2.00	526.75	1,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,053.50
par	167.00	9.62	1,606.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	1,606.54
pez	24.00	121.17	2,908.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	2,908.08
pez	81.00	76.17	1,599.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	1,599.57
und	81.00	18.31	1,483.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	1,483.11
m2	1,926.78	18.10	35,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.78	35,055.72
m2	1,326.42	18.61	24,894.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.42	24,894.68

Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho  
ING. CIVIL  
CID 888...

000313



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

LA LICITACION PUBLICA N° 05-2020-CSO GIRL  
CONSORCIO LAGUNAS

CASA

\*MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR  
62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO\*

Region Loreto  
Provincia ALTO AMAZONAS  
Distrito LAGUNAS

SI. 3,872,632.12  
SI. 6.00  
SI. 6.00  
SI. 3,872,632.12

Fecha de Inicio de Obra  
Fecha de Ejecución  
1ª Paralización  
2ª Paralización  
3ª Paralización  
Fecha de Término de Obra Social  
Fecha de Término Contractual

01-Dic-20  
180 Días

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLERO CUCHO

**VALORIZACION MENSUAL N° 4**  
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

30-May-21

UNO	METRADO	P. UNO SI.	PARCIAL SI.	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
				Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
PINTURA LATEX EN SUPERBOARD	m2	1,401.23	25,382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.23	25,382.26
PINTURA LATEX EN CIELRASO DE CEMENTO	m2	130.53	2,362.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.53	2,362.59
PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS (2 Manos) Inc. masillado	m2	620.61	11,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.61	11,233.04
PINTURA ESMALTE EN CONTRAZOLOS (h=0.30) Masillado	m2	997.58	7,441.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.58	7,441.95
PINTURA EN PUERTAS DE MADERA CIBARNIZ 02 MANOS	m2	82.75	1,020.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.75	1,020.31
PINTURA ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS (REJAS Y VENTANAS)	m2	317.76	5,783.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.76	5,783.65
PINTURA CON ESMALTE ANTICORROSIVO EN CARPINTERIA METALICA	m2	37.27	679.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27	679.43
PINTURA DE TRAFICO COLOR AZUL	m	176.00	1,365.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	1,365.76
PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO	m	72.00	588.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	588.72
PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO	m	116.50	904.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50	904.04
VARIOS											
SIEMBRA DE PLANTONES INCLUYE TAPADO DE HOYOS	und	60.00	1,578.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,578.60
SIEMBRA DE GRASS	und	391.69	10,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.69	10,083.33
LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	1.00	1,045.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,045.49
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62056	und	247.634.00	247,634.00	0.00	0.00	0.22	55,092.00	55,092.00	0.22	0.78	192,542.00
SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD Y CONTINGENCIAS	und	525.60	525.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	525.60
PLACA RECORDATORIA	und	440.43	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	440.43
INSTALACIONES SANITARIAS											
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS											
INCORRO TANQUE BAJO CON ACCESORIOS COMPLETOS	pa	11.00	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	295.14
LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN 1 LLAVE	pa	11.00	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	241.04
LAVATORIO DE PEDESTAL BLANCO	pa	5.00	611.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	611.85
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA	pa	2.00	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	209.24
PAPELERA DE LOSA BLANCA DE 0.15 X 0.15 M	pa	11.00	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	40.81
URINARIO DE LOSA DE PICO COLOR BLANCO	pa	3.00	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	184.04
DUCHA CROMADA Y LLAVE INCL. ACCESORIOS	und	5.00	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	76.05
TOALLERA DE PLASTICO 24" DE COLOR	pa	5.00	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	45.52
JABONERA DE LOSA BLANCA SIMPLE DE 0.15 X 0.15 M	pa	5.00	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35.52
BARRAS PARA CORTINA	pa	5.00	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	44.62
APOYABRAZOS PARA DISCAPACITADOS	pa	4.00	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	130.29
SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION											
EXCAVACION DE ZANJAS DE TERRENO NORMAL PICO 24" X 24" X 0.15 M	m3	38.55	1,467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.55	1,467.21
RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIAS PVC SAL DE 6"	m	15.00	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	33.07
RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIAS PVC SAL DE 4"	m	165.00	3,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	3,880.80
RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIAS PVC SAL DE 2"	m	60.00	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	21.92
SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2"	pa	4.00	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	73.45
SALIDA PARA DESAGUE PVC-SAL 2"	pa	15.00	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	56.03
SALIDA PARA DESAGUE PVC-SAL 4"	pa	6.00	391.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	391.66
SUMIDERO CON TRAMPA DE 2"	pa	6.00	315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	315.39
REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4"	pa	2.00	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	64.24
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" INCLUYE TAPA	pa	10.00	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	209.60
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 24" INCLUYE TAPA	pa	2.00	253.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	253.86
SISTEMA DE AGUA FRIA											
RED DE DISTRIBUCION											
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC - SAP 1/2"	pa	26.00	502.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	502.06
RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA 1/2" PVC-SAP	m	130.00	1,907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	1,907.10

000312



34 LICITACION PUBLICA N° 06-2020-C50 GIRL  
CONSORCIO LAGUNAS

0000

\*MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR  
62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO\*

Region LORETO  
Provincia ALTO AMAZONAS  
Distrito LAGUNAS

SI. 3,872,652.12  
SI. 0.00  
SI. 0.00  
SI. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra 01-Dic-20  
Plaza de Ejecucion 180 Dias  
1ª Paralización  
2ª Paralización  
3ª Paralización  
Fecha de Término de Obra Social  
Fecha de Término Contractual

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

VALORIZACION MENSUAL N° 4  
AL 30 DE ABRIL DEL 2021

30-May-21

UNO	PRESUPUESTO		P. UNO SI.	PARCIAL SI.	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	METRADO	SI.			Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado		
RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA 3/4" PVC-SAP	m	85.00	16.84	1,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	1,431.40
RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA 1" PVC-SAP	m	110.00	17.54	1,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1,929.40
COLOCACION Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE AGUA	und	32.00	8.35	267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	267.20
CODO PVC SAP DE 1/2" X 90°	und	8.00	8.83	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	70.64
CODO PVC SAP 3/4" X 90°	und	6.00	9.33	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	55.98
CODO PVC SAL 1" X 90°	und	20.00	8.41	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	168.20
TEE PVC SAP 1/2"	und	6.00	9.41	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	56.46
TEE PVC SAP 3/4" X 1/2"	und	6.00	9.91	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	59.46
TEE PVC SAP 1"	und	14.00	10.04	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	140.56
VALVULAS	und	5.00	63.97	319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	319.85
VALVULA COMPUERTA CON UNION UNIVERSAL DE 1/2"	und	290.62	30.80	8,951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.62	8,951.10
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL	m	253.36	23.35	5,915.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.36	5,915.96
CANALETAS DE 4" BAJADA DE AGUAS PLUVIALES	m	28.00	92.16	2,580.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	2,580.48
PROTECTOR DE MONTANTE DE AGUAS PLUVIALES DE 1.20 M	und	10.00	37.34	373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	373.40
EXCAVACION DE ZANJAS DE TERRENO NORMAL PICOLOCAC. TUBO DE 6", 4" Y	m3	50.00	35.23	1,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,811.50
RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIAS PVC SAL DE 6"	m	4.00	253.88	1,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,015.52
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 24" INCLUDE TAPA	DBB	1.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,500.00
POZO PERFORADO	db	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00
ESTUDIO Y TRABAJOS PRELIMINARES	db	1.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800.00
ESTUDIO DE PROSPECCION PARA POZO PERFORADO	db	1.00	692.58	692.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	692.58
ESTUDIO BACTERIOLOGICO	und	30.00	265.51	7,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	7,965.30
TRABAJOS PERSONAL ESPECIALIZADO DE SALUD AMBIENTAL	db	30.00	125.11	3,753.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3,753.30
TRABAJOS DE PERFORACION Y ENTUBADO	m	30.00	34.51	1,035.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,035.30
MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASTILLO DE PERFORACION	db	13.00	14.78	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	192.14
PERFORACION DE POZO CON EQUIPO DE ROTACION BROCA 8"	m	1.00	41.65	544.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	544.05
ENTUBADO CON TUBO PVC SAP DE 6" CLASE 10 RAMURADO (PERFORACION)	m	1.00	100,246.21	100,246.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100,246.21
ENTUBADO CON TUBO PVC SAP DE 6" CLASE 10 (PERFORACION)	m	1.00	351.31	351.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	351.31
TUBERIA PVC SAP DE 1 1/4" CLASE 10 AGUA POTABLE	m	30.00	14.35	430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	430.50
TUBERIA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RAPIDA - TANQUE DE ACERO	db	12.00	6.82	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	81.84
SISTEMA DE RENDIMIENTO + DESINFECCION DE POZO TUBULAR	db	1.00	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	77.95
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y EQUIPOS ESPECIALES	und	1.00	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	78.21
TUBERIA DE IMPULSION PVC SAP DE 1" C-10 AGUA POTABLE	m	1.00	2,355.78	2,355.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,355.78
CODO PVC SAP 1" X 90°	db	20.00	25.03	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	500.60
VALVULA CHECK DE 1"	und	15.00	11.59	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	173.70
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	und	1.00	1,804.91	1,804.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,804.91
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" ..... BOMBA SUMERGIBLE DE 2 HP INCLUDE ACCESORIOS GUARDO SUPLENIR VASISTEZ	und	1.00	1,804.91	1,804.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,804.91
TANQUE ELEVADO	und	1.00	1,804.91	1,804.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,804.91
INGENIERO CIVIL	db	1.00	49.67	7,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,351.16
TUBERIA DE ALIMENTACION PVC SAP 1"	m	20.00	25.03	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	500.60
TUBERIA DE REBOSE DE 2"	m	15.00	11.59	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	173.70
TANQUE DE POLIPROPILENO DE 2.5 M3 CON ACCESORIOS	und	1.00	1,804.91	1,804.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,804.91
INSTALACIONES ELECTRICAS	und	1.00	1,804.91	1,804.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,804.91
SALIDAS	db	148.00	49.67	7,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	7,351.16
SALIDA DE CENTRO DE LUZ (TECHO)	db	1.00	49.67	7,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,351.16

000311

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuzco  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41301



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

30 LICITACIÓN PÚBLICA N° 06-2020-C60 GIRL  
CONSORCIO LAGUNAS

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62058 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"  
Región: LORETO  
Provincia: ALTO AMAZONAS  
Distrito: LAGUNAS

SI. 3,872,632.12  
SI. 0.00  
SI. 0.00  
SI. 3,872,632.12

Fecha de Inicio de Obra: 01-Dic-20  
Plazo de Ejecución: 180 Días  
N° Postulación:  
2° Postulación  
3° Postulación:  
Fecha de Término de Obra Nivel: 30-May-21  
Fecha de Término Contratual:

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 4**

AL 30 DE ABRIL DEL 2021

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

UNO	METRADO	P. UNO SI.	PARCIAL SI.	PRESUPUESTO			AVANCE ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO			SALDO POR VALORIZAR	
				Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado			
000	23.00	67.31	1,548.13	0.00	0.00	0.00	23.00	1,548.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000	18.00	67.85	1,221.30	0.00	0.00	0.00	18.00	1,221.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000	61.00	65.78	4,012.58	0.00	0.00	0.00	61.00	4,012.58	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000	2.00	69.71	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000	45.00	49.67	2,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000	15.00	67.85	1,017.75	0.00	0.00	0.00	15.00	1,017.75	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
m	641.26	6.26	4,014.29	0.00	0.00	0.00	341.26	2,135.29	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.00	
m	258.76	6.79	1,756.98	0.00	0.00	0.00	58.76	398.98	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.00	
und	1.00	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.52	
m	80.00	26.96	2,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.80	
m	80.00	14.43	1,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.40	
m	175.00	39.82	6,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,968.50	
m	40.00	10.09	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.20	
m	193.00	28.53	5,506.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.29	
m	193.00	12.78	2,466.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.54	
m	948.40	5.42	5,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.33	
m	1,144.03	4.90	5,605.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.75	
und	1.00	987.43	987.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.43	
und	1.00	1,072.86	1,072.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.86	
und	1.00	1,646.80	1,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.80	
und	4.00	1,747.96	6,991.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,991.44	
und	1.00	1,087.86	1,087.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.86	
pez	54.00	102.58	5,539.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,539.32	
pez	93.00	71.29	6,629.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,629.97	
pez	4.00	192.58	770.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.32	
und	15.00	132.82	1,992.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.30	

Ing. Eduardo Pinchi Vasquez  
INCA INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689

Alfredo Ricardo Marmolejo Cuzco  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 41401

Segundo Velasco Valdes  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

11 LICITACION PUBLICA N° 06-2020-CSD GRIL  
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR  
62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Región: LORETO  
Provincia: ALTO AMAZONAS  
Distrito: LAGUNAS

area

SI. 3.872,632.12

SI. 0.00

SI. 0.00

SI. 3.872,632.12

Fecha de inicio de Obra

01-Dic-20

Fecha de Ejecución

183 Dias

1ª Participación

2ª Participación

3ª Participación

Fecha de Término de Obra Social

30-May-21

Fecha de Término Contractual

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 4**

AL 30 DE ABRIL DEL 2021

DESCRIPCIÓN DE OBRAS	PRESUPUESTO				AVANCE ANTERIOR				AVANCE ACTUAL				AVANCE ACUMULADO				SALDO POR VALORIZAR	
	UNID	METRADO	P. UNO SI.	PARCIAL SI.	Metrado	Utilizado	Metrado	Utilizado	Metrado	Utilizado	Metrado	Utilizado	Metrado	Utilizado	%	Metrado	Utilizado	
																		Metrado
VENTILADOR DE TECHO 3 ASPAS Ine. Accesorios	und	45.00	371.30	16,708.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	16,708.50	
POZO A TIERRA Y PARARRAYOS	und	3.00	1,004.68	3,014.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3,014.04	
POZO CONEXION A TIERRA PARA SISTEMA ELECTRICO	und	1.00	2,079.25	2,079.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,079.25	
PARARRAYO TIPO TETRA PUNTAL DE ACERO OJURGICO	und	1.00	1,187.16	1,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,187.16	
EQUIPOS ESPECIALES	und	1.00	61,768.96	61,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61,768.96	
MEGADOR DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA DE 4 HILO 380/220-60HZ 15/120A	und	1.00	1,187.16	1,187.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,187.16	
GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO DE 25KW 380/220 V. 60HZ	und	1.00	61,768.96	61,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61,768.96	
<b>TOTAL COSTO DIRECTO (A)</b>				<b>2,964,105.32</b>				<b>1,043,132.63</b>				<b>433,061.21</b>					<b>1,476,193.64</b>	
<b>GASTOS GENERALES (B)</b>				<b>10.000000%</b>				<b>104,313.26</b>				<b>43,306.12</b>					<b>147,619.38</b>	
<b>UTILIDAD (C)</b>				<b>13.26662%</b>				<b>139,390.53</b>				<b>57,453.45</b>					<b>195,843.98</b>	
								<b>1,285,836.42</b>				<b>533,820.78</b>					<b>1,819,657.20</b>	
<b>PLAN DE CONTINGENCIAS (D)</b>				<b>76,769.50</b>				<b>27,569.17</b>				<b>24,386.53</b>					<b>51,955.70</b>	
<b>OBRAS PRELIMINARES</b>																		
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS		5.42	150.00	813.00	4.42	663.00	1.00	150.00	5.42	613.00	1.00	150.00	5.42	613.00	1.00	0.00	0.00	
LIMPIEZA DE TERRENO (CON PICO, LAMPA Y CARRETILLA)	M2	303.37	2.62	794.83	303.37	794.83	0.00	0.00	303.37	794.83	100.00	0.00	303.37	794.83	100.00	0.00	0.00	
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	M2	303.37	4.53	1,374.27	303.37	1,374.27	0.00	0.00	303.37	1,374.27	100.00	0.00	303.37	1,374.27	100.00	0.00	0.00	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	M3	2.38	18.67	44.43	2.38	44.43	0.00	0.00	2.38	44.43	100.00	0.00	2.38	44.43	100.00	0.00	0.00	
EXCAVACION PARA COLUMNA DE MADERA DE 6"x6"	M3	1.52	18.84	28.64	1.52	28.64	0.00	0.00	1.52	28.64	100.00	0.00	1.52	28.64	100.00	0.00	0.00	
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	0.86	9.33	8.02	0.86	8.02	0.00	0.00	0.86	8.02	100.00	0.00	0.86	8.02	100.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE BARRERA DE CONTENCION DE TIERRAS	M3	0.86	9.33	8.02	0.86	8.02	0.00	0.00	0.86	8.02	100.00	0.00	0.86	8.02	100.00	0.00	0.00	
ESTRUCTURA DE MADERA																		
COLUMNAS																		
COLUMNAS DE MADERA DE 6"x6" h=4.60m	UNID	38.00	101.08	3,841.04	38.00	3,841.04	0.00	0.00	38.00	3,841.04	100.00	0.00	38.00	3,841.04	100.00	0.00	0.00	
VIGAS																		
VIGAS DE MADERA DE 2"x6"	UNID	124.24	33.47	4,158.31	124.24	4,158.31	0.00	0.00	124.24	4,158.31	100.00	0.00	124.24	4,158.31	100.00	0.00	0.00	
TABICQUERIA DE MADERA																		
LISTON DE 2"x3" (ENTRAMADO)	M	570.34	6.67	3,804.17	570.34	3,804.17	0.00	0.00	570.34	3,804.17	100.00	0.00	570.34	3,804.17	100.00	0.00	0.00	
CONTRAPLACADO CON PLANCHAS TRIPLAY (FORRADO)	M2	698.72	10.91	7,623.04	698.72	7,623.04	0.00	0.00	698.72	7,623.04	100.00	0.00	698.72	7,623.04	100.00	0.00	0.00	
ESTRUCTURA DE TECHO Y COBERTURA																		
TIJERAL DE MADERA DE L=9.80m Y h=1.65m DE 2"x4" Y DE 2"x3"	UNID	10.00	546.73	5,467.30	10.00	5,467.30	0.00	0.00	10.00	5,467.30	100.00	0.00	10.00	5,467.30	100.00	0.00	0.00	
CORREAS DE MADERA DE 2"x3" @ 0.80M	M	428.82	10.24	4,391.12	428.82	4,391.12	0.00	0.00	428.82	4,391.12	100.00	0.00	428.82	4,391.12	100.00	0.00	0.00	
COBERTURA DE CALAMINA CORRUGADA ZINC e=0.29mm	M2	352.69	29.06	10,249.17	352.69	10,249.17	0.00	0.00	352.69	10,249.17	100.00	0.00	352.69	10,249.17	100.00	0.00	0.00	
CUMBRERA DE CALAMINA CORRUGADA ZINC e=0.26mm	M	30.63	9.31	285.17	30.63	285.17	0.00	0.00	30.63	285.17	100.00	0.00	30.63	285.17	100.00	0.00	0.00	
PISOS Y VEREDAS																		
PISO DE CEMENTO FROTACHADO BRUÑADO E=4" C/A 1:8	M2	278.29	25.89	7,204.93	278.29	7,204.93	0.00	0.00	278.29	7,204.93	100.00	0.00	278.29	7,204.93	100.00	0.00	0.00	
VEREDA E=4", MORTERO FC=140 KG/CM2	M2	25.08	25.89	649.32	25.08	649.32	0.00	0.00	25.08	649.32	100.00	0.00	25.08	649.32	100.00	0.00	0.00	
CAMA DE ARENA E=4"	M2	25.08	8.11	203.40	25.08	203.40	0.00	0.00	25.08	203.40	100.00	0.00	25.08	203.40	100.00	0.00	0.00	
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	13.61	22.24	302.69	13.61	302.69	0.00	0.00	13.61	302.69	100.00	0.00	13.61	302.69	100.00	0.00	0.00	
CARPINTERIA DE MADERA																		
PUERTA CONTRAPLACADA P-1 UNA HOJA (1.20x1.60)	UNID	3.00	477.13	1,431.39	3.00	1,431.39	0.00	0.00	3.00	1,431.39	100.00	0.00	3.00	1,431.39	100.00	0.00	0.00	

*[Handwritten signature]*  
Segunda Manera de Pagos C/4  
República del Perú  
CONSORCIO LAS TONAS

*[Handwritten signature]*  
Ing. Eduardo Pacheco Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 33689

*[Handwritten signature]*  
Alfredo Ricardo Marmolejo Cuello  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 41401



1 LICITACION PUBLICA N° 06-2020-C50 ORL  
CONSORCIO LAGUNAS

Region Loreto  
Provincia Alto Amazonas  
Distrito Lagunas

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR 62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

SI: 3.872.652,12  
SI: 8,00  
SI: 8,00  
SI: 3.872.652,12

Fecha de Inicio de Obra  
Flujo de Ejecución  
1ª Paralización  
2ª Paralización  
Fecha de Término de Obra Inicial  
Fecha de Término Contractual

01-Dic-20  
180 Días

30-May-21

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 4  
AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARWOLEJO CUCHO

UNO	PRESUPUESTO		PARCIAL		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	METRADO	P. UNO SI	SI	%	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
PUERTA CONTRAPLACADA P-2 UNA HOJA (0.90*2.10)	4.00	411.71	1,646.84	0.00	0.00	1,646.84	4.00	1,646.84	1646.84	100.00	0.00	0.00
PUERTA CONTRAPLACADA P-3 UNA HOJA (0.70*1.80)	2.00	361.71	723.42	0.00	0.00	723.42	2.00	723.42	723.42	100.00	0.00	0.00
PUERTA CONTRAPLACADA P-4 UNA HOJA (0.70*2.10)	1.00	364.27	364.27	0.00	0.00	364.27	1.00	364.27	364.27	100.00	0.00	0.00
VENTANA V-1 (0.60*0.60m), marco de madera y malla mosquitero	1.00	86.28	86.28	0.00	0.00	86.28	1.00	86.28	86.28	100.00	0.00	0.00
VENTANA V-2 (1.00*0.60m), marco de madera y malla mosquitero	37.00	90.19	3,337.03	0.00	0.00	3,337.03	37.00	3,337.03	3337.03	100.00	0.00	0.00
CERRAJERIA												
CERRADURA TIPO EXPOLOCK COMPLETA	8.00	74.86	598.88	0.00	0.00	598.88	8.00	598.88	598.88	100.00	0.00	0.00
CERROJO DE 2" ALUMINIZADO PARA PUERTA DE BAÑOS	2.00	8.17	16.34	0.00	0.00	16.34	2.00	16.34	16.34	100.00	0.00	0.00
BISAGRA CAPUCHINA DE 2 1/2" ALUMINIZADO	20.00	6.78	135.60	0.00	0.00	135.60	20.00	135.60	135.60	100.00	0.00	0.00
INSTALACIONES SANITARIAS												
MOVIMIENTO DE TIERRA												
EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TENDIDO DE TUBERIA	M3	13.07	25.86	1.98	25.86	0.00	0.00	1.98	25.86	100.00	0.00	0.00
EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA CAJAS DE REGISTRO Y SUMIDERO	M3	0.28	3.66	0.28	3.66	0.00	0.00	0.28	3.66	100.00	0.00	0.00
RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	M3	1.49	18.84	1.49	28.07	0.00	0.00	1.49	28.07	100.00	0.00	0.00
CAMA DE ARENA E=0.10M	M2	5.70	32.94	5.70	187.76	0.00	0.00	5.70	187.76	100.00	0.00	0.00
ELIMINACIÓN DE DESMONTAJE AL CONTRATO DE LA OBRA CON CALIDAD I.A.	M3	1.34	9.33	12.50	12.50	0.00	0.00	1.34	12.50	100.00	0.00	0.00
CAMA DE INSPECCIÓN												
CAMA DE REGISTRO Y PROVEIDOR DE 10.00*0.00m	UND	169.92	169.92	1.00	169.92	0.00	0.00	1.00	169.92	100.00	0.00	0.00
SISTEMA DE DESAGUE												
SALIDA DE DESAGUE DIAM. 4" PVC SAL. zona de jardines	PTO	48.82	146.46	3.00	146.46	0.00	0.00	3.00	146.46	100.00	0.00	0.00
SALIDA DE DESAGUE PVC SAL. DIAM. 2" ZONA DE BAÑOS, VESTIBULO	PTO	35.89	107.67	3.00	107.67	0.00	0.00	3.00	107.67	100.00	0.00	0.00
SALIDA DE VENTILACIÓN PVC SAL DIAM. 2"	PTO	43.06	43.06	1.00	43.06	0.00	0.00	1.00	43.06	100.00	0.00	0.00
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE DESAGUE												
RED DE DESAGUE PVC SAL DE 4"	M	9.37	112.44	12.60	112.44	0.00	0.00	12.60	112.44	100.00	0.00	0.00
RED DE DESAGUE PVC SAL DE 2"	M	8.72	43.60	5.00	43.60	0.00	0.00	5.00	43.60	100.00	0.00	0.00
ADITAMENTO VARIOS												
REGISTRO DE BRONCE DE 4", PROVEIDOR Y COLOCADO	UND	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.04	100.00	0.00	0.00
SUMIDERO DE BRONCE DE 2", PROVEIDOR Y COLOCADO	UND	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14.03	100.00	0.00	0.00
ACCESORIOS PARA REDES DE DESAGUE												
YEE SIMPLE PVC SAP DE 4"	UND	11.86	23.72	2.00	23.72	0.00	0.00	2.00	23.72	100.00	0.00	0.00
YEE SIMPLE PVC SAP DE 2"	UND	7.86	15.72	2.00	15.72	0.00	0.00	2.00	15.72	100.00	0.00	0.00
YEE REDUCCIÓN PVC SAP DE 4" A 2"	UND	11.86	11.86	1.00	11.86	0.00	0.00	1.00	11.86	100.00	0.00	0.00
CODO PVC SAP 90° DE 4"	UND	11.86	23.72	2.00	23.72	0.00	0.00	2.00	23.72	100.00	0.00	0.00
CODO PVC SAP 90° DE 2"	UND	7.86	15.72	2.00	15.72	0.00	0.00	2.00	15.72	100.00	0.00	0.00
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS												
INODORO TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA	UND	328.43	656.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	656.86	100.00	0.00	0.00
REPRESANTANTE COMUN	UND	269.79	539.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	539.58	100.00	0.00	0.00
CONSORCIO LAGUNAS	UND	39.22	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	78.44	100.00	0.00	0.00
LAVATORIO DE LOSA TIPO OVALIN	UND	1,042.24	1,042.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,042.24	100.00	0.00	0.00
GRIFO DE BRONCE CROMADO DE 1/2"	UND											
ELECTROBOMBA 0.5 HP inc. Accesorios	UND											
SALIDA DE AGUA FRIA												
SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP DE 1/2"	PTO	33.49	133.96	4.00	133.96	0.00	0.00	4.00	133.96	100.00	0.00	0.00

  
 Alfredo Ricardo Marwolejo Cucho  
 INGS. CIVIL  
 CIP. N° 41401



**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

1 LICITACION PUBLICA N° 56-2020-C50 GRI.  
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR  
62856 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region Loreto  
Provincia Alto Amazonas  
Distrito Lagunas

obra

SI. 3.872,632.12

SI. 0.00

SI. 0.00

SI. 3.872,632.12

Fecha de Inicio de Obra  
Plazo de Ejecución  
1ª Paralización  
2ª Paralización  
3ª Paralización

01-Dic-20  
180 Días

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ

ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

**VALORIZACION MENSUAL N° 4**

AL 30 DE ABRIL DEL 2021

30-May-21

Fecha de Inicio de Obra  
Fecha de Término de Obra Social  
Fecha de Término Contractual

DESCRIPCION DE OBRAS	PRESUPUESTO			PARCIAL			AVANCE ANTERIOR			AVANCE ACTUAL			AVANCE ACUMULADO			BALDO POR VALORIZAR				
	UND	METRADO	P. UNO	SI.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado		
																			SI.	%
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA																				
RED DE AGUA PVC SAP DE 1"	M	3.00	8.15	24.45	3.00	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	24.45	100.00	0.00	0.00	
RED DE AGUA PVC SAP DE 1/2"	M	12.00	7.73	92.76	12.00	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	92.76	100.00	0.00	0.00	
ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA FRIA																				
CODO PVC SAP 1"X90°	UND	2.00	7.89	15.78	2.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	15.78	100.00	0.00	0.00	
CODO PVC SAP 1/2"X90°	UND	3.00	7.39	22.17	3.00	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	22.17	100.00	0.00	0.00	
TEE PVC SAP 1/2"	UND	3.00	7.31	21.93	3.00	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	21.93	100.00	0.00	0.00	
REDUCCION PVC-SAP 1" A 1/2"	UND	1.00	7.31	7.31	1.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7.31	100.00	0.00	0.00	
LLAVES Y VALVULAS																				
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1"	UND	1.00	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	64.49	100.00	0.00	0.00	
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2"	UND	3.00	52.34	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	157.02	100.00	0.00	0.00	
INSTALACIONES SANITARIAS (TANQUE ELEVADO)																				
RED DE AGUA POTABLE																				
1 TANQUE DE POLIETILENO DE 600 LTS	UND	2.00	1,125.81	2,251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,251.62	100.00	0.00	0.00	
2 RED DE AGUA PVC SAP DE 1"	M	6.00	8.15	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	48.90	100.00	0.00	0.00	
3 VALVULA DE COMPUERTA DE 1" Ing. E. Pinchi Vasquez	UND	1.00	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	32.49	100.00	0.00	0.00	
RED DE DESAGUE																				
1 TUBERIA DE REBOSE DE 2"	M	4.00	8.72	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	34.88	100.00	0.00	0.00	
2 VALVULA ESFERICA DE 2"	UND	1.00	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	44.39	100.00	0.00	0.00	
3 CODO PVC SAP 90° DE 2"	UND	2.00	7.86	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	15.72	100.00	0.00	0.00	
INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES																				
CENTRO DE LUZ Y ARTEFACTOS DE ALUMBRADO																				
1 CENTRO DE LUZ Y ARTEFACTOS DE ALUMBRADO	PTO	17.00	184.21	3,131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	3,131.57	100.00	0.00	0.00	
EQUIPO FLUORESCENTE 2'36 W 220V-60Hz	UND	17.00	90.22	1,533.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	1,533.74	100.00	0.00	0.00	
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO SIMPLE 15A-250V-60Hz	UND	5.00	24.19	120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	120.95	100.00	0.00	0.00	
INTERRUPTOR DE ALUMBRADO DOBLE 15A-250V-60Hz	UND	3.00	26.19	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	78.57	100.00	0.00	0.00	
SALIDA DE FUERZA - BAJA TENSION																				
1 SALIDA DE FUERZA - BAJA TENSION	PTO	13.00	105.87	1,376.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	1,376.31	100.00	0.00	0.00	
TABLEROS ELECTRICOS																				
1 TABLERO GENERAL 10x2 200V-60Hz DE FUERZA Y ALUMBRADO	JGO	1.00	1,594.83	1,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,594.83	100.00	0.00	0.00	
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OTROS PARA TENDIDO DE CABLES																				
1 EXCAVACION DE ZANJA PARA TENDIDO DE CABLES	M3	0.68	23.84	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	16.21	100.00	0.00	0.00	
ALIMENTADORES SUBTERRANEOS																				
1 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	M3	0.65	10.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	6.50	100.00	0.00	0.00	
CAJA DE MORTERO PARA PASO DE 0.35Mx0.35M INCLUYE TAPA																				
1 CAJA DE MORTERO PARA PASO DE 0.35Mx0.35M INCLUYE TAPA	UND	6.00	142.32	853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	853.92	100.00	0.00	0.00	
CONDUCTORES ELECTRICOS																				
1 COND. CU. THW 2'2.5 mm2 en tub. PVC-SEL DIAM. 3/4"	M	65.00	6.70	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	435.50	100.00	0.00	0.00	
2 COND. CU. THW 2'4 mm2 + 2'2.5 mm2 EN TUB. PVC-SEL DE 3/4"	M	70.00	8.95	626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	626.50	100.00	0.00	0.00	
3 COND. CU. THW 2'4 mm2 + 2'2.5 mm2 EN TUB. PVC-SEL DE 3/4"	M	10.00	11.65	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	116.50	100.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA																				

  
 Alfredo Ricardo Marmolejo Cuchio  
 INE - CIVIL  
 CIP. N° 41401

000307



LICITACION PUBLICA N° 05-2020-CBO GRU  
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR  
62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Region: LORETO  
Provincia: ALTO AMAZONAS  
Distrito: LAGUNAS

OBRA  
SI: 3,072,652.12  
SI: 0.00  
SI: 0.00  
SI: 3,072,652.12

Fecha de Inicio de Obra: 01-01-20  
Plazo de Ejecucion: 180 Dias  
1ª Fertilizacion  
2ª Fertilizacion  
3ª Fertilizacion  
Fecha de Término de Obra Inicial: 30-May-21  
Fecha de Firmas Contractual

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

UNID	PRESUPUESTO		PARCIAL		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	METRADO	P. UNO	SI	SI	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
JGO	1.00	1,004.68	1,004.68	1,004.68	0.00	1,004.68	1.00	1,004.68	1.00	1,004.68	100.00	0.00
POZO DE PUESTA A TIERRA - PARA TABLERO GENERAL												
VALORIZACION MENSUAL N° 4 AL 30 DE ABRIL DEL 2021												

ING. EDUARDO PINCH VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

*[Signature]*  
Segundo Michel Sarriles Cuch  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS

*[Signature]*  
Ing. Eduardo Pinch Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 56689

*[Signature]*  
Alfredo Ricardo Marmolejo Cuch  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

ALICITACION PUBLICA N° 06-2020-CSO GIRL  
CONSORCIO LAGUNAS

CUBA

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR  
62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

Región: LORETO  
Provincia: ALTO AMAZONAS  
Distrito: LAGUNAS

S/. 3,872,652.12  
S/. 0.00  
S/. 0.00  
S/. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra: 01-Dic-20  
Plazo de Ejecución: 180 Días  
1° Fase/Activación:  
2° Fase/Activación:  
Fecha de Término de Obra Social:  
Fecha de Término Contractual: 30-May-21

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 4  
AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

ING. EDUARDO FINCHI VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARWOLEJO CUCHO

UNO	PRESUPUESTO		PARCIAL S/.	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	METRADO	F. UNO S/.		Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	%		Metrado
<b>PLAN COVID-19 (E)</b>											
M2	322,655.34	0.03	9,679.66	215,102.07	4,039.83	828.57	242,654.94	7279.65	76.21	80,000.40	2,400.01
UND	48.00	28.24	1,355.52	18.00	0.00	262.40	28.00	790.72	68.33	20.00	564.80
UND	4.00	1,956.38	7,425.52	3.00	3,712.76	1,896.38	4.00	7,425.52	100.00	0.00	0.00
UND	24.00	59.08	1,417.92	24.00	1,417.92	0.00	24.00	1,417.92	100.00	0.00	0.00
UND	2.00	568.50	1,117.00	1.00	0.00	279.25	1.50	837.75	76.00	0.50	279.25
UND	3.00	420.00	1,260.00	3.00	1,260.00	0.00	3.00	1,260.00	100.00	0.00	0.00
UND	180.00	15.00	2,700.00	120.00	1,350.00	450.00	150.00	2,250.00	83.33	30.00	450.00
UND	180.00	222.00	39,960.00	105.00	13,320.00	20.00	4,460.00	27,750.00	69.44	55.00	12,210.00
UND	1.00	4,728.00	4,728.00	1.00	4,728.00	0.00	1.00	4,728.00	100.00	0.00	0.00
UND	1.00	6,127.50	6,127.50	1.00	6,127.50	0.00	1.00	6,127.50	100.00	0.00	0.00
UND	1.00	10,716.00	10,716.00	1.00	10,716.00	0.00	1.00	10,716.00	100.00	0.00	0.00
UND	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	1.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00
UND	8,640.00	1.00	8,640.00	8,640.00	2,860.00	500.00	7,140.00	7140.00	82.64	1,500.00	1,000.00
UND	180.00	176.94	31,849.20	90.00	10,616.40	30.00	5,308.20	21,232.80	66.67	60.00	10,616.40
UND	5.00	14.20	71.00	2.00	0.00	1.00	14.20	42.60	60.00	2.00	26.40
UND	5.00	14.20	71.00	2.00	0.00	1.00	14.20	42.60	60.00	2.00	26.40
UND	5.00	113.16	565.80	2.00	0.00	1.00	113.16	339.48	60.00	2.00	226.32
UND	5.00	672.00	3,360.00	2.50	1,008.00	1.00	672.00	2,352.00	70.00	1.50	1,008.00

  
 Alfredo Ricardo Marwolejo Cucho  
 ING. CIVIL  
 CIP. N° 41401

  
 Segundo Michel Gonzalez  
 Representante Común  
 CONSORCIO LAGUNAS

000305



41 LICITACION PUBLICA N° 06-2024-CSO GRU  
CONSORCIO LAGUNAS

"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR  
62056 DE VILLA LAGUNAS, DEL DISTRITO DE LAGUNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO"

LURETO  
ALTO AMAZONAS

SI. 3,872,652.12  
SI. 0.00  
SI. 0.00  
SI. 3,872,652.12

Fecha de Inicio de Obra  
01-Dic-20  
180 Días  
N° Período  
1  
N° Período  
1

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 4  
AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

30-May-21

ING. EDUARDO PINCHI VASQUEZ  
ING. ALFREDO RICARDO MARMOLEJO CUCHO

UNO	METRADO	P. UNO SI.	PARCIAL SI.	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
				Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
UND	53.00	151.04	8,005.12	53.00	8,209.12	0.00	0.00	6005.12	6005.12	0.00	0.00
TON	0.50	150.00	75.00	0.50	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL ( A+B+C+D+E)</b>			<b>3,872,652.12</b>		<b>880,856.20</b>		<b>572,963.67</b>		<b>880,856.20</b>		<b>1,898,226.55</b>
<b>FACTOR DE RELACION =</b>			<b>1</b>		<b>880,856.20</b>		<b>572,963.67</b>		<b>880,856.20</b>		<b>1,898,226.55</b>
<b>DE AVANCE MENSUAL AL MES DE ABRIL 2,021</b>					<b>22.75%</b>		<b>14.80%</b>		<b>22.75%</b>		<b>48.76%</b>
<b>DE AVANCE ACUMULADO AL MES DE ABRIL 2,021</b>									<b>100.00%</b>		

Ing. Eduardo Pinchi Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 95689

Alfredo Ricardo Marmolejo CUCHO  
ING. CIVIL  
CIP N° 41401

Segundo Michel Condesca  
Presidente Común  
CONSORCIO LAGUNAS



"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"

## PANEL FOTOGRÁFICO

### CERCO PERIMÉTRICO:



EXCAVACIÓN DE ZANJA

  
Alfredo Ricardo Mermolejo Cuchó  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41901



VACEO DE SOLADO

  
Ing. Eduardo Vinchi Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 55663

  
Edmundo Michel González  
Representante Comunal  
CONSORCIO LAGUNAS




“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO”



PLANTADO DE COLUMNAS Y VACEO EN CIMENTO CORRIDO

  
Alfredo Ricardo Marmolejo Tucho  
ING. CIVIL  
CIP N° 41401

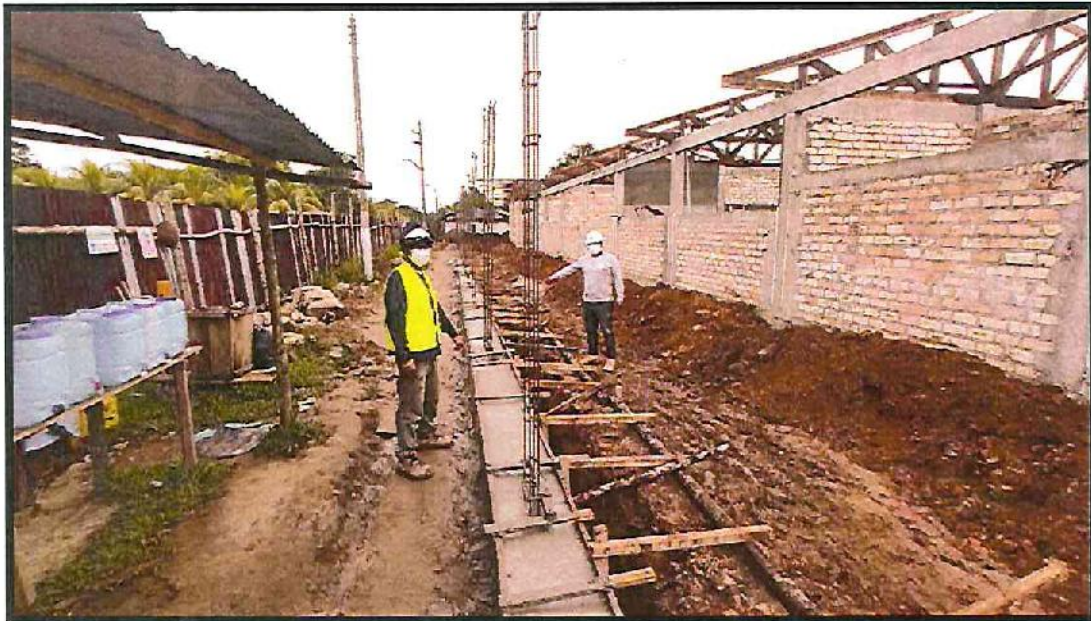


PLANTADO DE COLUMNAS Y VACEO EN CIMENTO CORRIDO

  
Segundo Miche Gonzalez  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS

  
Ing. Eduard Munch Masquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55660




"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"

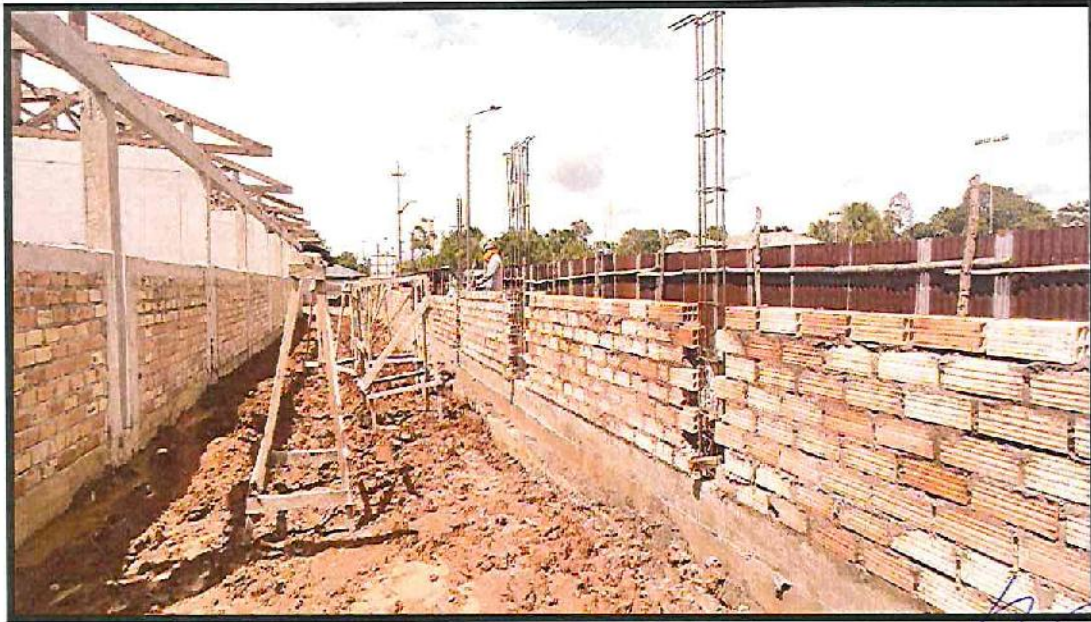

MURO DE LADRILLO TIPO SOGA

  
Alfredo Ricardo Marmolejo Cacho  
ING. CIVIL  
CIP. N° 4140

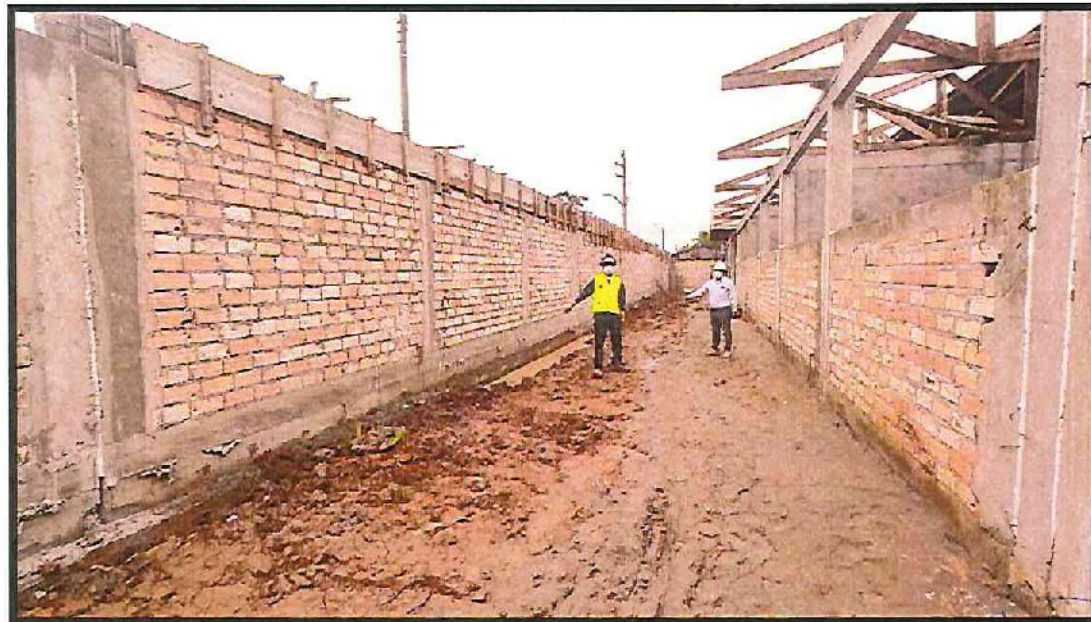


MURO DE LADRILLO TIPO SOGA

  
Segundo Michel González C. J. G.  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS


  
Ing. Eduardo Michel Viquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 55689




“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO”

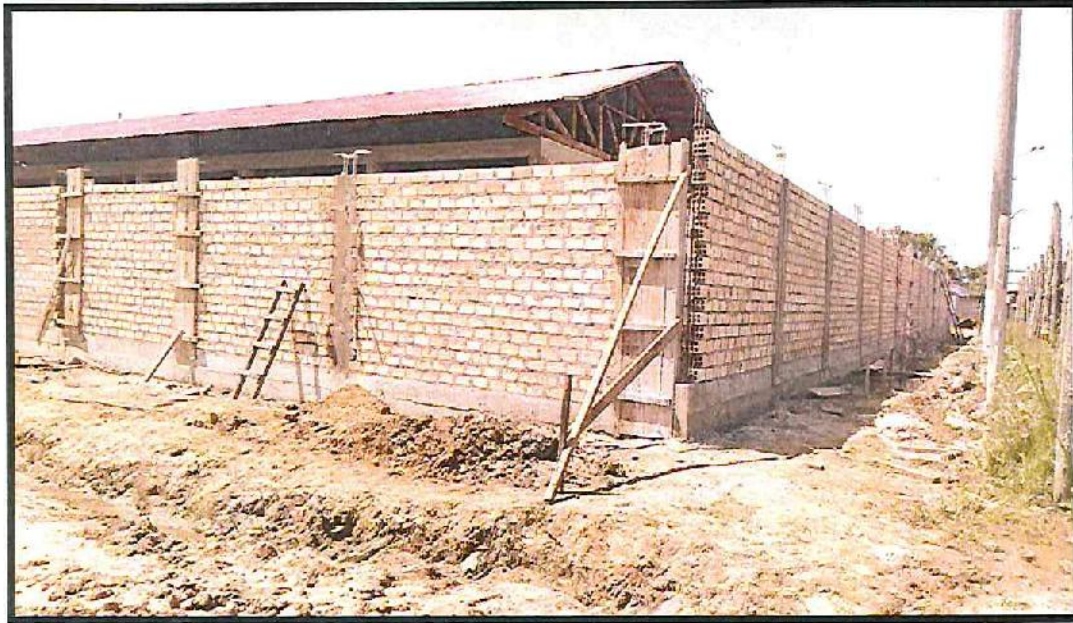

MURO DE LADRILLO TIPO SOGA

  
Alfredo Ricardo Mamotofo Cucho  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401

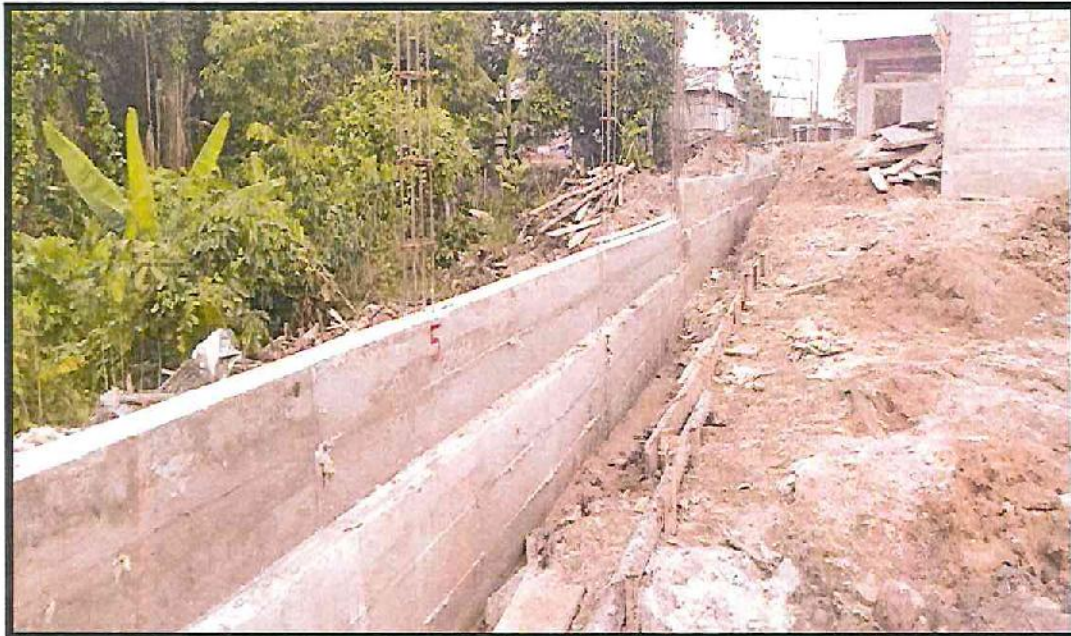

CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO

  
Segundo Michel Gonzalez Cucho,  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS


  
Ing. Eduardo Pineda Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 55889




"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"


## MODULOS:

### TARRAJEOS:

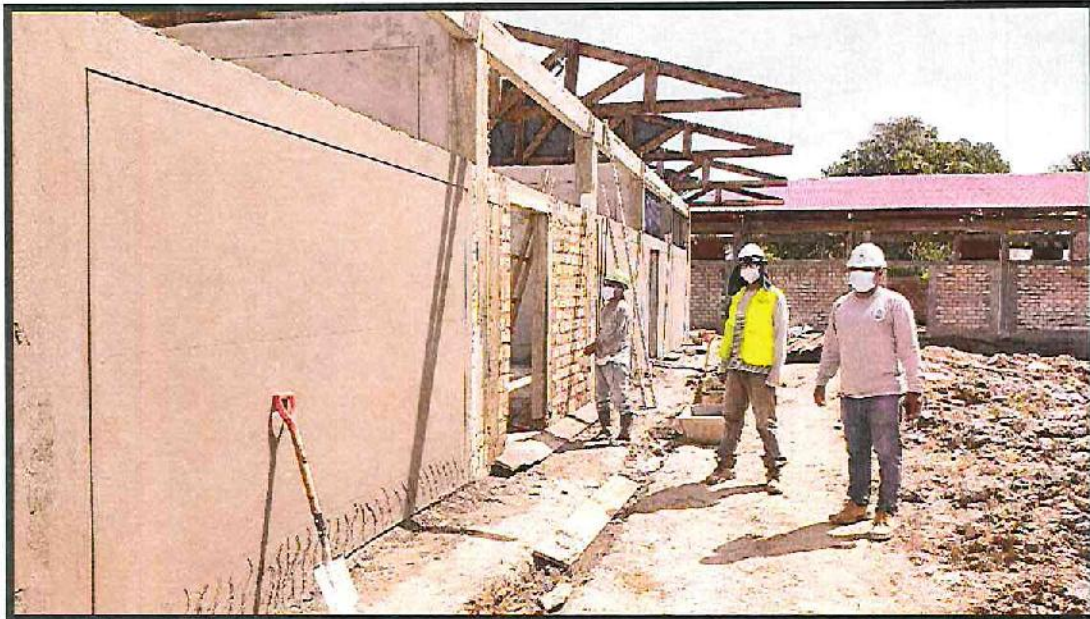


TARRAJEO EXTERIOR EN MODULO 1

  
Alfredo Ricardo Marmolejo Castro  
ING. CIVIL  
CIP. N° 41401

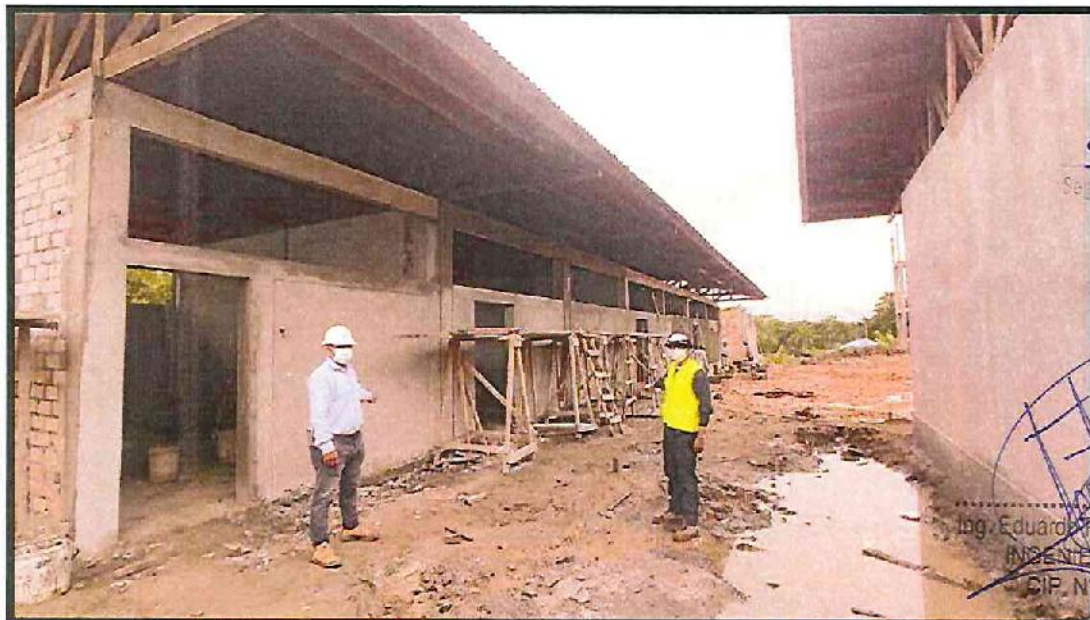


TARRAJEO EXTERIOR Y DERRAMES EN MODULO 2

  
Segundo Michel Gozales Cuzco  
Representante Común  
CONSORCIO LAGUNAS


  
Ing. Eduardo Francia Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 55689




"MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR N° 62056 DE VILLA LAGUNAS – LAGUNAS – ALTO AMAZÓNAS – LORETO"

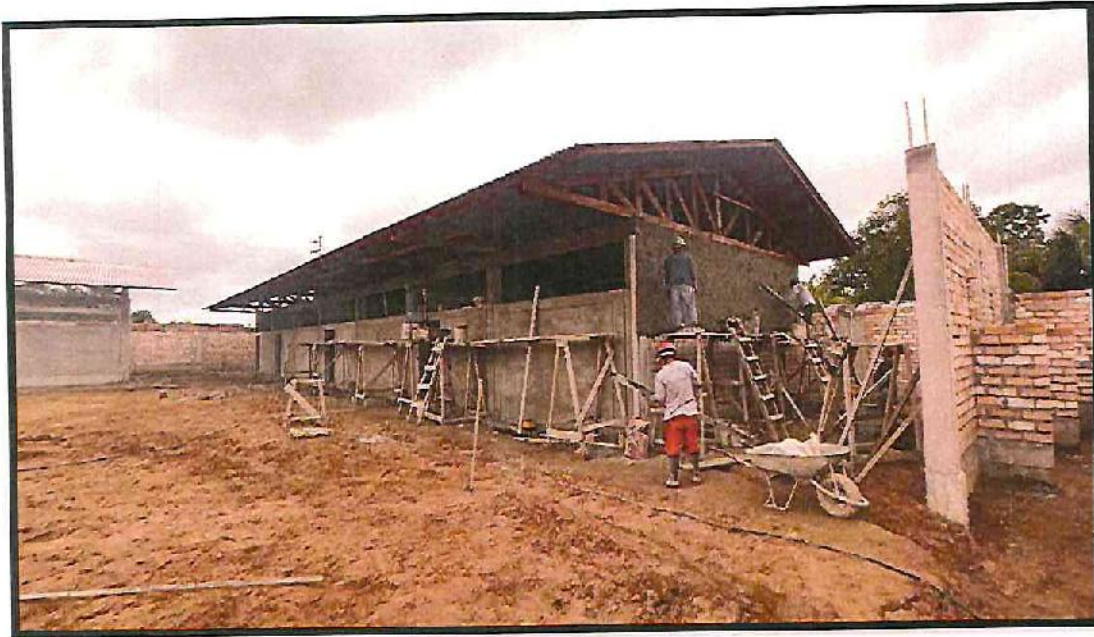


TARRAJEO EXTERIOR Y DERRAMES EN MODULO 2

  
Alfredo Ricardo Marmolejo Cucho  
ING. CIVIL  
CIP N° 43 801

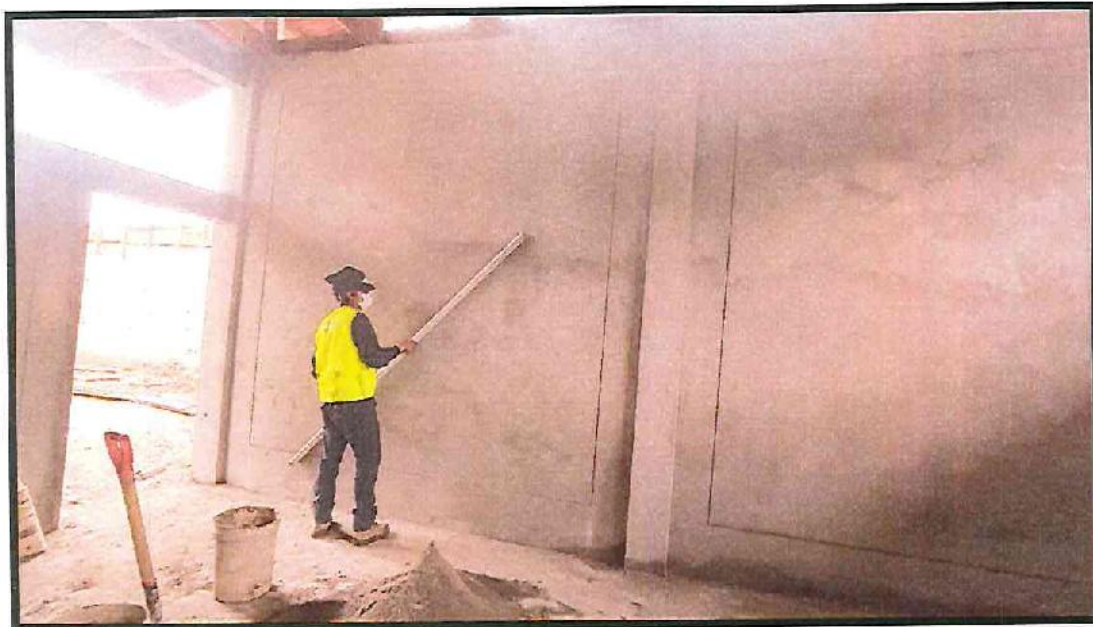

VERIFICACIÓN DEL TARRAJEO INTERIOR POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

  
Segundo Michel González  
Representante Comunal  
CONSORCIO LAGUNAS

  
Ing. Eduardo Anselmi Vasquez  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 55689
