



# VALORIZACION

## N.º 5

000014



**BECERRA HNOS.**

Contratistas Generales S.A.C



## **CONSORCIO ITAYA**

### **PANEL FOTOGRÁFICO**



Instalaciones Sanitarias Jr. Itaya



Instalaciones Sanitarias Jr. Itaya.

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
CIP N° 51521

URB. FRANCISCO BOLOGNESI D-8 - IQUITOS  
Tel. 065 260379

E-mail: [mgamazonicaeir@gmail.com](mailto:mgamazonicaeir@gmail.com)  
Cel. 941 443 342

  
Angulo Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

000013



**BECERRA HNOS.**  
Contratistas Generales S.A.C



## CONSORCIO ITAYA



Instalación de Tuberías Jr. Itaya



Armadura de canal Pluvial

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
CIP N° 51521

URB. FRANCISCO BOLOGNESI D-8 - IQUITOS  
Tel. 065 260379

E-mail: [mgamazonicaeirl@gmail.com](mailto:mgamazonicaeirl@gmail.com)  
Cel. 941 443 342

  
CIP, Emigdio Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047



**BECERRA HNOS.**  
Contratistas Generales S.A.C



## CONSORCIO ITAYA




canal De Evacuación pluvial Jr. itaya



Elevación de Cuellos de Buzones – Jr. Itaya

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

ING. JOSÉ CARLOS GOMEZ MEGO  
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA  
CIP N° 51521

  
Ing. CIP. Emerio Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
Mag. del Colegio de Ingenieros N° 74047

**URB. FRANCISCO BOLOGNESI D-8 - IQUITOS**  
Tel. 065 260379

**E-mail: mgamazonicaeir@gmail.com**  
**Cel. 941 443 342**



**BECERRA HNOS.**

Contratistas Generales S.A.C



## CONSORCIO ITAYA



Elevación de Cuellos de Buzones – Jr. Itaya



Muro de contención calle unión

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
CIP N° 51521

Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

**URB. FRANCISCO BOLOGNESI D-8 - IQUITOS**  
Tel. 065 260379

**E-mail: mgamazonicaeirl@gmail.com**  
**Cel. 941 443 342**



**BECERRA HNOS.**

Contratistas Generales S.A.C



## CONSORCIO ITAYA




PREPARACION DE SOLADOS DE CANAL PLUVIAL JR ITAYA



Verificacion de trabajos de canales pluviales Av. Participación/Jr. itaya

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

ING. JOSÉ CARLOS GOMEZ MEGO  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
CIP N° 51521

  
CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

URB. FRANCISCO BOLOGNESI D-8 - IQUITOS  
Tel. 065 260379

E-mail: mgamazonicaeirl@gmail.com  
Cel. 941 443 342



**BECERRA HNOS.**

**Contratistas Generales S.A.C**



**CONSORCIO ITAYA**



**RELLENOS CON MATERIAL GRANULAR CALLE ITAYA**



**RELLENOS CON MATERIAL GRANULAR CALLE UNION**

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

ING. JOSÉ CARLOS GOMEZ MEGO  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
CIP N° 61521

Ing. CIP, Emigdio Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

**URB. FRANCISCO BOLOGNESI D-8 - IQUITOS**  
Tel. 065 260379

**E-mail: mgamazonicaeirl@gmail.com**  
**Cel. 941 443 342**



**BECERRA HNOS.**  
Contratistas Generales S.A.C



## CONSORCIO ITAYA



Canales pluviales calle unión



CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

ING. JOSÉ CARLOS GOMEZ MEGO  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
CIP N° 51521

  
Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR EN CANAL PLUVIAL CA. HUASCAR

URB. FRANCISCO BOLOGNESI D-8 - IQUITOS  
Tel. 065 260379

E-mail: [mgamazonicaeirl@gmail.com](mailto:mgamazonicaeirl@gmail.com)  
Cel. 941 443 342



000007



**BECERRA HNOS.**

Contratistas Generales S.A.C



**CONSORCIO ITAYA**



VACEO DE LOSA DE INFERIOR CANAL PLUVIAL CALLE UNION



DERRAMES Y ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR CALLE HUASCAR

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
RIP N° 51521

  
Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

URB. FRANCISCO BOLOGNESI D-8 - IQUITOS  
Tel. 065 260379

E-mail: [mgamazonicaeirl@gmail.com](mailto:mgamazonicaeirl@gmail.com)  
Cel. 941 443 342




"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Belén, 11 de diciembre de 2020

Oficio n. 2312-2020-GRL/GRI/SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente



Asunto: Conformidad de Valorización N°5 de  
Obra noviembre de 2020.

Obra: "Mejoramiento del Jr. Itaya (Av. Participación / Calle Amazonas) y calle Unión (Jr. Itaya/ Calle Huáscar) A.A.HH Manco Inca Belén -Maynas -Loreto".

Ref.: a. Informe N°155-2020-GRL-GRI-SGSyC-KAMC  
b. Carta N°024-2020-CSB-GRL/JSO-JCGM

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización n° 05, por ejecución de obra**, que asciende a la suma **S/. 181,923.98soles, (Ciento Ochenta y un mil novecientos veintitrés con 98/100 soles) sin IGV**, presentado por el supervisor de la obra y su conformidad mediante la referencia b), **correspondiente a noviembre de 2020**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 02	S/	253,265.72
Reajuste neto	S/	00,000.00
Amortización Adelanto Directo	S/	00,000.00
Amortización adelanto por materiales	S/	71,341.74
Deduc. Reaj. que no corresponde A/D	S/	0.00
Deduc. Reaj. Que no corresponde A/M	S/	0.00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/.</b>	<b>181,923.98</b>

Asimismo, la obra a noviembre de 2020 tiene un avance físico acumulado del 34.58%, versus el calendario programado de 25.13%, siendo el estado de la obra adelantada y en ejecución.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta el Inspector, se solicita continuar con el trámite respectivo **a favor de Consorcio ITAYA**. Adjuntando la Factura Electrónica E001-59

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Ing. RAÚL FLORES AQUEPUCHO  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: Coordinador de Obra  
Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar  
SGSyC – File de obra (01)  
SGSyC – File correlativo (01)  
SGSyC – File personal (01)

RFA/dap  
Tramite: 37206



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

**INFORME N°155-2020-GRL/GRI/SGSyC/KAMC**



AL : **Ing. Raúl Flores Aquepucho**  
Sub Gerente de Supervisión y Control.

DE : **Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar**  
Coordinador de Obra

ASUNTO : **Remito informe respecto a Valorización N° 05 – noviembre- 2020 de la Obra:**  
"Mejoramiento del Jr. Itaya (av. Participación / Calle Amazonas) y calle Unión (jr. Itaya / calle Huáscar) aa. hh manco inca Belén - Maynas – Loreto

Ejecuta: **CONSORCIO ITAYA**  
Supervisa: **CONSORCIO SUPERVISOR BELEN.**

REFERENCIA: a) Carta N°024/2020-CSB-GRL  
B Informe N°011/2020-CSB-GRL/JSO-JCGM

FECHA : **Iquitos, 11 de diciembre de 2020.**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentación presentada por el **SUPERVISOR** de obra referente a la **Valorización de Obra N°05, correspondiente al mes de noviembre del 2020**, que mediante Proveído N°37206 de la SGSyC, se solicita su revisión, evaluación e informe correspondiente.

**GENERALIDADES:**

**1.1 DE LA OBRA**

- 1.- Obra : "MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y DE LA CALLE UNION (JR. ITAYA/CA. HUASCAR) DL AAHH. MANCO INCA, DISTRITO BELEN, PROVINCIA MAYNAS, REGION LORETO".
- 2.- Ubicación :
  - Distrito : **Belén**
  - Provincia : **Maynas**
  - Departamento : **Loreto**
- 3.- Financiamiento : **Recursos Ordinarios.**
- 4.- Modalidad de Concurso : **Licitación Pública**
- 5.- Sistema de Contratación : **A precios unitarios**
- 6.- Modalidad de Ejecución : **Por Contrata**
- 7.- Fecha de Concurso : **14 de enero del 2020**
- 8.- Contratista : **CONSORCIO ITAYA**

**1.2 DE LA SUPERVISION**

- 1. Tipo de Proceso : **Concurso Publico N° 009-2019-CSO-GRL**
- 2. Consultor Supervisor : **CONSORCIO SUPERVISOR BELEN.**



**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"**

3. Jefe de Supervisión : **ING. CIVIL JOSE CARLOS GOMEZ MEGO.**  
4. Contrato : **Contrato de Consultoría de Obra N° 013-2020-GRL-GGR-GRI**  
5. Fecha del Contrato : **12 de febrero del 2020**  
6. Monto del Contrato : **S/. 358,148.00 Soles, Sin IGV**  
7. Plazo Contractual del Servicio: **270 Días Calendario**  
8. Modalidad del Contrato : **A Suma Alzada**

**1.3 DEL CONTRATISTA**

1. Tipo de Proceso : **Licitación Publica N° 006-2019-CSO-GRL (Primera Convocatoria).**  
2. Fecha de Concurso : **14 de enero del 2020**  
3. Contrato : **N° 016-2020-GRL-GGR-GRI.**  
4. Contratista : **CONSORCIO ITAYA.**  
5. Fecha de Suscrip. Contrato : **20 de febrero del 2020**  
6. Rep. Común del Contratista : **Abelardo Ríos Isern**  
7. Residente de Obra : **Ing. Civil Emigdio Hidalgo Zevallos CIP N° 74047**  
8. Monto Contratado : **S/. S/. 4'756,116.28 Soles, Sin Inc. IGV**  
9. Fecha de presupuesto Exp. Técnico : **Febrero del 2020**  
10. Aprobación del expediente técnico : **R. G. G.R N° 268-2019-GRL-GGR (22/05/2019)**  
11. Acta Entrega Terreno/P/Ejec. Obra : **06 de marzo del 2020.**  
12. Adelanto Directo Total :  
13. Fecha Adelanto Directo :  
14. Adelanto de Materiales : **En Tramite**  
15. Fecha Adelanto de Materiales : **En Tramite**  
16. fecha de Inicio del Plazo Contractual : **07 de marzo de 2020.**  
17. Plazo de Ejecución de Obra : **240 Días Calendarios**  
18. Fecha de Término del Plazo Contractual : **01 de noviembre de 2020**  
19. %Avance Físico al mes : **5.325 %.**  
20. %Avance Físico Acumulado : **34.577 %.**  
21. %Avance Programado al mes : **14.77 %.**  
22. %Avance Programado Acumulado : **25.13 %.**  
23. Situación Actual de la Obra : **En Ejecución Adelantada.**

**1.3 DEL COORDINADOR**

Coordinador : **Ing.kenyo Alberto Montes Cuellar**

**1). ANTECEDENTES**

- El 14 de enero de 2020, el comité de selección adjudico la buena pro de la LICITACIÓN PUBLICA N° 006-2019-CSO-GRL, para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y LA CALLE UNION (JR. ITAYA / CA. HUSCAR) DL AA.HH. MANCO INCA, DEL DSTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO".



**“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”**

- El 20 de febrero del 2020 se firmó el Contrato de Ejecución de Obra N° 016-2020-GRL-GGR-GRI, entre la empresa contratista **CONSORCIO ITAYA** y el **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**, fijándose en dicho documento las cláusulas contractuales y legales para la ejecución de la obra **“MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y LA CALLE UNION (JR. ITAYA / CA. HUSCAR) DL AA.HH. MANCO INCA, DEL DSTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO”**.
- Con 06 de marzo de 2020 se procedió a realizar **EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**, a cargo del Gobierno Regional de Loreto.
- Con fecha 07 de marzo de 2020 se dio inicio al plazo contractual de la ejecución de obra, hasta el 01 de noviembre de 2020. Ejecutando las partidas de Obras Provisionales, Trabajos Preliminares y Seguridad y Salud.
- **Mediante Carta N°035/2020/CI** (04 de diciembre del 2020), el Contratista presenta al Supervisor la Valorización de Ejecución de Obra N° 05, correspondiente al mes de noviembre 2020, en la cual hace de conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:
  1. Copia de Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
  2. Copia de Contrato de Obra
  3. Copia del Acta de Entrega de Terreno.

**DOCUMENTACIÓN TECNICA:**

1. Copia de Contrato de Consorcio
2. Copia de comprobantes de pago emitidos por la Oficina de Ejecutiva de Tesorería y Documento que sustente la transferencia electrónica de fondos a la cuenta del Proveedor:
  - Adelantos Directos
  - Adelantos de Material
3. Cuadro de Resumen de pagos y Amortizaciones de los adelantos a la fecha valorizada de corresponder, visado por el supervisor o inspector
4. Copia de la Fórmula Polinómica del expediente Técnico
5. Calendario Actualizado del Programa de Valorización
6. Documento que acredite el control de calidad de las partidas Valorizadas en el mes
7. Certificado y/o reporte que acredite la habilidad vigente del residente
8. Pagos de Tributos del mes Valorizado:
  - SENCICO
  - ES-SALUD
  - ONP y/o AFP
  - SCTR
  - CONAFOVICER
  - Copia de Plantilla de Jornales



**“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”**

- Copia de Declaración PDT-SUNAT
  - Copia de RNP
9. Copia visada de Cuaderno de Obra
  10. Relación técnica del personal de acuerdo a la propuesta de las especialidades y el porcentaje de participación
  11. Panel Fotográfico
  12. Expediente de Valorización
  13. Factura Electrónica
  14. Informe de conformidad de Valorización emitida por la Subgerencia de Supervisión y Control
  15. Copia de Cartas Fianza Vigentes

**DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

1. Certificado de habilidad
2. Copia de cartas fianzas
  - a. Fiel cumplimiento
3. Copia de calendario de obra vigente

**1. ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA**

Según Asiento del cuaderno de obra **N°228** de fecha 30/11/2020, anotada por el residente, donde indica los Metrados ejecutados en el periodo, correspondiente a la valorización para su REVISION y CONFORMIDAD por parte del Supervisor con la finalidad de elaborar el informe de Valorización N°05.

Asiento del cuaderno de obra **N° 229** de fecha 30/11/2020, el Supervisor de obra, indica de los trabajos ejecutados por el contratista. Así mismo, manifiesta que da conformidad a los Metrados correspondientes del 01 al 30 de noviembre del 2020 y autoriza la elaboración de la valorización de obra N°05 correspondiente al mes de noviembre del 2020. Revisando

**CONTROL ECONÓMICO**

**- Presupuesto de Obra.**

Val. N05- OBRA: “MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y LA CALLE UNION (JR. ITAYA / CA. HUSCAR) DL AA.HH. MANCO INCA, DEL DSTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO”	
Total del Costo Directo Resumen	S/. 4,153,813.34
Gastos Generales (8 %)	S/. 332,305.07
Utilidad (6.5 %)	S/. 269,997.87
<b>Total Presupuesto de Infraestructura</b>	<b>S/. 4,756,116.28</b>
<b>IGV (18%)</b>	<b>0.00</b>
<b>Presupuesto Total</b>	<b>S/. 4,756,116.28</b>



**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"**

**2. CONTROL DE AVANCE DE OBRA**

OBRA	"MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYACA. HUASCAR) DEL AAHH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO"		
PROPIETARIO	A Precios Unitarios		
CONTRATISTA	CONSORCIO ITAYA		
FECHA PTO. REFERENCIAL	FEB. 2019		
PRESUP. REFERENCIAL	S/. 4,776,885.34	sin IGV	
PRESUP. OFERTADO	S/. 4,756,116.28	sin IGV	

HOJA DE LIQUIDACION			
1. VALORIZACION N° 05 - Noviembre 2020			
<u>Monto Bruto</u>		( a )	253,265.72
<u>Amortización</u>			
Adelanto Directo (10.00%)	-		
Adelanto por Materiales (Según D.S. N° 079-VC, Ampliatorias y Modificadorias)	71,341.74		
	<u>71,341.74</u>		<b>181,923.98</b>
2. REAJUSTES DE LA VALORIZACION N° 05			
<u>Monto Bruto</u>		( b )	-
Deducción de reajuste que no corresponde			
- Del adelanto directo	-		
- Del adelanto por materiales	-	( 'b )	-
	<u>-</u>		<b>-</b>
3. REGULARIZACION DE REAJUSTE VAL. N° 05			
<u>Monto Bruto</u>		( c )	-
Deducción de reajuste que no corresponde			
- Del adelanto directo	-		
- Del adelanto por materiales	-	( 'c )	-
	<u>-</u>		<b>-</b>
4. TOTAL A PAGAR			
	181,923.98	2'1) Valorización N° 05	
	<u>-</u>	Deducción de reajuste que no corresponde	
	<b>181,923.98</b>	<b>4) TOTAL A PAGAR</b>	
5. SENCICO			
( (a)+(b)+(c) )	<b>181,923.98</b>	x 2/1000	<b>S/. 363.85</b>

DE ACUERDO AL D.S. N°006-88-VC (12-05-88); Art. 2 ESTABLECE QUE LA FIRMA CONTRATISTA TIENE OBLIGACION DE ACREDITAR PREVIAMENTE ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE SUS APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL PARA DAR PASE A SU CANCELACION (Art. 4 D.L. 20024 de fecha 22-05-73)

M




“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

### 3. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA

Obra : MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACIÓN / CA. AMAZÓNAS) Y CALLE UNIÓN (JR. ITAYA /CA. HUASCAR) DEL AA.HH MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELÉN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO  
Ubicación : DISTRITO DE DE BELÉN - PROVINCIA DE - MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

FECHA	PRESUPUESTO OBRA				PRESUPUESTO VALORIZADO				AVANCE / ATRAZO		
	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	%	% ACUM	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	%	% ACUM	RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO		
INICIO	INICIO								%	DESCRIP	
		0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
VAL N° 01	MARZO 2020	8,537.83	8,537.83	0.18%	0.18%	8,537.83	8,537.83	0.18%	0.18%	0.00%	ADELANTADO
VAL N° 02	AGOSTO 2020	17,283.74	25,821.57	0.36%	0.54%	600,687.78	609,225.61	12.83%	12.81%	12.27%	ADELANTADO
VAL N° 03	SEPTIEMBRE 2020	202,326.57	228,148.14	4.25%	4.80%	336,248.70	945,474.31	7.07%	19.88%	15.08%	ADELANTADO
VAL N° 04	OCTUBRE 2020	264,144.79	492,292.93	5.55%	10.35%	445,531.89	1,391,006.20	9.37%	29.25%	18.90%	ADELANTADO
VAL N° 05	NOVIEMBRE 2020	702,682.11	1,194,975.04	14.77%	25.13%	253,265.72	1,644,271.92	5.33%	34.57%	9.45%	TRAMITE
VAL N° 06	DICIEMBRE 2020	1,118,987.82	2,313,962.86	23.53%	48.65%						
VAL N° 07	ENERO 2021	1,228,833.85	3,542,796.71	25.84%	74.49%						
VAL N° 08	FEBRERO 2021	681,368.10	4,224,164.81	14.33%	88.82%						
VAL N° 09	MARZO 2021	347,600.59	4,571,765.40	7.31%	96.12%						
VAL N° 10	ABRIL 2021	184,330.88	4,756,116.28	3.88%	100.00%						
<b>TOTAL</b>		<b>4,756,116.28</b>		<b>100.00%</b>		<b>1,644,271.92</b>					

GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO VS EJECUTADO

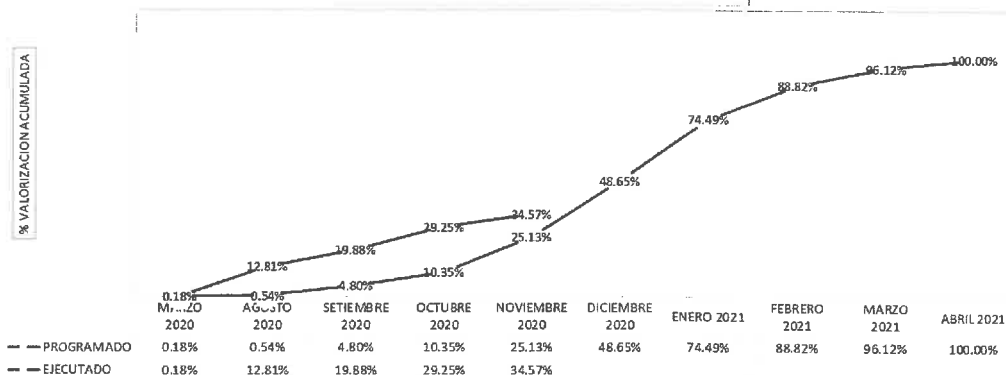

### 4. CONCLUSIONES:

- La presente documentación materia de su revisión, consta con los requerimientos y sustentos que derivan a la presente valorización descritos en el ítem 3. Contenido de la Documentación.
- En la documentación, se adjuntan las boletas de pagos realizados a **SENCICO**, **CONAFOVICER**, de acuerdo al porcentaje que estima la legislación vigente, pago de póliza **SCTR**.





**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"**

- El avance físico del mes es:
 

- Avance Físico del mes (noviembre -2020) .....	5.325 %
- Avance Físico Acumulado.....	34.58 %
- Avance Físico Prog del mes.....	14,77 %
- Avance Físico Prog.acum.....	25.13 %

**La obra en mención tiene un avance físico mensual acumulado al mes de noviembre de 2020 de 34.58 %, siendo el estado de la obra ADELANTADA.**

**5. RECOMENDACIONES:**

- *El Supervisor indica que la obra en mención tiene un avance físico mensual del 5.33% y un acumulado de 34.58 % de su avance EJECUTADO con un avance programado acumulado de 25.13%, por lo que la obra, se encuentra adelantada.*
- *Los metrados han sido conciliados por el Residente y Supervisor de Obra por lo mismo que Da Conformidad a la Valorización N°05 (Mediante la Carta N°024/2020-CSB-GRL, cuyos metrados fueron autorizados mediante el asiento del cuaderno de obra N°179 – Del Supervisor), de la obra "MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y LA CALLE UNION (JR. ITAYA / CA. HUSCAR) DL AA.HH. MANCO INCA, DEL DSTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO".*
- *Visto la Carta N°024/2020-CSB-GRL de la Valorización N°05 correspondiente al mes de octubre del 2020 y dado la conformidad por el Supervisor de obras, por el monto de s/ 181,923.98 (Ciento ochenta y un mil novecientos veintitrés 98/100 soles) sin IGV, a la empresa CONSORCIO Itaya, teniendo el siguiente detalle:*

1 Valorización N°05 noviembre del 2020	S/. 253,265.72
2 Reajuste y Reintegros	S/. 0.00
3 Amortización de Adelanto Directo	S/. 0.00
4 Amortización de Adelanto para Materiales	S/. 71,341.74
<b>5 Neto Facturar</b>	<b>S/. 181,923.98</b>

- *Se recomienda derivar la presente documentación, a la Gerencia Regional de Infraestructura, previa revisión considerando que ya ha sido dada la conformidad por parte del Supervisor , cabe indicar que dicha valorización fue presentada por el Supervisor el 07-12-2020 ,por lo que ha presentado en el plazo correspondiente; además se recomienda continuar con su trámite correspondiente cumpliendo con los plazos establecidos en el Art.194 Valorizaciones y Metrados de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento modificada por el Decreto Legislativo N°1444 y aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF respectivamente.*



**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"**

*Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.*

*Atentamente*

KENYO ALBERTO  
MONTES CUELLAR  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP N° 195722

Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR  
*Coordinador de Obra*  
*Sub Gerencia de Supervisión y Control*

Cc: Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar

Trámite: 37206

297

Gobierno Regional de Loreto  
 Gerencia Regional de Infraestructura  
 Sub Gerencia de Supervisión y Control  
 09 DIC 2020  
 Fecha: 37206 Hora: 9:49am  
 N° Reg: 4

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

Iquitos, 07 DIC 2020

CARTA N° 024-2020-CSB-GRI  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 07 DIC 2020  
 Hora: 2:58 pm Firma: [Firma]  
 Reg. N°

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 OFICINA DE DEP. DOCUMENTARIA  
 UNIDAD DE DEP. DOCUMENTARIO  
 37206  
 07 DIC 2020  
 Hora: Fecha:  
 CONTROL RECEPCION

Señores:  
 Gobierno Regional de Loreto  
 Av. Abelardo Quiñones Km 1.5 – Belén  
 Atención.-  
 Gerencia Regional de Infraestructura  
 Sub Gerencia de Supervisión y Control

- ASUNTO : Aprobación y Remisión de VALORIZACION DE OBRA N° 05 - Obra: “Mejoramiento del Jr. Itaya [Av. Participación / Ca. Amazonas] y la Calle Unión [Jr. Itaya / Ca. Huáscar] del AA.HH Manco Inca, del Distrito de Belén – Maynas - Loreto”
- REFERENCIA : A) Informe N° 011-2020-CSB/JSO-JCGM  
 B) Contrato N° 013-2020-GRL-GGR-GRI – Contratación de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: “Mejoramiento del Jr. Itaya [Av. Participación / Ca. Amazonas] y la Calle Unión [Jr. Itaya / Ca. Huáscar] del AA.HH Manco Inca, del Distrito de Belén – Maynas - Loreto”

De mi mayor consideración:

Mediante la presente me dirijo a Usted, con la finalidad de saludarle y a la vez remitir a su despacho la VALORIZACION DE OBRA N° 05 NOVIEMBRE 2020 de la obra mencionada en el asunto, en vista que esta ha sido aprobada por nuestra representada a través del Jefe de Supervisión de Obra según el informe de la referencia A], el mismo que corresponde a un monto de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 05 NOVIEMBRE 2020		
a)	Valorización de Obra N° 05	S/ 253,265.72
b)	Reajustes y Reintegros	S/ 0.00
c)	Amortización por Adelanto Directo	S/ 0.00
d)	Amortización por Adelanto de Materiales	S/ [71,341.74]
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>		<b>S/ 181,923.98</b>

Cabe resaltar que dicha Remisión y Aprobación de la Valorización de obra en mención, es en virtud al cumplimiento de los Términos de Referencia para la ejecución del Servicio de Consultoría de Obra – Supervisión de Obra, mencionada en la referencia B); y al artículo 194, numeral 194.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que deberá ser cancelada de conformidad con el artículo mencionado precedentemente.

Sin otro particular me despido de Usted no sin antes agradecerle su atención a la presente.

Atentamente.

CONSORCIO SUPERVISOR BELÉN  
 SR. JORGE CAMILO RUÍZ ROJAS  
 REPRESENTANTE COMÚN

PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATISTA CONTRATADO  
 PRESUPUESTO CONTRATADO  
 DEDUCTIVO  
 ADICIONAL MORTO CONTRACTUAL

OBRA

"MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYA/CA. HUASCAR) DEL AAHH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO"

Region Loreto  
 Provincia MAYNAS  
 Distrito BELEN

SI. 4,756,116.28

SI. 0.00

SI. 4,756,116.28

SI. 0.00

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

Supervisor  
 Residente

ING. JOSE CARLOS GOMEZ MIEGO  
 ING. EMIGDIO HIDALGO ZEVALLOS

**VALORIZACION MENSUAL N° 05  
 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2020**

02-Nov-20

Fecha de Inicio de Obra  
 Plazo de Ejecucion  
 1ª Paralización  
 2ª Paralización  
 3ª Paralización  
 Fecha de Terminó de Obra Inicial  
 Fecha de Terminó Contractual

07-Mar-20  
 240 DIAS

ITEM	PRESUPUESTO			PARCIAL		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	UND	METRADO	P. UND	SI.	SI.	Mezrado	Valorizado	Mezrado	Valorizado	Mezrado	Valorizado	Mezrado	Valorizado
01	und	2.00	1,716.30	3,432.60	1,716.30	1.00	1,716.30	0.00	0.00	1.00	1,716.30	1.00	1,716.30
01.01	mes	8.00	1,000.00	8,000.00	3.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4.00	4,000.00	4.00	4,000.00
01.02	ton	534.24	30.00	16,027.20	247.50	7,425.00	1,800.00	60.00	60.00	307.50	9,225.00	228.74	8,802.20
01.04	und	2.00	1,635.63	3,271.26	1.00	1,635.63	0.00	0.00	0.00	1.00	1,635.63	1.00	1,635.63
01.05	vie	2.00	800.00	1,600.00	1.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1.00	800.00	1.00	800.00
02	m2	5,421.42	0.55	2,981.78	2,354.30	2,354.30	189.40	308.00	189.40	2,662.30	1,464.27	2,756.12	1,517.61
02.01	m2	5,421.42	1.46	7,861.06	5,421.42	5,421.42	0.00	0.00	0.00	5,421.42	7,861.06	0.00	0.00
02.02	m3	299.36	69.62	17,847.84	278.92	16,629.21	0.00	0.00	0.00	278.92	16,629.21	20.44	1,218.63
02.04	m2	797.79	17.57	14,017.17	360.94	6,341.72	53.06	3.02	3.02	363.96	6,394.78	433.83	7,622.59
02.05	m2	5.00	423.01	2,115.05	5.00	2,115.05	0.00	0.00	0.00	5.00	2,115.05	0.00	0.00
02.06	m2	1,604.27	66.10	97,927.98	587.70	38,256.94	0.00	0.00	0.00	587.70	38,256.94	0.00	0.00
02.07	und	5.00	3,500.00	17,500.00	5.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	5.00	17,500.00	0.00	0.00
02.08	und	5.00	2,500.00	12,500.00	5.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	5.00	12,500.00	0.00	0.00
03	m3	1,522.46	16.10	24,511.61	1,480.76	23,840.24	0.00	0.00	0.00	1,480.76	23,840.24	41.70	671.37
03.01	m3	6,361.04	12.34	78,496.23	3,694.27	45,897.29	1,328.97	0.00	0.00	5,023.24	61,986.78	1,337.80	16,508.46
03.01.03	m3	195.75	38.75	7,585.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.75	7,585.31
03.01.04	m3	32.41	38.75	1,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.61	604.89
03.01.05	m3	188.76	38.75	7,314.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.76	7,314.46
03.02	m2	2,425.65	3.22	7,810.59	261.00	840.42	0.00	0.00	0.00	261.00	840.42	0.00	0.00
03.02.01	m2	454.30	8.00	3,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.30	3,634.40
03.02.02	m2	41.2	8	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20	329.60
03.02.03	m2	38.81	7.43	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	288.36
03.02.04	m2	1,560.77	7.43	11,566.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.77	11,566.62
03.03	m3	1044.85	54.48	56,923.43	812.25	44,251.38	0.00	0.00	0.00	812.25	44,251.38	232.60	12,672.05
03.03.01	m3	6,561.07	55.73	365,648.43	1,848.02	102,990.15	283.03	15,773.26	15,773.26	2,131.05	118,763.42	4,430.02	246,865.01
03.03.02	m3	366.18	74.56	27,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.18	27,302.38
03.03.03	m3	17.26	48.55	837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	22.33
03.03.04	m3	3.88	74.56	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	289.28
03.03.05	m3	176.81	74.56	13,182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.81	13,182.95
03.03.06	m3	421.84	30.81	12,998.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.84	12,998.89
03.04	m3	9,513.35	17.77	169,052.23	5,244.18	93,189.10	1,584.76	28,338.89	28,338.89	6,838.94	121,527.98	2,674.41	47,524.25
04	m2	930.42	38.70	36,007.25	930.42	36,007.33	0.00	0.00	0.00	930.42	36,007.33	0.00	0.00
04.01	kg	8,652.76	5.57	48,251.57	6,554.93	36,510.96	11,740.61	0.00	0.00	8,662.78	48,251.57	0.00	0.00
04.02	kg	2,925.87	5.73	16,854.24	2,184.43	12,516.78	0.00	0.00	0.00	2,184.43	12,516.78	0.00	0.00
04.02.01	kg	5,619.58	6.44	36,183.63	5,068.54	32,642.04	0.00	0.00	0.00	5,068.54	32,642.04	0.00	0.00
04.02.02	m2	311.45	38.28	11,922.31	311.45	11,922.38	0.00	0.00	0.00	311.45	11,922.38	0.00	0.00

**CONSORCIO ITAYA**  
**ABELARDO RIOS ISERN**  
 Representante legal

**ING. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Coloprof. N° 51,511

**ING. JOSÉ CARLOS GOMEZ MIEGO**  
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA  
 C.P.B. N° 51,511

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATISTA  
 PRESUPUESTO CONTRATADO  
 DEDUCTIVO ADICIONAL MONTO CONTRACTUAL

SI, 4,756,116.28  
 SI, 0.00  
 SI, 0.00  
 SI, 4,756,116.28

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYA/CA. HUASCAR) DEL AAHH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO"

Region: LORETO  
 Provincia: MAYNAS  
 Distrito: BELEN  
 Fecha de Inicio de Obra: 07-Mar-20  
 Plazo de Ejecucion: 240 DIAS

1\* Finalización  
 2\* Finalización  
 3\* Finalización

Supervisor: ING. JOSE CARLOS GOMEZ MEGO  
 Residente: ING. EMIGDIO HIDALGO ZEVALLOS

**VALORIZACION MENSUAL N° 05**  
**AL 30 NOVIEMBRE DEL 2020**

02-Nov-20

ITEM	UNID	METRADO	PREPUESTO		PARCIAL	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			M	P. UNID		Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
04.02.05	m3	332	553.32	183,702.24	332.00	183,700.03	0.00	0.00	0.00	183,700.03	0.00	0.00	2.21
04.02.06	kg	6,738.33	5.57	37,532.50	6,738.33	37,532.50	0.00	0.00	6,738.33	37,532.50	0.00	0.00	0.00
04.02.07	kg	7,447.68	5.73	42,675.21	1,936.47	11,095.97	0.00	0.00	1,936.47	11,095.97	0.00	5,611.21	31,579.24
04.02.08	kg	4,101.82	6.44	26,414.43	3,686.07	23,731.85	0.00	0.00	3,686.07	23,731.85	0.00	416.56	2,682.98
04.02.09	m2	1,080.32	88.65	74,850.47	918.28	63,107.20	0.00	0.00	918.28	63,107.20	0.00	171.08	11,743.27
04.02.10	m2	1,094.20	46.18	50,530.16	934.35	43,148.28	0.00	0.00	934.35	50,530.16	0.00	0.00	0.00
04.02.11	m3	228.93	563.32	128,671.55	190.04	105,162.93	0.00	0.00	190.04	128,671.55	0.00	0.00	0.00
04.02.12	m	440.55	23.23	10,233.96	101.21	2,351.11	0.00	0.00	101.21	2,351.11	0.00	0.00	0.00
04.02.13	m	1,048.01	5.39	5,648.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.34	7,882.87
04.02.14	m	1,094.20	4.75	5,197.45	940.59	4,467.80	0.00	0.00	940.59	4,467.80	0.00	1,048.01	5,648.77
04.03.01	m	527.64	163.85	86,486.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.64	86,486.58
04.03.02	und	176	33.95	5,976.96	176.00	5,976.96	0.00	0.00	176.00	5,976.96	0.00	0.00	0.00
05.01													
05.01.01	m3	494.65	73.99	36,599.15	52.20	3,862.28	0.00	0.00	52.20	3,862.28	0.00	-52.20	32,736.87
05.01.02	m2	2,425.65	34.25	83,078.61	281.00	8,939.25	0.00	0.00	281.00	8,939.25	0.00	233.65	74,139.26
05.01.03	m2	405.68	38.28	15,529.81	25.02	957.77	0.00	0.00	25.02	957.77	0.00	2,400.63	14,572.04
05.01.04	m3	490.33	553.32	271,308.40	52.20	28,863.30	0.00	0.00	52.20	28,863.30	0.00	2,873.45	24,426.10
05.01.05	m2	2,425.65	4.75	11,521.84	281.00	1,239.75	0.00	0.00	281.00	1,239.75	0.00	164.65	10,282.08
05.01.06	m	491	7.82	3,841.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.88	2,955.93
05.01.07	m	484.02	7.82	3,781.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	3,741.42
05.01.08	m	1,501.61	9.19	13,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.02	3,688.23
05.01.09	m	752.4	8.59	6,420.82	57.60	494.78	0.00	0.00	57.60	494.78	0.00	724.80	13,799.80
05.01.10	kg	981.03	5.96	5,846.94	66.00	393.36	0.00	0.00	66.00	393.36	0.00	915.03	6,226.04
05.01.11	kg	343.74	5.13	1,763.39	91.80	470.93	0.00	0.00	91.80	470.93	0.00	251.84	5,453.59
05.01.12	und	652.00	6.79	4,427.08	48.00	325.92	0.00	0.00	48.00	325.92	0.00	604.00	1,292.46
05.01.13													
06													
06.01													
06.01.01													
06.01.01.01	m2	1,050.68	38.70	40,661.32	188.45	7,293.02	0.00	0.00	188.45	7,293.02	0.00	4,897.87	28,470.43
06.01.01.01.01	kg	7,366.60	5.57	41,031.96	1,214.20	6,763.08	0.00	0.00	1,214.20	6,763.08	0.00	5,376.31	29,946.04
06.01.01.01.03	kg	12,079.45	5.73	68,215.25	3,142.88	18,068.70	0.00	0.00	3,142.88	18,068.70	0.00	7,918.52	49,236.52
06.01.01.01.04	m3	210.14	663.32	116,274.68	28.78	15,924.55	0.00	0.00	28.78	15,924.55	0.00	161.31	89,258.04
06.01.01.01.05	m	37.42	23.23	869.27	33.40	776.88	0.00	0.00	33.40	776.88	0.00	4.02	93.39
06.01.01.01.06	m2	1,050.68	5.16	5,421.51	168.85	870.23	0.00	0.00	168.85	870.23	0.00	779.10	4,020.16
06.01.01.02													
06.01.01.02.01	m2	3,364.06	38.28	128,776.22	384.57	14,721.34	0.00	0.00	384.57	14,721.34	0.00	2,736.89	104,760.43
06.01.01.02.02	kg	21,428.94	5.57	119,359.20	1,160.00	6,461.20	0.00	0.00	1,160.00	6,461.20	0.00	19,687.40	103,877.42
06.01.01.02.03	m3	217.21	553.32	120,188.64	28.07	15,531.69	0.00	0.00	28.07	15,531.69	0.00	184.44	90,867.64
06.01.01.02.04	m	141.21	23.23	3,280.31	28.35	658.57	0.00	0.00	28.35	658.57	0.00	112.86	2,921.74
06.01.01.02.05	m2	1,103.90	4.75	5,243.53	343.58	1,631.91	0.00	0.00	343.58	1,631.91	0.00	636.82	3,024.90
06.01.01.03.01	m2	551.95	38.28	21,128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.45	17,511.19
06.01.01.03.02													
06.01.01.03.02													

CONSORCIO ITAYA  
 ABELARDO RIOS ISERIN  
 Representante Común

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
 ING. JOSÉ CARLOS GOMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CON WATER STOP & IP N° 51521  
 MUROS LATERALES DE CANAL  
 CON WATER STOP & IP N° 51521  
 MUROS LATERALES DE CANAL  
 CON WATER STOP & IP N° 51521  
 MUROS LATERALES DE CANAL  
 CON WATER STOP & IP N° 51521

Ing. Ch. Emigdio Hidalgo Zevallos  
 INGENIERO CIVIL

000213

PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATISTA CONTRATADO  
 PRESUPUESTO MONTO CONTRACTUAL

LICITACION PUBLICA N° 06-2019-CSD GR/L  
 CONSORCIO ITAYA

OBRA "MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYA/CA. HUASCAR) DEL AAHH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO"

Region LORETO  
 Provincia MAYNAS  
 Distrito BELEN

SI, 4,756,116.28

SI, 0.00

SI, 0.00

SI, 4,756,116.28

Fecha de inicio de Obra  
 Plazo de Ejecucion

07-Mar-20  
 240 DIAS

1\* Paralización

2\* Paralización

3\* Paralización

Fecha de Término de Obra Inicial

02-May-20

Fecha de Término Contractual

VALORIZACION MENSUAL N° 05

AL 30 NOVIEMBRE DEL 2020

Supervisor ING. JOSE CARLOS GOMEZ MEGO  
 Residente ING. EMIGDIO HIDALGO ZEVALLOS

ITEM	UNID	PRESUPUESTO		PARCIAL	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
		METRADO	P. UNID		Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
06.01.01.03.03	kg	11,343.52	5.73	64,998.37	0.00	365.40	2,093.74	365.40	2,093.74	10,878.12	62,904.83	
06.01.01.03.04	m3	160.09	593.32	96,581.00	0.00	14.85	8,216.80	14.85	8,216.80	145.24	80,364.20	
06.01.01.03.05	m	91.70	9.19	842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.70	842.72	
06.01.01.03.06	m2	874.29	4.75	4,132.88	0.00	99.00	470.25	99.00	470.25	775.29	3,862.83	
06.01.01.03.07	und	31.00	135.35	4,195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	4,195.85	
06.01.01.04	und	7	4656.24	32,593.88	0.00	2.00	9,312.48	2.00	9,312.48	5.00	23,281.20	
06.01.01.04.01	m	50	1418.91	70,945.50	0.00	5.50	7,804.01	5.50	7,804.01	44.50	63,141.49	
06.01.01.04.02	und	1,263.00	25.89	32,698.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	32,698.07	
06.01.01.04.03	und	635.00	22.44	14,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	14,248.40	
06.01.01.04.04	m2	1080	81.15	87,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	87,642.00	
06.01.01.05.01	m	957.00	25.87	24,757.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	24,757.59	
06.01.01.05.02	und	40.00	357.23	14,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	14,288.20	
07.01	m2	36.89	46.18	1,786.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.89	1,786.94	
07.01.01	kg	269.26	5.57	1,499.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.26	1,499.78	
07.01.02	m3	20.79	493.82	10,268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79	10,268.52	
07.01.03	m2	38.81	4.75	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.81	184.35	
07.01.04	m	104.40	9.19	959.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40	959.44	
07.01.05	m	107.73	163.86	17,651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.73	17,651.56	
07.02.01	und	14.00	33.96	475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	475.44	
08	m2	672.75	38.28	25,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.75	25,752.87	
08.01	m3	69.46	483.82	34,300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.46	34,300.74	
08.02	m3	155.16	493.82	76,821.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.16	76,821.11	
08.03	m2	1551.58	4.75	7,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.58	7,370.01	
08.04	m	1200.25	9.19	11,030.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.25	11,030.30	
08.05	m2	389.97	28.56	11,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.97	11,137.54	
09	m2	1,001.75	0.55	550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.75	550.96	
09.01	m2	1,001.75	1.46	1,452.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.75	1,452.54	
09.01.01	m3	599.90	38.75	23,248.13	1,129.95	29.16	0.00	29.16	0.00	570.74	22,116.60	
09.01.01.01	m3	206.52	45.06	9,305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.52	9,305.79	
09.01.01.02	m3	393.38	13.43	5,283.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.38	5,283.09	
09.01.01.03	m3	247.82	17.77	4,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.82	4,403.76	
09.01.02	m	455.03	22.70	10,329.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.03	10,329.18	
09.01.03.01	und	546.72	10.79	5,899.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.72	5,899.11	
09.01.03.02	m	2.00	58.82	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	117.64	
09.01.03.03	und	1	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	88.66	
09.01.03.04	und	2.00	61.16	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	122.32	

CONSORCIO ITAYA  
 ABELARDO RIOS IBERN  
 Representante Combin

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
 ING. JOSE CARLOS GOMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA  
 JEF DE CIP N° 51521

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, A UNA DISTANCIA MINIMA DE 2km + 20% esponamiento.  
 FED DE AGUA  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF Ø 90mm C10  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF Ø 63mm.  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC UF 90mm x 90°, C-10  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC UF 90mm, C-10  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC UF 90mm, C-10

Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
 INGENIERO CIVIL

PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATISTA PRESUPUESTO CONTRATADO

OBRA

Region  
Provincia  
Distrito

"MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYACA. HUASCAR) DEL AAHH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO"

CONSORCIO ITAYA

SI. 4,756,116.28  
SI. 0.00  
SI. 0.00  
SI. 4,756,116.28

Fecha de Inicio de Obra  
Plazo de Ejecución  
1\* Finalización  
2\* Paralización  
3\* Finalización  
Fecha de Término de Obra (Inici)

07-Mar-20  
240 DIAS  
02-Nov-20

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

Supervisor  
Residente

**VALORIZACION MENSUAL N° 05  
AL 30 NOVIEMBRE DEL 2020**

ITEM	PRESUPUESTO		PARCIAL		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	METRAO	F. UND	SI.	SI.	METRAO	Y valorizado	METRAO	Y valorizado	METRAO	Y valorizado	METRAO	Y valorizado
09.01.03.06	und	4	68.27	273.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	273.08
09.01.03.07	und	4.00	53.16	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	212.64
09.01.03.08	und	54	181.22	9785.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	9785.88
09.01.03.09	und	73	186.66	13640.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	13640.78
09.01.03.10	m	1,001.75	3.92	3,926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.75	3,926.86
09.02												
09.02.01												
09.02.01.01	m3	175.54	38.75	6,802.18	119.16	4,617.45	16.00	620.00	135.16	5,237.45	40.38	1,564.73
09.02.01.02	m3	175.54	13.43	2,357.50	0.00	0.00	15.00	214.88	16.00	214.88	159.54	2,142.62
09.02.01.02.01	m	601.31	24.10	12,081.57	272.80	6,576.89	80.00	1,928.00	352.80	8,504.89	148.41	3,576.88
09.02.01.02.02	und	127.00	75.85	9,632.95	52.00	3,944.20	6.00	455.10	58.00	4,399.30	68.00	5,233.65
09.02.01.02.03	und	127.00	70.46	8,946.42	45.00	3,170.70	6.00	422.76	51.00	3,593.46	76.00	5,354.96
09.03												
09.03.01												
09.03.01.01	m3	616.26	38.75	23,957.58	0.00	0.00	6.40	248.00	6.40	248.00	611.86	23,709.58
09.03.01.02	m3	180.33	45.06	8,125.67	31.15	1,403.62	1.80	72.10	32.75	1,475.72	147.58	6,649.95
09.03.01.03	m3	347.77	13.43	4,670.65	113.50	1,524.31	13.00	161.16	125.50	1,685.47	222.27	2,985.08
09.03.01.04	m3	216.39	17.77	3,845.25	65.07	1,156.29	0.00	0.00	65.07	1,156.29	151.32	2,688.96
09.03.02												
09.03.02.01	m	858.70	79.92	68,541.43	87.90	7,016.18	42.00	3,352.44	129.90	10,368.62	726.80	56,172.61
09.03.02.02	m	127.00	46.11	5,855.97	42.00	1,936.62	0.00	0.00	42.00	1,936.62	86.00	3,919.35
09.03.02.03	und	127.00	86.65	11,258.55	4.00	354.60	0.00	0.00	4.00	354.60	123.00	10,903.95
10												
10.01												
10.01.01	und	126.00	432.73	55,389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	55,389.44
10.01.02	und	126.00	31.89	4,081.92	38.00	1,211.82	0.00	0.00	38.00	1,211.82	90.00	2,870.10
10.01.03	und	126.00	132.28	16,931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	16,931.84
10.01.04	und	85	11.15	947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	947.75
10.01.05	m	248.02	61.50	15,263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.02	15,263.23
10.01.06	m3	9	423.01	3,807.09	2.00	846.02	6.00	2,538.06	8.00	3,384.08	1.00	423.01
10.01.07	m3	12.00	776.41	9,316.92	2.00	1,552.82	2.00	1,552.82	4.00	3,105.64	8.00	6,211.28
10.01.08	und	5.00	1,085.58	5,427.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5,427.90
10.01.09	und	25.00	1,880.83	48,744.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	48,744.07
10.02												
10.02.01	und	182.85	53.70	9,819.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.85	9,819.05
10.02.02	und	158.96	30.01	4,770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.96	4,770.39
10.02.03	und	11	724.35	7,967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	7,967.85
10.02.04	und	10.00	812.93	8,129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,129.30
10.03												
10.03.01	und	1	2000	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00
10.03.02	und	1.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.63	9,072.00	0.63	9,072.00	0.37	5,328.00
10.03.03	und	1	4800	4,800.00	0.37	1,785.17	0.13	624.00	0.50	2,409.17	0.50	2,389.83
10.03.04	und	1.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00
10.03.05	und	1	7770	7,770.00	0.38	2,952.60	0.13	1,010.10	0.51	3,962.70	0.49	3,807.30
10.04												
10.04.01	und	233.70	35.94	8,399.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.70	8,399.18

**CONSORCIO ITAYA**  
**ABELARDO RIOS ISERN**  
Representante Común

**CONSORCIO SUPERVISOR BELEN**  
**ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO**  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS  
C.I.P. N° 51521

**ING. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos**  
INGENIERO

PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATISTA  
 PRESUPUESTO CONTRATADO  
 DEDUCTIVO ADICIONAL MONTO CONTRACTUAL

SI. 4,756,116.28  
 SI. 0.00  
 SI. 0.00  
 SI. 4,756,116.28

OBRA  
 "MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYA/CA. HUASCAR) DEL AAHH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO"

Region  
 Loreto  
 Provincia  
 Maynas  
 Distrito  
 Belen

Fecha de Inicio de Obra  
 7-Mar-20  
 Plazo de Ejecución  
 240 DIAS

1ª Paralización  
 2ª Paralización  
 3ª Paralización


Fecha de Término de Obra Inicial  
 2-Nov-20  
 Fecha de Término Contractual


**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 05  
 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2020**

Supervisor  
 Residente  
 ING. JOSE CARLOS GOMEZ MEGO  
 ING. EMIGDIO HIDALGO ZEVALLOS

ITEM	PRESUPUESTO		PARCIAL		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		BALDO POR VALORIZAR	
	UNID	METRAO	P. UNID	SI.	Metrao	Valorizado	Metrao	Valorizado	Metrao	Valorizado	Metrao	Valorizado
10.04.02	m2	76.00	28.71	2,257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	2,257.96
10.05.01	m3	34.21	38.76	1,325.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21	1,325.64
10.05.01.01	m3	33.45	90.24	3,018.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.45	3,018.53
10.05.01.02	m3	42.76	17.77	759.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76	759.85
10.05.01.03	und	14.00	368.07	5,104.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	5,104.98
10.05.02.01	und	28.00	495.48	13,873.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	13,873.44
10.05.03.01	m	171.94	26.94	4,632.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.94	4,632.06
10.05.04.01	m	12.00	50.38	604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	604.32
10.05.04.02	und	2.00	728.46	1,456.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,456.92
10.05.05.01	und	14.00	312.70	4,377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	4,377.80
10.05.05.02	und	2.00	1,486.49	2,972.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,972.98
10.05.06.01	und	2.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,000.00
10.05.06.02	und	5,421.42	2.18	11,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.42	11,818.70
10.06.01	und	4.00	865.58	3,462.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3,462.24
10.06.02	und	8,000,000.00%		1,215,027.24		221,192.77		1,436,220.05		1,436,220.05		2,717,983.29
TOTAL GENERAL DIRECTO		8,000,000.00%		332,505.07		17,985.42		114,897.60		114,897.60		217,407.46
GASTOS GENERALES		8,000,000.00%		289,997.87		78,976.77		93,354.30		93,354.30		176,643.56
UTILIDAD				4,756,116.28		1,391,208.18		1,844,471.95		1,844,471.95		3,111,644.33
PRESUPUESTO TOTAL				4,756,116.28		1,391,208.18		253,266.72		1,844,471.95		3,111,644.33
TOTAL GENERAL DIRECTO				4,756,116.28		1,391,208.18		253,266.72		1,844,471.95		3,111,644.33
GASTOS GENERALES				29,250.9%		6.33%		5.3267%		0.00		0.00
UTILIDAD				34.58%								
PRESUPUESTO TOTAL												

  
**CONSORCIO SUPERVISOR BELEN**  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 RUC: 201010181

  
**ING. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos**  
 INGENIERO CIVIL  
 RUC: 201010181





# VALORIZACION

## N.º 6



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Belén 20 de enero del 2021

Oficio n° 0156-2021-GRL-GRI-SGSyC  
Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente



Asunto: Conformidad Valorización de Obra n° 06  
Segundo Período mes de diciembre del 2020

Obra: "Mejoramiento del Jr. Itaya (Av. Participación/  
Ca. Amazonas) y la calle Unión (Jr. Itaya/Ca. Huáscar)  
del AA.HH. Manco Inca, del distrito de Belén- Maynas-  
Loreto".

Ref. : a. Informe n° 008-2021-GRL-GRI-SGSyC/KAMC  
b. Carta n° 032-2021-CSB-GRL

Es grato dirigirme a usted, a su vez remitirle la documentación de la Valorización n° 06 por ejecución de Obra, correspondiente al **Segundo Período del 21 al 31 de diciembre del 2020**, que asciende a la suma de (S/.140,613.81), de acuerdo a la amortización por adelanto de materiales, consideramos en monto neto a pagar la suma de **Cuarenta con 36/100 Soles, (S/. 40,36) sin incluir IGV**; asimismo los reajustes serán considerados en la liquidación final de obra en concordancia al artículo 195° del RLCE, siendo el monto neto a pagar de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización n° 06 – diciembre 2020 (Del 21 al 31 de diciembre 2020)	S/. 140,613.81
Reajustes	S/. 0.00
Amortización adelanto materiales	S/. 140,573.45
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/. 40.36</b>

Asimismo, la obra a diciembre del 2020, tiene un avance real acumulado ejecutado de 39.97%, versus un avance programado de 48.65%, encontrándose en ejecución como obra **atrasada**.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación de la valorización que sustenta el Supervisor, solicito continuar con el trámite respectivo **a favor de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AMAZONICA EIRL**, con factura electrónica E001-74.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerente Regional de Infraestructura  
  
Ing. RAMÓN FLORES AQUEPUCHO  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: SGSyC - File obra (01)  
SGSyC - File correlativo (01)  
SGSyC - File personal (01)  
Registro: 01221  
RFA/SGSyC/iva.



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

**INFORME N°008-2021-GRL/GRI/SGSyC/KAMC**


AL : **Ing. Raúl Flores Aquepucho**  
Sub Gerente de Supervisión y Control.

DE : **Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar**  
Coordinador de Obra

ASUNTO **Conformidad de valorización de Ejecución de Obra N° 06-02 –  
Correspondiente al segundo periodo del 21 al 31 de diciembre 2020**  
**Obra: “Mejoramiento del Jr. Itaya (av. Participación / Calle Amazonas) y calle  
Unión (jr. itaya / calle Huáscar) aa. hh manco inca Belén - Maynas – Loreto**  
  
Ejecuta: **CONSORCIO ITAYA**  
Supervisa: **CONSORCIO SUPERVISOR BELEN.**

REFERENCIA: a) Carta N°032/2021-CSB-GRL  
b) Carta N°004/2021/CI

FECHA : **Iquitos, 19 de enero de 2021.**



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentación presentada por el **SUPERVISOR** de obra referente a la **Valorización de Obra N°06-2, correspondiente al segundo periodo del 21 al 31 de diciembre del 2020**, que mediante Proveído N°01221 de la SGSyC, se solicita su revisión, evaluación e informe correspondiente.

**I GENERALIDADES:**

**1.1 DE LA OBRA**

- 1.- Obra : **“MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y DE LA CALLE UNION (JR. ITAYA/CA. HUASCAR) DL AAHH. MANCO INCA, DISTRITO BELEN, PROVINCIA MAYNAS, REGION LORETO”.**
- 2.- Ubicación :  
Distrito : **Belén**  
Provincia : **Maynas**  
Departamento : **Loreto**
- 3.- Financiamiento : **Recursos Ordinarios.**
- 4.- Modalidad de Concurso : **Licitación Pública**
- 5.- Sistema de Contratación : **A precios unitarios**
- 6.- Modalidad de Ejecución : **Por Contrata**
- 7.- Fecha de Concurso : **14 de enero del 2020**
- 8.- Contratista : **CONSORCIO ITAYA**

**1.2 DE LA SUPERVISION**

- 1. Tipo de Proceso : **Concurso Publico N° 009-2019-CSO-GRL**
- 2. Consultor Supervisor : **CONSORCIO SUPERVISOR BELEN.**





**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"**

3. Jefe de Supervisión : **ING. CIVIL JOSE CARLOS GOMEZ MEGO.**
4. Contrato : **Contrato de Consultoría de Obra N° 013-2020-GRL-GGR-GRI**
5. Fecha del Contrato : **12 de febrero del 2020**
6. Monto del Contrato : **S/. 358,148.00 Soles, Sin IGV**
7. Plazo Contractual del Servicio: **270 Días Calendario**
8. Modalidad del Contrato : **A Suma Alzada**

**1.3 DEL CONTRATISTA**

1. Tipo de Proceso : **Licitación Publica N° 006-2019-CSO-GRL (Primera Convocatoria).**
2. Fecha de Concurso : **14 de enero del 2020**
3. Contrato : **N° 016-2020-GRL-GGR-GRI.**
4. Contratista : **CONSORCIO ITAYA.**
5. Fecha de Suscrip. Contrato : **20 de febrero del 2020**
6. Rep. Común del Contratista : **Abelardo Ríos Isern**
7. Residente de Obra : **Ing. Civil Emigdio Hidalgo Zevallos CIP N° 74047**
8. Monto Contratado : **S/. 4'756,116.28 Soles, Sin Inc. IGV**
9. Fecha de presupuesto Exp. Técnico : **Febrero del 2020**
10. Aprobación del expediente técnico : **R. G. G.R N° 268-2019-GRL-GGR (22/05/2019)**
11. Acta Entrega Terreno/P/Ejec. Obra : **06 de marzo del 2020.**
12. Adelanto Directo Total :
13. Fecha Adelanto Directo :
14. Adelanto de Materiales : **S/. 1'189,029.07 Soles, Sin Inc. IGV**
15. Fecha Adelanto de Materiales : **28 de octubre 2020**
16. fecha de Inicio del Plazo Contractual : **07 de marzo de 2020.**
17. Plazo de Ejecución de Obra : **240 Días Calendarios**
18. Fecha de Término del Plazo Contractual : **01 de noviembre de 2020**
19. %Avance Físico al mes : **2.96 %.**
20. %Avance Físico Acumulado : **39.97 %.**
21. %Avance Programado al mes : **11.76 %.**
22. %Avance Programado Acumulado : **48.65 %.**
23. Situación Actual de la Obra : **En Ejecución atrasada.**

**1.3 DEL COORDINADOR**

Coordinador : **Ing.kenyo Alberto Montes Cuellar**

**l). ANTECEDENTES**

- El 14 de enero de 2020, el comité de selección adjudico la buena pro de la LICITACIÓN PUBLICA N° 006-2019-CSO-GRL, para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DEL JR: ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y LA CALLE UNION (JR. ITAYA / CA. HUSCAR) DL AA.HH. MANCO INCA, DEL DSTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO"**.
- El 20 de febrero del 2020 se firmó el Contrato de Ejecución de Obra N° 016-2020-GRL-GGR-GRI, entre la empresa contratista **CONSORCIO ITAYA** y el **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**, fijándose en dicho documento las cláusulas contractuales y legales para la ejecución de la obra



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

**“MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y LA CALLE UNION (JR. ITAYA / CA. HUSCAR) DL AA.HH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO”.**

- Con 06 de marzo de 2020 se procedió a realizar EL **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**, a cargo del Gobierno Regional de Loreto.
- Con fecha 07 de marzo de 2020 se dio inicio al plazo contractual de la ejecución de obra, hasta el 01 de noviembre de 2020. Ejecutando las partidas de Obras Provisionales, Trabajos Preliminares y Seguridad y Salud.
- **Mediante Carta N°004/2021/CI** (11 de enero del 2021), el Contratista presenta al Supervisor la Valorización de Ejecución de Obra N° 06-2, correspondiente al segundo periodo del mes diciembre 2020, en la cual hace de conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:
  1. Copia de Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
  2. Copia de Contrato de Obra
  3. Copia del Acta de Entrega de Terreno.

**DOCUMENTACIÓN TECNICA:**

1. Copia de Contrato de Consorcio
2. Copia de comprobantes de pago emitidos por la Oficina de Ejecutiva de Tesorería y Documento que sustente la transferencia electrónica de fondos a la cuenta del Proveedor:
  - Adelantos Directos
  - Adelantos de Material
3. Cuadro de Resumen de pagos y Amortizaciones de los adelantos a la fecha valorizada de corresponder, visado por el supervisor o inspector
4. Copia de la Fórmula Polinómica del expediente Técnico
5. Calendario Actualizado del Programa de Valorización
6. Documento que acredite el control de calidad de las partidas Valorizadas en el mes
7. Certificado y/o reporte que acredite la habilidad vigente del residente
8. Pagos de Tributos del mes Valorizado:
  - SENCICO
  - ES-SALUD
  - ONP y/o AFP
  - SCTR
  - CONAFOVICER
  - Copia de Plantilla de Jornales
  - Copia de Declaración PDT-SUNAT
  - Copia de RNP
9. Copia visada de Cuaderno de Obra



**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"**

10. Relación técnica del personal de acuerdo a la propuesta de las especialidades y el porcentaje de participación
11. Panel Fotográfico
12. Expediente de Valorización
13. Factura Electrónica
14. Informe de conformidad de Valorización emitida por la Subgerencia de Supervisión y Control
15. Copia de Cartas Fianza Vigentes

**DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

1. Certificado de habilidad
2. Copia de cartas fianzas
  - a. Fiel cumplimiento
3. Copia de calendario de obra vigente

**1. ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA**

Según Asiento del cuaderno de obra **N°282 de fecha 31/12/2020**, anotada por el residente, donde indica los Metrados ejecutados en el periodo, correspondiente a la valorización para su REVISION y CONFORMIDAD por parte del Supervisor con la finalidad de elaborar el informe de Valorización N°06-2.

Asiento del cuaderno de obra **N° 283 de fecha 31/12/2020**, el Supervisor de obra, indica de los trabajos ejecutados por el contratista. Así mismo, manifiesta que da conformidad a los Metrados correspondientes del 21 al 31 de diciembre segundo periodo del 2020 y autoriza la elaboración de la valorización de obra N°06-2 correspondiente al segundo periodo del mes de diciembre del 2020. Revisando

**CONTROL ECONÓMICO**

**- Presupuesto de Obra.**

Val. N06-2 OBRA: "MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y LA CALLE UNION (JR. ITAYA / CA. HUSCAR) DL AA.HH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO"	
Total del Costo Directo Resumen	S/. 4,153,813.34
Gastos Generales (8 %)	S/. 332,305.07
Utilidad (6.5 %)	S/. 269,997.87
<b>Total Presupuesto de Infraestructura</b>	<b>S/. 4,756,116.28</b>
<b>IGV (18%)</b>	<b>0.00</b>
<b>Presupuesto Total</b>	<b>S/. 4,756,116.28</b>



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

**2. CONTROL DE AVANCE DE OBRA**

VALORIZACION	Nº 06-2	SEXTO PAGO - 02	FECHA : Diciembre 2020
OBRA	"MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYA/CA. HUASCAR) DEL AAHH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO"		
PROPIETARIO	A Precios Unitarios		
CONTRATISTA	CONSORCIO ITAYA		
FECHA PTO. REFERENCIAL	FEB. 2019		
PRESUP. REFERENCIAL	S/. 4,776,885.34	sin IGV	
PRESUP. OFERTADO	S/. 4,756,116.28	sin IGV	
<b>HOJA DE LIQUIDACION</b>			
1. VALORIZACION Nº 06-2 - Diciembre 2020 - D.U. 133-2020			
<u>Monto Bruto</u>		(a)	140,613.81
Amortización			
Adelanto Directo (10.00%)			
Adelanto por Materiales (Según D.S. Nº 079-VC, Ampliatorias y Modificatorias)	140,573.45		
	140,573.45		40.36
2. REAJUSTES DE LA VALORIZACION Nº 06-2			
<u>Monto Bruto</u>		(b)	-
Deducción de reajuste que no corresponde			
- Del adelanto directo	-		
- Del adelanto por materiales	-	(b)	-
	-		-
3. RÉGULARIZACION DE REAJUSTE VAL. Nº 06-2			
<u>Monto Bruto</u>		(c)	-
Deducción de reajuste que no corresponde			
- Del adelanto directo	-		
- Del adelanto por materiales	-	(c)	-
	-		-
4. TOTAL A PAGAR	40.36		
	-		
	40.36		
		2) Valorización Nº 06	
		Deducción de reajuste que no corresponde	
		4) TOTAL A PAGAR	
5. SENCICO			
((a)+(b)+(c))	140,613.81 x 2/1000		S/. 281.23
DE ACUERDO AL D.S. Nº006-88-VC (12-05-88); Art. 2 ESTABLECE QUE LA FIRMA CONTRATISTA TIENE OBLIGACION DE ACREDITAR PREVIAMENTE ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE SUS APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL PARA DAR PÁSE A SU CANCELACION (Art. 4 D.L. 20024 de fecha 22-05-73)			



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”


**3. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA**

GRÁFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA - VAL N° 06-2  
PROGRAMADO VS EJECUTADO

Obra : **MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACIÓN / CA. AMAZÓNAS) Y CALLE UNIÓN (JR. ITAYA /CA. HUASCAR) DEL AA.HH MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELÉN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO**  
Ubicación : **DISTRITO DE DE BELÉN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO**

FECHA	PRESUPUESTO OBRA				PRESUPUESTO VALORIZADO				AVANCE / ATRAZO		
	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	%	% ACUM.	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	%	% ACUM.	RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO		
									%	DESCRIP	
INICIO	MARZO 2020	-	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
VAL N° 01	MARZO 2020	8,537.83	8,537.83	0.18%	0.18%	8,775.99	8,775.99	0.18%	0.18%	0.01%	ADELANTADO
VAL N° 02	AGOSTO 2020	17,283.74	25,821.57	0.36%	0.54%	600,667.76	609,463.77	12.63%	12.61%	12.27%	ADELANTADO
VAL N° 03	SEPTIEMBRE 2020	202,326.57	228,148.14	4.25%	4.80%	336,246.70	945,712.47	7.07%	19.88%	15.09%	ADELANTADO
VAL N° 04	OCTUBRE 2020	264,144.79	492,292.93	5.55%	10.35%	445,531.89	1,391,244.36	9.37%	29.25%	18.90%	ADELANTADO
VAL N° 05	NOVIEMBRE 2020	702,682.11	1,194,975.04	14.77%	25.13%	253,265.72	1,644,510.08	5.33%	34.58%	9.45%	ADELANTADO
VAL N° 06	DICIEMBRE 2020-1	559,493.91	1,754,468.95	11.76%	36.89%	116,044.19	1,760,554.27	2.44%	37.02%	0.13%	ADELANTADO
VAL N° 06	DICIEMBRE 2020-2	559,493.91	2,313,962.86	11.76%	48.65%	140,613.81	1,901,168.08	2.96%	39.97%	-8.68%	ATRASADO
VAL N° 07	ENERO 2021	1,228,833.85	2,983,302.80	25.84%	74.49%						
VAL N° 08	FEBRERO 2021	681,388.10	3,664,690.90	14.33%	88.82%						
VAL N° 09	MARZO 2021	347,600.59	4,012,291.49	7.31%	96.12%						
VAL N° 10	ABRIL 2021	184,330.88	4,196,622.37	3.88%	100.00%						
TOTAL		4,756,116.28		100.00%		1,901,168.08					

GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES PROGRAMADO VS EJECUTADO

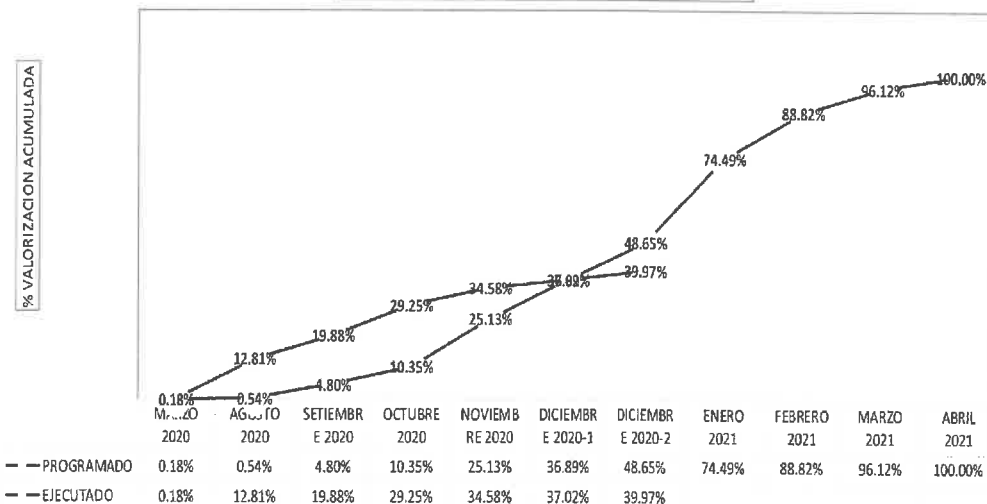





#### 4. CONCLUSIONES:

- La presente documentación materia de su revisión, consta con los requerimientos y sustentos que derivan a la presente valorización descritos en el ítem 3. Contenido de la Documentación.
- En la documentación, se adjuntan las boletas de pagos realizados a **SENCICO**, **CONAFOVICER**, de acuerdo al porcentaje que estima la legislación vigente, pago de póliza **SCTR**.
- El avance físico del mes es:
 

- Avance Físico del primer periodo del 21 al 31 de (diciembre -2020) .....	2.96 %
- Avance Físico Acumulado.....	39.97 %
- Avance Físico Prog del mes.....	11.76 %
- Avance Físico Prog.acum.....	48.65 %

**La obra en mención tiene un avance físico mensual acumulado al segundo periodo del 21 al 31 de diciembre de 2020 de 39.97 %, siendo el estado de la obra ATRASADA.**

#### 5. RECOMENDACIONES:

- El Supervisor indica que la obra en mención tiene un avance físico mensual del 2.96 % y un acumulado de 39.97 % de su avance EJECUTADO con un avance programado acumulado de 48.65 %, por lo que la obra, se encuentra atrasada.
- Los metrados han sido conciliados por el Residente y Supervisor de Obra por lo mismo que Da Conformidad a la Valorización N°06-2 (Mediante la Carta N°032/2021-CSB-GRL, cuyos metrados fueron autorizados mediante el asiento del cuaderno de obra N°283 – Del Supervisor), de la obra “MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y LA CALLE UNION (JR. ITAYA / CA. HUSCAR) DL AA.HH. MANCO INCA, DEL DSTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO”.
- Visto la Carta N°032/2021-CSB-GRL de la Valorización N°06-2 correspondiente al mes de diciembre segundo periodo del 2020 y dado la conformidad por el Supervisor de obras, por el monto neto de s/ 40.36 (cuarenta y 36 /100 soles) sin IGV, a la empresa CONSORCIO ITAYA, teniendo el siguiente detalle:

1 Valorización N°06 diciembre del 2020	S/. 140,613.81
2 Reajuste y Reintegros	S/. 0.00
3 Amortización de Adelanto Directo	S/. 0.00
4 Amortización de Adelanto para Materiales	S/. 140,573.45
<b>5 Neto Facturar</b>	<b>S/. 40.36</b>

- Se recomienda derivar la presente documentación, a la Gerencia Regional de Infraestructura, previa revisión considerando que ya ha sido dada la conformidad por parte del Supervisor, cabe indicar que dicha valorización fue presentada por el Supervisor el 15-01-2021, por lo que no ha presentado en el plazo correspondiente exhortar al Supervisor para que pueda presentar en los plazos establecidos RLCE vigente; además se recomienda continuar con su trámite correspondiente cumpliendo con los plazos



**"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"**

*establecidos en el Art.194 Valorizaciones y Metrados de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento modificada por el Decreto Legislativo N°1444 y aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF respectivamente y mediante DECRETO DE Urgencia 133-2020 DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA Y DAR CONTINUIDAD A LAS ENTREGAS ECONÓMICAS A FAVOR DE LOS DEUDOS DEL PERSONAL DE LA SALUD FALLECIDO COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19*

*Artículo 2. Autorización a realizar modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad y el pago de las valorizaciones en los contratos vigentes de ejecución y supervisión de obras*

*2.1 Autorízase, de manera excepcional, que, en los contratos vigentes de ejecución y supervisión de obras que formen parte de inversiones públicas, las partes puedan acordar modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad de las valorizaciones correspondientes al mes de diciembre de 2020*

*Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.*

*Atentamente*

  
-----  
KENYO ALBERTO  
MONTES CUELLAR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 195722

Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR  
Coordinador de Obra  
Sub Gerencia de Supervisión y  
Control

Cc: Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar

Trámite: 01221



272

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”


Iquitos, 15 ENE 2021

CARTA N° 032-2021-CSB-GRL

Señores:  
 Gobierno Regional de Loreto  
 Av. Abelardo Quiñones Km 1.5 – Belén  
 Atención.-  
 Gerencia Regional de Infraestructura  
 Sub Gerencia de Supervisión y Control



ASUNTO : Aprobación y Remisión de VALORIZACION DE OBRA N° 06 [II] - Obra: "Mejoramiento del Jr. Itaya [Av. Participación / Ca. Amazonas] y la Calle Unión [Jr. Itaya / Ca. Huáscar] del AA.HH Manco Inca, del Distrito de Belén – Maynas - Loreto"



REFERENCIA : A) Informe N° 013-2021-CSB/JSO-JCGM  
 B) Contrato N° 013-2020-GRL-GGR-GRI – Contratación de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Jr. Itaya [Av. Participación / Ca. Amazonas] y la Calle Unión [Jr. Itaya / Ca. Huáscar] del AA.HH Manco Inca, del Distrito de Belén – Maynas - Loreto"

De mi mayor consideración:

Mediante la presente me dirijo a Usted, con la finalidad de saludarle y a la vez remitir a su despacho la VALORIZACION DE OBRA N° 06 [II] DICIEMBRE 2020 de la obra mencionada en el asunto, en vista que esta ha sido aprobada por nuestra representada a través del Jefe de Supervisión de Obra según el informe de la referencia A), el mismo que corresponde a un monto de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 06 [II] DICIEMBRE 2020		
a)	Valorización de Obra N° 06 [II]	S/ 140,613.81
b)	Reajustes y Reintegros	S/ 0.00
c)	Amortización por Adelanto Directo	S/ 0.00
d)	Amortización por Adelanto de Materiales	S/ [140,573.45]
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>		<b>S/ 40.36</b>

Cabe resaltar que dicha Remisión y Aprobación de la Valorización de obra en mención, es en virtud al cumplimiento de los Términos de Referencia para la ejecución del Servicio de Consultoría de Obra – Supervisión de Obra, mencionada en la referencia B); y al artículo 194, numeral 194.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que deberá ser cancelada de conformidad con el artículo mencionado precedentemente.

Sin otro particular me despido de Usted no sin antes agradecerle su atención a la presente.

Atentamente.

PROVEIDO N°

01221

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

A: 3654C

SR. JORGE CAMILO RUIZ ROJAS  
 REPRESENTANTE COMÚN

PARA: Revisión de Acuerdo al Reglamento

PROVEIDO N°

01221

PARA:

Atención




“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

**INFORME N° 013-2021-CSB-GRL/ISO-JCGM**

Al	:	Ing. Jorge Camilo Ruiz Rojas – Representante Común Consortio Supervisor Belén
Del	:	Ing. José Carlos Gómez Mego – Jefe de Supervisión de Obra Consortio Supervisor Belén
Asunto	:	Aprobación y Remisión de Valorización de Obra N° 06 [I] – 06 [II] – Obra: “Mejoramiento del Jr. Itaya [Av. Participación / Ca. Amazonas] y la Calle Unión [Jr. Itaya / Ca. Huáscar] del AA.HH Manco Inca, del Distrito de Belén – Maynas - Loreto”
Referencia	:	A) Carta N° 044-2020/CI [29/12/2020] B) Carta N° 004-2021/CI [11/01/2021]
Fecha	:	

**A) ANTECEDENTES**

- ✓ Con fecha 20/02/2020, se suscribió el Contrato N° 016-2020-GRL-GGR, para la ejecución de la obra mencionada en el asunto, entre el Gobierno Regional de Loreto y la empresa contratista ejecutor de obra Consortio Itaya conformado por [Becerra Hnos. Contratistas Generales SAC – Constructora e Inmobiliaria Amazónica EIRL], por un monto de [S/ 4'756,116.28] – Sin Incluir IGV, y un plazo de ejecución de [240] días calendario.
- ✓ Con fecha 12/02/2020, se suscribió el Contrato N° 013-2020-GRL-GGR-GRI, para la Supervisión de la ejecución de la obra mencionada en el asunto, entre el Gobierno Regional de Loreto y la empresa consultora supervisor de obra Consortio Supervisor Belén conformado por [Gómez Mego José Carlos y Correa López Jean Paul], por un monto de [S/ 358,148.00] – Sin Incluir IGV y un plazo de ejecución de [270] días calendario.
- ✓ Mediante Carta N° 143-2020-GRL-GRI-SGSyC, de fecha 28/02/2020, se comunica a la supervisión Consortio Supervisor Belén, iniciar sus funciones cuando la obra inicie su ejecución; de acuerdo al artículo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y que en representación de la entidad se proceda a la entrega de terreno en el lugar de la citada obra, en cumplimiento al artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Con fecha 06/03/2020, se procedió a la entrega de terreno, de conformidad con lo descrito en el párrafo precedente, y en el mismo acto de entrega se determinó que el inicio el plazo de ejecución empieza el día 07/03/2020.
- ✓ Con fecha 15/03/2020, se promulgó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el Decreto Supremo que declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CIP N° 51521

afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, por lo que se Declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince [15] días calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio [cuarentena], por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19 .

- ✓ Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 051-2020-PCM de fecha 27/03/2020, se decreta en su artículo 1: Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM por el término de Trece [13] días calendario, a partir del 31/03/2020.
- ✓ Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 064-2020-PCM de fecha 10/04/2020, que indica en su artículo 1: Prorroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado temporalmente mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y precisados por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM y N° 068-2020-PCM, por el termino de Catorce (14) días calendario, a partir del 13/04/2020 hasta el 26/04/2020.
- ✓ Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 075-2020-PCM de fecha 23/04/ 2020 decreta en su artículo 1: Prorroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM; y precisados o modificados por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, por el termino de Catorce [14] días calendario, a partir de 27/04/2020 hasta el 10/05/2020.
- ✓ Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 083-2020-PCM de fecha 10/05/2020 que decreta en su artículo 1: Prorroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM, y N° 075-2020-PCM; y precisados o modificados por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, por el termino de Catorce [14] días calendario, a partir del 11/05/2020 hasta el 24/05/2020.
- ✓ Con fecha 10/05/2020, se promulga en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1486, en la Disposiciones Complementarias Transitorias. **“Segunda. Reactivación de obras públicas contratadas conforme al régimen general de contrataciones del estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”.**
- ✓ Con fecha 19/05/2020, el Organismo Supervisor de las Contrataciones [OSCE], publica la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, **“Alcances y Disposiciones para la Reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición complementaria transitoria del decreto legislativo N° 1486”.**
- ✓ Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 094-2020-PCM de fecha 23/05/2020 decreta en su artículo 2: Prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM, y N° 075-2020-PCM; y precisados o modificados por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
CIP N° 51521

2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, por el termino de Treinta y Siete [37] días calendario, a partir del 25/05/2020 hasta el 30/06/2020.

- ✓ Con fecha 04/06/2020, se promulga en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Decreto Supremo que Aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas, dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM.
- ✓ Mediante Resolución Gerencial Regional N° 048-2020-GRL-GRI, de fecha 13/07/2020, se aprueba las siguientes Ampliaciones de Plazo:

ETAPA	AMPLIACION DE PLAZO
A] Ampliación de Plazo por Paralización del Estado de Emergencia	95 [Días Calendario]
B] Ampliación de Plazo por la Re Movilización de Personal y Equipos como las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo para la prevención y control frente a la propagación del COVID 19	15 [Días Calendario]
C] Ampliación de Plazo para Culminar los trabajos de Saldo de Obra	25 [Días Calendario]


- ✓ Mediante Carta N° 011-2020/CI, de fecha 27/07/2020, el Consorcio Itaya, solicita el reinicio de actividades con adecuaciones del ambiente de trabajo e implementación del Plan Covid19, RM N° 448-2020-MINSA, con fecha 03/08/2020.
- ✓ Mediante Carta N° 010-2020-CSB-GRL, de fecha 30/07/2020, la Supervisión de Obra: Consorcio Supervisor Belén, traslada la solicitud mencionada en el párrafo precedente, a la entidad para su aprobación y posterior verificación por parte de esta última.
- ✓ Mediante Carta N° 0371-2020-GRL-GRI-SGSyC, de fecha 03/08/2020, la entidad Gobierno Regional de Loreto, acepta el **Reinicio** de Plazo contractual de obra, de conformidad con la Directiva N° 005-2020-OSCE.
- ✓ Mediante ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 016-2020-GRL-GGR-GRI, se modifica el contrato relacionado a la periodicidad y el pago de valorizaciones únicamente para el mes de diciembre 2020. Por consiguiente se modifica la clausula de contrato antes mencionado referente al pago de valorizaciones mensuales por dos valorizaciones que se dividen en dos periodos tales como del 01 al 20 de diciembre del 2020, y del 21 al 31 de Diciembre de 2020.

**B] BASE LEGAL**

Los alcances del presente informe y de los actuados administrativos para la ejecución de la Supervisión de Obra, se enmarcan en la Ley de Contrataciones del Estado, y que los artículos más resaltantes a aplicarse son los siguientes:

- ✓ De acuerdo al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.

Para iniciar la ejecución de una obra que requiera Supervisión, puede designarse un Inspector de Obra o un Equipo de Inspectores en tanto se contrata la Supervisión.

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CIP N° 61521

- ✓ El artículo 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, define que, durante la ejecución de la obra, se cuenta de modo permanente y directo, con un Inspector o con un Supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra.
- ✓ Que de acuerdo al artículo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, define que la Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del Inspector o Supervisor según corresponda, quién es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.

El Inspector o el Supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo señalado, su actuación se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.


El contratista brinda al Inspector o Supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta.

- ✓ Por otro lado, el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaborados el último día de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro los plazos que establezca el contrato.

El plazo máximo de aprobación por el Inspector o el Supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente.

**C] ALCANCES PARA EL DESARROLLO DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

Obra	:	"Mejoramiento del Jr. Itaya [Av. Participación / Ca. Amazonas] y la Calle Unión [Jr. Itaya / Ca. Huáscar] del AA.HH Manco Inca, del Distrito de Belén – Maynas - Loreto"		
Ubicación	:	Distrito: Belén	Provincia: Maynas	Región: Loreto
Sistema de Contratación	:	A Precios Unitarios		
Procedimiento de Selección	:	Licitación Pública N° 006-2019-CSO-GRL		
Presupuesto Referencial	:	S/ 5'636,724.70 [Incluido IGV]		
Presupuesto Contratado	:	S/ 4'756,116.28 [Sin Incluir IGV]		
Fecha del Presupuesto Referencial	:	Febrero de 2019		
Fecha Firma de Contrato	:	20/02/2020		

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CIP N° 51521


267

Plazo de Ejecución de Obra	:	240 Días Calendario
Adelanto Directo	:	_____
Adelanto para Materiales	:	_____
Fecha de Pago de Adelanto Directo	:	_____
Fecha de Pago de Adelanto de Materiales	:	_____
Fecha de Entrega de Terreno	:	07/03/2020
Fecha de Inicio Contractual de Obra	:	07/03/2020
Fecha de Paralización de Obra	:	15/03/2020
Ampliación de Plazo N° 01	:	135 [Días Calendario]
Nueva Fecha de Inicio de Obra	:	03/08/2020
Nueva Fecha de Término Contractual	:	15/04/2021
Ingeniero Residente de Obra	:	Ing. Emigdio Hidalgo Zevallos – CIP N° 74047
Supervisor de Obra	:	Consortio Supervisor Belén [Jefe de Supervisión de Obra – Ing. José Carlos Gómez Mego – CIP N° 51521]
Ejecutor de Obra	:	Consortio Itaya [Becerra Hnos. Contratistas Generales SAC – constructora e Inmobiliaria Amazónica EIRL]

**D] DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE VALORIZACION DE OBRA**

De conformidad con las directivas internas del Gobierno Regional de Loreto, las valorizaciones de obras deberán contener como mínimo los siguientes documentos:

- ✓ Datos Generales de la Obra
- ✓ Informe del Ingeniero Residente
- ✓ Hoja de Liquidación
- ✓ Valorización
- ✓ Calendario Valorizado Actualizado
- ✓ Planilla de Metrados de Mes
- ✓ Cuadro de Avance de Obra
- ✓ Copia de Contrato de Obra
- ✓ Copia del Acta de Entrega de Terreno.
- ✓ Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente
- ✓ Copia de las Garantías Vigentes
- ✓ Copia de la Fórmula Polinómica
- ✓ Copia de Comprobantes de Pago de SENCICO, CONAFOVICER Y SCTR
- ✓ Copia de Cuaderno de Obra
- ✓ Panel Fotográfico

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CIP N° 51521



- ✓ Ensayos de Laboratorio [Resistencia a la Compresión – Densidad de Campo]

Mediante documento de la referencia, el contratista alcanza a la supervisión la documentación sustentatoria de la VALORIZACIÓN N° 06 [I] y 06 [II] – DICIEMBRE 2020, por lo que se pudo evidenciar que dicha valorización, contiene todos los documentos mencionados precedentemente por lo que la documentación contenida es conforme, de acuerdo a el monto valorizado.

**E] ANALISIS**

En virtud al control efectuado por el suscrito en el lugar de la obra, se han verificado los metrados realmente ejecutados por el contratista, habiéndose cuantificado y APROBADO los metrados para la VALORIZACION N° 06 [I] y 06 [II], correspondiente al mes de DICIEMBRE 2020, luego de efectuada la revisión al procedimiento de cálculo de los montos consignados en la Valorización en mención, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación presentada.

En consecuencia y en conformidad con lo mencionado en el párrafo precedente, el suscrito APRUEBA el monto y el pago de la VALORIZACION N° 06 [I] y 06 [II] – DICIEMBRE 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 06 [I] – DICIEMBRE 2020		
a)	Valorización de Obra N° 06 [I]	S/ 116,044.19
b)	Reajustes y Reintegros	S/ 0.00
c)	Amortización por Adelanto Directo	S/ 0.00
d)	Amortización por Adelanto de Materiales	S/ [29,011.05]
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>		<b>S/ 87,033.14</b>
<b>TRAMITADO MEDIANTE CARTA N° 028-2020-CSB-GRL [04/01/2021]</b>		


RESUMEN VALORIZACIÓN N° 06 [II] – DICIEMBRE 2020		
a)	Valorización de Obra N° 06 [II]	S/ 140,613.81
b)	Reajustes y Reintegros	S/ 0.00
c)	Amortización por Adelanto Directo	S/ 0.00
d)	Amortización por Adelanto de Materiales	S/ [140,573.45]
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>		<b>S/ 40.36</b>

La obra tiene un avance acumulado al mes de DICIEMBRE 2020 del 39.97%, y el avance acumulado programado indica 48.65%, por lo tanto, la obra está **ATRAZADA** en [8.68%], por lo que está por debajo del avance acumulado programado.

**F] CONCLUSIONES**

La obra tiene un avance acumulado al mes de DICIEMBRE 2020 del 39.97%, y el avance acumulado programado indica 48.65%, por lo tanto, la obra está **ATRAZADA** en [8.68%], por lo que está por debajo del avance acumulado programado.

Se advierte que conforme se establece en el artículo 194.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las valorizaciones, por razones

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MESA  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 OIP N° 51521


imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.

En virtud a la documentación y cálculos presentados, se concluye que es procedente efectuar el pago al contratista: **Consortio Itaya** conformado por **[Becerra Hnos. Contratistas Generales SAC – Constructora e Inmobiliaria Amazónica EIRL]**, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 06 [II] – DICIEMBRE 2020		
a]	Valorización de Obra N° 06 [II]	S/ 140,613.81
b]	Reajustes y Reintegros	S/ 0.00
c]	Amortización por Adelanto Directo	S/ 0.00
d]	Amortización por Adelanto de Materiales	S/ [140,573.45]
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>		<b>S/ 40.36</b>

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.

  
 CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGG  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CIP N° 51521

PROCESO DE SELECCION CONTRATISTA  
 LICITACION PUBLICA N° 06-2019-CSO GRL  
 CONSORCIO ITAYA

OBRA

"MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYA CA. HUASCAR) DEL AAHH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO"

Region Loreto  
 Provincia Maynas  
 Distrito Belen

SI. 4,756,116.28  
 SI. 0.00  
 SI. 0.00  
 SI. 4,756,116.28

Ing. C.P. Emidio Hidalgo Zevallos  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

PRESUPUESTO INTEGRAL

Supervisor: ING. JOSE CARLOS GOMEZ MEGO  
 Residente: ING. EMIGDIO HIDALGO ZEVALLOS

VALORIZACION MENSUAL N° 6.2  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

02-Nov-20

ITEM	PRESUPUESTO		PARCIAL		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR		
	UND	METRADO	P. UND	SI.	SI.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
01	und	2.00	1,716.30	3,432.60	1,716.30	0.00	0.00	1,716.30	1,716.30	1.00	1,716.30	1.00	1,716.30
01.01	mes	8.00	1,000.00	8,000.00	4,700.00	300.00	300.00	4,700.00	5,000.00	5.00	5,000.00	3.00	3,000.00
01.02	ton	534.24	30.00	16,027.20	367.50	900.00	900.00	11,925.00	11,925.00	397.50	397.50	138.74	4,102.21
01.03	und	2.00	1,635.63	3,271.26	1,635.63	0.00	0.00	1,635.63	1,635.63	1.00	1,635.63	1.00	1,635.63
01.04	vje	2.00	800.00	1,600.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	1.00	800.00	1.00	800.00
01.05	m2	5,421.42	0.55	2,981.78	3,355.30	1,845.42	169.40	3,663.30	2,014.82	3,663.30	1,758.12	966.96	
02	m2	5,421.42	1.45	7,861.06	5,421.42	7,861.06	0.00	5,421.42	7,861.06	5,421.42	0.00	0.00	
02.01	m2	298.36	59.62	17,847.84	278.92	16,629.21	0.00	278.92	16,629.21	278.92	20.44	1,218.65	
02.02	m3	797.79	17.57	14,017.17	363.96	6,394.78	0.00	363.96	6,394.78	433.83	7,622.35		
02.03	und	5.00	423.01	2,115.05	5.00	2,115.05	0.00	5.00	2,115.05	5.00	0.00		
02.04	m2	1,504.27	65.10	97,927.98	587.70	38,258.94	0.00	587.70	38,258.94	587.70	916.58	59,669.04	
02.05	und	5.00	3,500.00	17,500.00	5.00	17,500.00	0.00	5.00	17,500.00	5.00	0.00		
02.06	und	5.00	2,500.00	12,500.00	5.00	12,500.00	0.00	5.00	12,500.00	5.00	0.00		
02.07	und	1,522.46	18.10	24,511.61	1,480.76	23,840.24	0.00	1,480.76	23,840.24	1,480.76	41.70	671.31	
02.08	m3	6,361.04	12.34	78,495.23	5,023.24	61,986.78	15,882.57	6,310.32	77,869.35	50.72	625.81		
03	m3	195.75	38.75	7,585.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.75	7,585.31		
03.01	m3	32.41	38.75	1,255.89	16.80	651.00	0.00	16.80	651.00	15.61	604.81		
03.01.01	m3	188.76	38.75	7,314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.76	7,314.45		
03.01.02	m2	2,425.65	3.22	7,810.59	261.00	840.42	0.00	261.00	840.42	261.00	2,164.65	6,970.11	
03.02	m2	454.30	8.00	3,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.30	3,634.40		
03.02.01	m2	41.2	8	329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20	329.60		
03.02.02	m2	38.91	7.43	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.91	288.36		
03.02.03	m2	1,560.77	7.43	11,396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.77	11,396.52		
03.03	m3	10,444.85	54.48	569,923.43	812.25	44,251.38	12,672.05	232.60	56,923.43	1,044.85	56,923.43		
03.03.01	m3	5,581.07	55.73	365,648.43	2,570.91	143,276.81	51,866.17	397.06	194,942.98	3,065.08	170,705.42		
03.03.02	m3	366.18	74.56	27,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.18	27,302.38		
03.03.03	m3	17.26	48.55	837.97	16.80	815.64	0.00	16.80	815.64	0.46	22.35		
03.03.04	m3	3.88	74.56	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	289.29		
03.03.05	m3	176.91	74.56	13,182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.91	13,182.95		
03.03.06	m3	421.84	30.81	12,996.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.84	12,996.89		
03.03.07	m3	9,513.35	17.77	169,052.23	7,366.77	130,907.52	20,270.59	1,140.72	151,178.12	1,005.86	17,874.11		
04	m2	930.42	38.70	36,007.25	930.42	36,007.33	0.00	0.00	36,007.33	930.42	0.00		
04.01	kg	8,662.76	5.57	48,251.57	8,662.76	48,251.57	0.00	0.00	48,251.57	8,662.76	0.00		
04.02	kg	2,925.87	5.73	16,786.24	2,184.43	12,516.78	0.00	0.00	2,184.43	2,184.43	741.44	4,248.46	
04.02.01	kg	5,618.96	6.44	36,183.53	5,088.64	32,642.04	0.00	0.00	5,088.64	5,088.64	549.92	3,541.48	
04.02.02	kg	311.45	38.28	11,922.31	311.45	11,922.38	0.00	0.00	11,922.38	311.45	0.00		

000186

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
 ING. JOSÉ CARLOS GOMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA  
 CIP N° 5152

PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATISTA  
LICITACION PÚBLICA N° 06-2019-CSO GR1  
CONSORCIO ITAYA

OBRA

"MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYA/CA. HUASCAR) DEL AAHH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO"

Region Loreto  
Provincia Maynas  
Distrito Belen

SI: 4,756,116.28

SI: 0.00

SI: 4,756,116.28

Fecha de Inicio de Obra  
Plazo de Ejecución  
1° Paralización  
2° Paralización  
3° Paralización  
Fecha de Término de Obra Inicial  
Fecha de Término Contractual

PRESUPUESTO INTEGRAL

VALORIZACION MENSUAL N° 6.2  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

Supervisor  
Residente  
ING. JOSE CARLOS GOMEZ MEGO  
ING. EMIGDIO HIDALGO ZEVALLOS

ITEM	PRESUPUESTO			AVANCE DE OBRA			AVANCE ACUMULADO			SALDO POR VALORIZAR		
	UND	METRADO	P. UNID	PARCIAL	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		Metrado	Valorizado
					Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado		
04.02.05	m3	332	553.32	183,702.24	332.00	183,700.03	0.00	332.00	183,700.03	1	0.00	2,
04.02.06	kg	6,738.33	5.57	37,532.50	6,738.33	37,532.50	0.00	6,738.33	37,532.50	1	0.00	0,
04.02.07	kg	7,447.68	5.73	42,675.21	1,938.47	11,095.97	0.00	1,938.47	11,095.97	0	5,511.21	31,579,
04.02.08	kg	4,101.62	6.44	26,414.43	3,885.07	23,731.85	0.00	3,885.07	23,731.85	1	416.55	2,862,
04.02.09	m2	1,090.32	68.65	74,850.47	919.26	63,107.20	0.00	919.26	63,107.20	1	171.06	11,743,
04.02.10	m2	1,094.20	46.18	50,530.16	1,094.20	50,530.16	0.00	1,094.20	50,530.16	1	0.00	0,
04.02.11	m3	228.93	553.32	126,871.55	228.93	126,871.55	0.00	228.93	126,871.55	1	0.00	0,
04.02.12	m	440.55	23.23	10,233.98	101.21	2,351.11	0.00	101.21	2,351.11	0	339.34	7,882,
04.02.13	m	1,048.01	5.39	5,648.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,048.01	5,648,
04.02.14	m2	1,094.20	4.75	5,197.45	940.59	4,467.80	0.00	940.59	4,467.80	1	153.61	729,
04.03	m	527.84	163.85	86,486.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	527.84	86,486,
04.03.01	und	176	33.96	5,976.96	176.00	5,976.96	0.00	176.00	5,976.96	1	0.00	0,
04.03.02												
05												
05.01												
05.01.01	m3	494.65	73.99	36,599.15	73.99	5,467.86	0.00	73.99	5,467.86	0	420.75	31,131,
05.01.02	m2	2,425.65	34.25	83,078.51	282.70	9,682.48	0.00	282.70	9,682.48	0	211.95	73,996,
05.01.03	m2	405.69	38.28	15,529.81	31.36	1,200.46	0.00	31.36	1,200.46	0	2,384.29	14,329,
05.01.04	m3	490.33	553.32	271,309.40	87.00	48,138.84	0.00	87.00	48,138.84	0	2,338.65	223,170,
05.01.05	m2	2,425.65	4.75	11,521.84	315.64	1,499.29	0.00	315.64	1,499.29	0	2,110.01	10,022,
05.01.06	m	393.98	7.82	2,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	393.98	2,925,
05.01.07	m	491	7.62	3,741.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	491.00	3,741,
05.01.08	m	484.02	7.62	3,688.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	484.02	3,688,
05.01.09	m	1,501.61	9.19	13,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,501.61	13,799,
05.01.10	kg	782.4	8.59	6,709.82	57.60	494.78	0.00	57.60	494.78	0	724.80	6,225,
05.01.11	kg	981.03	5.96	5,846.94	81.60	486.34	0.00	81.60	486.34	0	899.43	5,360,
05.01.12	kg	343.74	5.13	1,763.39	91.80	470.93	0.00	91.80	470.93	0	251.94	1,292,
05.01.13	und	652.00	6.79	4,427.08	112.00	760.48	0.00	112.00	760.48	0	540.00	3,666,
06												
06.01												
06.01.01	m2	1,050.68	38.70	40,681.32	353.19	13,669.45	1,393.20	353.19	15,061.65	0	681.49	25,599,
06.01.01.01	kg	7,366.60	5.57	41,031.96	2,515.83	14,013.17	1,511.92	2,515.83	15,525.09	0	4,579.33	26,506,
06.01.01.02	kg	12,079.45	5.73	69,215.25	4,853.60	27,811.13	2,033.92	4,853.60	29,845.09	0	6,870.89	39,370,
06.01.01.03	m3	210.14	553.32	116,274.86	59.66	33,011.07	0.00	59.66	33,011.07	0	150.48	83,263,
06.01.01.04	m	37.42	23.23	889.27	33.40	775.88	0.00	33.40	775.88	0	4.02	893.4,
06.01.01.05	m2	1,050.68	5.16	5,421.51	344.78	1,779.06	0.00	344.78	1,779.06	1	705.90	3,642,
06.01.01.06												
06.01.01.07	m2	3,364.06	38.28	128,776.22	723.27	27,886.78	0.00	723.27	27,886.78	0	2,640.79	101,089,
06.01.01.08	kg	21,428.84	5.57	119,359.20	3,286.14	18,192.40	1,880.83	3,286.14	20,053.23	0	17,828.72	99,305,
06.01.01.09	m3	217.21	553.32	120,486.64	66.04	36,541.25	0.00	66.04	36,541.25	0	151.17	83,645,
06.01.01.10	m	141.21	23.23	3,280.31	28.35	658.57	0.00	28.35	658.57	0	112.86	2,621,
06.01.01.11	m2	1,103.90	4.75	5,243.33	561.04	2,664.94	0.00	561.04	2,664.94	1	542.86	2,578,
06.01.01.12												
06.01.01.13	m2	551.95	38.28	21,128.65	155.17	5,940.67	0.00	155.17	5,940.67	0	386.76	15,187,
06.01.01.14	kg	6,351.63	5.57	35,376.58	6,351.63	880.03	0.00	880.03	4,901.77	0	5,471.80	30,476,

000185

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
ING. JOSÉ CARLOS GOMEZ MEGO  
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA  
CIP N° 51521

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

PROCESO DE SELECCION CONTRATISTA  
 CONTRATISTA  
 PRESUPUESTO CONTRATADO  
 DEDUCTIVO ADICIONAL MONTO CONTRACTUAL

OBRA

"MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYA/CA. HUASCAR) DEL AAHH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO"

LORETO  
 MAYNAS  
 BELEN  
 07-Mar-20  
 240 DIAS

Supervisor  
 Residente  
 ING. JOSE CARLOS GOMEZ MEGO  
 ING. EMIGDIO HIDALGO ZEVALLOS

Fecha de inicio de Obra  
 Plazo de Ejecucion  
 1\* Paralización  
 2\* Paralización  
 3\* Paralización  
 Fecha de Término de Obra Inicial  
 Fecha de Término Contractual

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 6.2**

02-Nov-20

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

ITEM	UND	PRESUPUESTO		PARCIAL		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR			
		METRADO	P. UND	SI.	SI.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
06.01.01.03.03	kg	11,343.52	5.73	64,988.37	2,663.21	0.00	465.83	0.00	0.00	2,663.21	0	10,877.69	62,329.		
06.01.01.03.04	m3	160.09	553.32	88,581.00	15,116.70	0.00	27.32	0.00	0.00	15,116.70	0	132.77	73,464.		
06.01.01.03.05	m	91.70	9.19	842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	91.70	842.		
06.01.01.03.06	m2	874.29	4.75	4,152.88	895.14	0.00	188.45	0.00	0.00	895.14	0	685.84	3,257.		
06.01.01.03.07	und	31.00	135.35	4,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	31.00	4,195.		
06.01.01.04.01	und	7	4656.24	32,593.68	9,312.48	0.00	2.00	0.00	0.00	9,312.48	0	5.00	23,281.		
06.01.01.04.02	m	50	1418.91	70,945.50	7,804.01	0.00	5.50	0.00	0.00	7,804.01	0	44.50	63,141.		
06.01.01.04.03	und	1,263.00	25.89	32,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,263.00	32,689.		
06.01.01.04.04	und	635.00	22.44	14,249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	635.00	14,249.		
06.01.01.05.01	m2	1080	81.15	87,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,080.00	87,642.		
06.01.01.05.02	m	657.00	25.87	24,757.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	957.00	24,757.		
06.01.01.05.03	und	40.00	357.23	14,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	40.00	14,289.		
07.01															
07.01.01	m2	38.89	46.18	1,795.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	38.89	1,795.		
07.01.02	kg	269.26	5.57	1,499.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	269.26	1,499.		
07.01.03	m3	20.79	493.52	10,266.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	20.79	10,266.		
07.01.04	m2	38.81	4.75	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	38.81	184.		
07.01.05	m	104.40	9.19	959.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	104.40	959.		
07.02.01	m	107.73	163.85	17,651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	107.73	17,651.		
07.02.02	und	14.00	33.96	475.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	14.00	475.		
08.01															
08.01	m2	672.75	38.28	25,752.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	672.75	25,752.		
08.02	m3	69.46	493.82	34,300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	69.46	34,300.		
08.03	m3	155.16	493.52	76,621.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	155.16	76,621.		
08.04	m2	1,551.56	4.75	7,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,551.56	7,370.		
08.05	m	1,200.25	9.19	11,030.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,200.25	11,030.		
08.06	m2	389.97	28.56	11,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	389.97	11,137.		
09.01															
09.01.01	m2	1,001.75	0.55	550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,001.75	550.		
09.01.01.01	m2	1,001.75	1.45	1,452.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,001.75	1,452.		
09.01.02	m3	599.90	38.75	23,246.13	1,129.95	0.00	29.16	0.00	0.00	1,129.95	0	570.74	22,116.		
09.01.02.01	m3	206.52	45.06	9,305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	206.52	9,305.		
09.01.02.02	m3	393.38	13.43	5,283.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	393.38	5,283.		
09.01.02.03	m3	247.82	17.77	4,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	247.82	4,403.		
09.01.02.04															
09.01.03.01	m	455.03	22.70	10,328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	455.03	10,328.		
09.01.03.02	m	546.72	10.79	5,899.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	546.72	5,899.		
09.01.03.03	und	2.00	58.82	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2.00	117.		
09.01.03.04	und	1	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1.00	88.		
09.01.03.05	und	2.00	61.16	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2.00	122.		

000184

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
 ING. JOSÉ CARLOS GOMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA  
 CIP N° 51521

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATISTA  
 PRESUPUESTO CONTRATADO  
 DEDUCTIVO ADICIONAL MONTO CONTRACTUAL

OBRA

**"MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYACA, HUASCAR) DEL AAHH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO"**

Region  
 Provincia  
 Distrito

LORETO  
 MAYNAS  
 BELEN

Supervisor  
 Residente

Fecha de Inicio de Obra  
 Plazo de Ejecucion  
 1ª Paralización  
 2ª Paralización  
 3ª Paralización  
 Fecha de Término de Obra Inicial  
 Fecha de Término Contractual

07-Mar-20  
 240 DIAS  
 02-Nov-20

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 62**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

ITEM	PRESUPUESTO		PARCIAL		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
	METRADO	P. UND	SI.	SI.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado
09.01.03.06	4	und	68.27	273.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.08
09.01.03.07	4.00	und	53.16	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.64
09.01.03.08	54	und	181.22	9,785.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.88
09.01.03.09	73	und	186.86	13,640.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,640.78
09.01.03.10	1,004.75	m	3.92	3,926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,640.78
09.02												3,926.86
09.02.01												1,001.75
09.02.01.01	175.54	m3	38.75	6,802.18	143.16	5,647.45	143.16	143.16	143.16	5,647.45	32.38	1,254.73
09.02.01.01.01	175.54	m3	13.43	2,357.50	24.00	322.32	0.00	0.00	24.00	322.32	151.54	2,035.18
09.02.01.01.02												
09.02.01.02	501.31	m	24.10	12,081.57	352.90	8,504.89	0.00	0.00	352.90	8,504.89	148.41	3,576.68
09.02.01.02.01	127.00	und	75.85	9,632.95	58.00	4,398.30	0.00	0.00	58.00	4,398.30	69.00	5,233.60
09.02.01.02.02	127.00	und	70.46	8,948.42	51.00	3,953.46	0.00	0.00	51.00	3,953.46	76.00	5,354.96
09.03												
09.03.01	618.26	m3	38.75	23,957.58	6.40	248.00	0.00	0.00	6.40	248.00	611.86	23,709.58
09.03.01.01	180.33	m3	45.06	8,125.67	32.75	1,475.72	0.00	0.00	32.75	1,475.72	147.58	6,649.95
09.03.01.02	347.77	m3	13.43	4,670.55	125.50	1,685.47	0.00	0.00	125.50	1,685.47	222.27	2,985.08
09.03.01.03	216.39	m3	17.77	3,845.25	65.07	1,156.29	0.00	0.00	65.07	1,156.29	151.32	2,688.96
09.03.02												
09.03.02.01	858.70	m	79.82	68,541.43	129.90	10,368.62	0.00	0.00	129.90	10,368.62	568.80	47,636.61
09.03.02.02	127.00	m	46.11	5,855.97	42.00	1,938.62	0.00	0.00	42.00	1,938.62	85.00	3,917.35
09.03.02.03	127.00	und	88.65	11,258.55	4.00	354.60	0.00	0.00	4.00	354.60	123.00	10,903.95
10												
10.01												
10.01.01	128.00	und	42.73	55,389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	55,389.44
10.01.02	128.00	und	31.89	4,081.92	38.00	1,211.82	0.00	0.00	38.00	1,211.82	90.00	2,870.10
10.01.03	128.00	und	132.28	16,931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	16,931.84
10.01.04	85	und	11.15	947.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	947.75
10.01.05	245.02	m	61.50	15,253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.02	15,253.23
10.01.06	9	m3	423.01	3,807.09	8.00	1.00	0.00	0.00	8.00	9.00	0.00	0.00
10.01.07	12.00	m3	776.41	9,316.92	4.00	3,105.64	0.00	0.00	4.00	3,105.64	6.00	4,658.46
10.01.08	5.00	und	1,085.58	5,427.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4,552.42
10.01.09	29.00	und	1,680.83	48,744.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	48,744.07
10.02												
10.02.01	182.85	m2	53.70	9,819.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.85	9,819.05
10.02.02	158.96	m2	30.01	4,770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.96	4,770.39
10.02.03	11	und	724.35	7,967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	7,967.85
10.02.04	10.00	und	812.83	8,129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,129.30
10.03												
10.03.01	1	und	2,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00
10.03.02	1.00	und	14,400.00	14,400.00	0.53	9,072.00	0.00	0.00	0.53	9,072.00	0.37	5,328.00
10.03.03	1	und	480.00	4,800.00	0.50	2,400.17	0.13	624.00	0.63	3,033.17	0.37	1,766.83
10.03.04	1.00	und	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,200.00
10.03.05	1	und	7,770.00	7,770.00	0.51	3,982.70	0.13	1,014.10	0.64	4,972.80	0.36	2,797.20
10.04												
10.04.01	233.70	m2	35.94	8,399.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.70	8,399.18
10.04.02	76.00	m2	29.71	2,257.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	2,257.96

000183

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CIP N° 5152

**GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**

PROCESO DE SELECCION CONTRATISTA  
 LICITACION PUBLICA N° 06-2019-CSO GRL  
 CONSORCIO ITAYA

OBRA  
 "MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYA/CA. HUASCAR) DEL AAHH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO"

Region Loreto  
 Provincia Maynas  
 Distrito Belen

Presupuesto Contratado S/. 0.00  
 DEDUCTIVO ADICIONAL MONTO CONTRATUAL S/. 4,756,116.28

Fecha de Inicio de Obra  
 Plazo de Ejecucion  
 1ª Paralización  
 2ª Paralización  
 3ª Paralización

07-Mar-20  
 240 DIAS

Supervisor Residente  
 ING. JOSE CARLOS GOMEZ MEGO  
 ING. EMIGDIO HIDALGO ZEVALLOS

02-Nov-20

**PRESUPUESTO INTEGRAL**

**VALORIZACION MENSUAL N° 62**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ITEM	PRESUPUESTO			AVANCE DE OBRA			AVANCE ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR		
	UND	METRADO	P. UND	AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		Valorizado	%	Valorizado	
				Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado			Metrado	Valorizado
10.05											
10.05.01	m3	34.21	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	34.21	1,325.1
10.05.01.01											
10.05.01.02	m3	33.45	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	33.45	3,018.1
10.05.01.03	m3	42.76	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	42.76	759.1
10.05.02											
10.05.02.01	und	14.00	386.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	14.00	5,404.1
10.05.03											
10.05.03.01	und	28.00	495.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	28.00	13,873.1
10.05.04											
10.05.04.01	m	171.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	171.94	4,632.1
10.05.04.02	m	12.00	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	12.00	604.1
10.05.05											
10.05.05.01	und	2.00	726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2.00	1,452.1
10.05.05.02	und	14.00	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	14.00	4,377.1
10.05.06											
10.05.06.01	und	2.00	1,496.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2.00	2,992.1
10.05.06.02	und	2.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2.00	4,000.1
10.06											
10.06.01	m2	5,421.42	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	5,421.42	11,818.1
10.06.02	und	4.00	865.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4.00	3,462.1
TOTAL GENERAL DIRECTO				1,537,866.65		122,806.82		1,660,375.48			2,493,437.1
GASTOS GENERALES		8.000000000%		332,305.07		9,824.55		332,305.07			139,475.1
UTILIDAD		6.500000000%		289,997.87		7,982.44		289,997.87			162,073.1
PRESUPUESTO TOTAL				4,756,116.28		140,613.81		4,756,116.28			2,854,986.1
UTILIDAD				1,760,516.10		140,613.81		1,760,516.10			1,901,129.93
				37,015.98		2,956.59		37,015.98			0.1
						2.96%					
						39.97%					

PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020

PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

CONSORCIO ITAYA  
 ABILARDO PIOS IZQUIERDO

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
 ING. JOSE CARLOS GOMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISION DE OBRA  
 CIP N° 51541

000182



# PANEL FOTOGRÁFICO



Encofrado de canal

CONSORCIO SUPERVISOR PELEN

*[Signature]*  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MENDOZA  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CIP N° 51521



Estructura de canal

*[Signature]*  
 Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

CONSORCIO ITAYA  
*[Signature]*  
 BERNARDO RIOS ISEDA  
 INGENIERO CIVIL

**URB. FRANCISCO BOLOGNESI D-8 - IQUITOS**  
**Tel. 065 260379**

**E-mail: mgamazonicaeirl@gmail.com**  
**Cel. 941 443 342**





Limpieza de terreno

CONSORCIO ITAYA  
 ABELARDO RIVERA  
 INGENIERO CIVIL



Relleno de sub rasante

Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevalkos  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

URB. FRANCISCO BOLOGNESI D-8 - IQUITOS  
 Tel. 065 260379

CONSORCIO SUPERVISOR DE IEN  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CIP N° 51521

E-mail: mgamazonicaeirl@gmail.com  
 Cel. 941 443 342



Señalización de la calle itaya

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MENDOZA  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CIP N° 51521




Solado para el canal

Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

CONSORCIO ITAYA  
 ALVARO RIOS ISSA  
 M. S. Comun



Limpieza de terreno

CONSORCIO SUPERVISOR RELEN  
  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CIP N° 51521



Verificación del corte de relleno


  
 Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

CONSORCIO ITAYA  
  
 INGENIEROS ISERN



Armadura de canal

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
 SUPERVISOR BELEN  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEDO  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CIP N° 51521

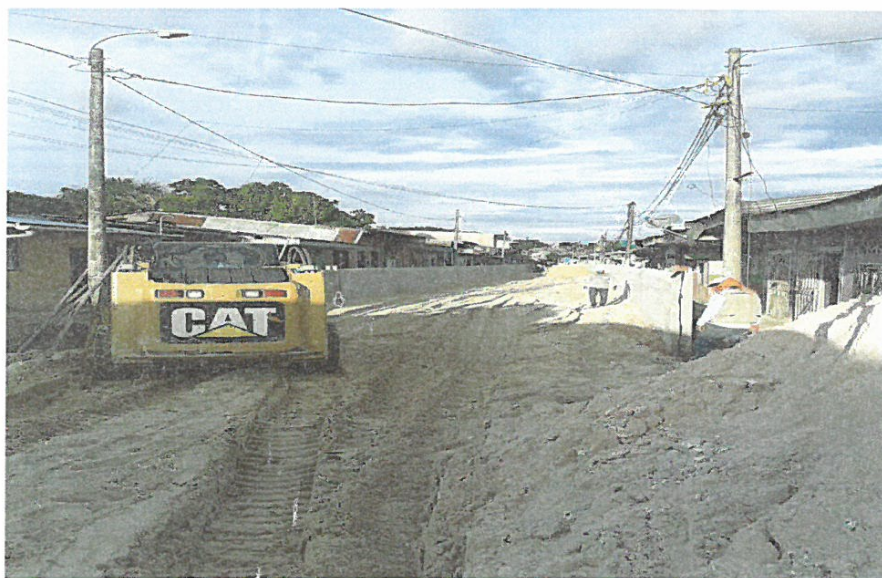

Relleno de pavimentación

Ing. CIP. Emigdio Hualgo Zevallos  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

CONSORCIO ITAYA  
 ABELARDO RIOS IZQUIERDO  
 REPRESENTANTE CONTRATISTA

URB. FRANCISCO BOLOGNESI D-8 - IQUITOS  
 Tel. 065 260379

E-mail: mgamazonicaeirl@gmail.com  
 Cel. 941 443 342



CONSORCIO ITAYA  
ABELARDO RIOS ISERN  
Representante Legal



Instalación de tubos de matriz 250mm

CONSORCIO SUPERVISOR REI EN  
ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MESA  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
CIP N° 51521



Supervisión de corte de relleno

ING. Emigdio Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047



# VALORIZACION

## N.º 7



Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Belén, 17 de febrero del 2021

**CARGO**

Oficio N° 466-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ingeniero Edi Wisberto Ruiz Zárate  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra N°07-  
mes de enero 2021

Obra: "MEJORAMIENTO DEL Jr. ITAYA (AV. PARTICIPACIÓN / CALLE AMAZONAS) Y CALLE UNIÓN ( Jr. ITAYA / CALLE HUASCAR) AA.HH. MANCO BELÉN – MAYNAS – LORETO".

Ref. a: Informe N° 026-2021-GRL/GRI/SGSyC/KAMC  
b. CARTA N° 032-2021-CSB-GRL  
c. CARTA N° 004/2021/CI

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización N° 07. Setenta y cinco mil quince con 69/100 soles (S/ 75,015.69)** aprobada y presentada por el inspector, mediante carta de la referencia a), **correspondiente a enero del 2021**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización N°07 – Enero 2021	S/	131,873.03
Reajuste y Reintegros	S/	0.00
Amortización de Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización de Adelanto de Material	S/	56,857.34
<b>Neto a Pagar</b>	<b>S/</b>	<b>75,015.69</b>

Asimismo, la ejecución de la obra en el periodo de enero del 2021 tiene un avance real ejecutado acumulado 42.75% versus un programado 74.49%, encontrándose la obra en ejecución.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar con el trámite respectivo a **favor del CONTRATISTA CONSORCIO ITAYA conforme** lo detallan los documentos de la referencia.

Atentamente,

Copia: Inspector de Obra  
Ing. dpcl

SGSyC – File de obra (01)

SGSyC – File correlativo (01)

SGSyC – File personal (01)

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. RAÚL FLORES AQUEPUCHO  
Sub Gerente de Supervisión y Control



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

**INFORME N°0026-2021-GRL/GRI/SGSyC/KAMC**

AL : **Ing. Raúl Flores Aquepucho**  
Sub Gerente de Supervisión y Control.

DE : **Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar**  
Coordinador de Obra

ASUNTO : **Conformidad de valorización de Ejecución de Obra N° 07 – Correspondiente al mes de enero 2021** Obra: “Mejoramiento del Jr. Itaya (av. Participación / Calle amazonas) y calle Unión (jr. itaya / calle Huáscar) aa. hh manco inca Belén - Maynas – Loreto

Ejecuta: **CONSORCIO ITAYA**  
Supervisa: **CONSORCIO SUPERVISOR BELEN.**

REFERENCIA: a) Carta N°032/2021-CSB-GRL  
b) Carta N°004/2021/CI

FECHA : **Iquitos, 17 de febrero del 2021.**



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentación presentada por el **SUPERVISOR** de obra referente a la **Valorización de Obra N°07, correspondiente al mes de enero del 2021**, que mediante Proveído N°03676 de la SGSyC, se solicita su revisión, evaluación e informe correspondiente.

**I GENERALIDADES:**

**1.1 DE LA OBRA**

- 1.- Obra : “MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y DE LA CALLE UNION (JR. ITAYA/CA. HUASCAR) DL AAHH. MANCO INCA, DISTRITO BELEN, PROVINCIA MAYNAS, REGION LORETO”.
- 2.- Ubicación :
  - Distrito : **Belén**
  - Provincia : **Maynas**
  - Departamento : **Loreto**
- 3.- Financiamiento : **Recursos Ordinarios.**
- 4.- Modalidad de Concurso : **Licitación Pública**
- 5.- Sistema de Contratación : **A precios unitarios**
- 6.- Modalidad de Ejecución : **Por Contrata**
- 7.- Fecha de Concurso : **14 de enero del 2020**
- 8.- Contratista : **CONSORCIO ITAYA**

**1.2 DE LA SUPERVISION**

- 1. Tipo de Proceso : **Concurso Publico N° 009-2019-CSO-GRL**
- 2. Consultor Supervisor : **CONSORCIO SUPERVISOR BELEN.**





“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU:200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

3. Jefe de Supervisión : **ING. CIVIL JOSE CARLOS GOMEZ MEGO.**
4. Contrato : **Contrato de Consultoría de Obra N° 013-2020-GRL-GGR-GRI**
5. Fecha del Contrato : **12 de febrero del 2020**
6. Monto del Contrato : **S/. 358,148.00 Soles, Sin IGV**
7. Plazo Contractual del Servicio: **270 Días Calendario**
8. Modalidad del Contrato : **A Suma Alzada**

**1.3 DEL CONTRATISTA**

1. Tipo de Proceso : **Licitación Publica N° 006-2019-CSO-GRL (Primera Convocatoria).**
2. Fecha de Concurso : **14 de enero del 2020**
3. Contrato : **N° 016-2020-GRL-GGR-GRI.**
4. Contratista : **CONSORCIO ITAYA.**
5. Fecha de Suscrip. Contrato : **20 de febrero del 2020**
6. Rep. Común del Contratista : **Abelardo Ríos Isern**
7. Residente de Obra : **Ing. Civil Emigdio Hidalgo Zevallos CIP N° 74047**
8. Monto Contratado : **S/. 4'756,116.28 Soles, Sin Inc. IGV**
9. Fecha de presupuesto Exp. Técnico : **Febrero del 2020**
10. Aprobación del expediente técnico : **R. G. G.R N° 268-2019-GRL-GGR (22/05/2019)**
11. Acta Entrega Terreno/P/Ejec. Obra : **06 de marzo del 2020.**
12. Adelanto Directo Total : **:**
13. Fecha Adelanto Directo : **:**
14. Adelanto de Materiales : **S/. 1'189,029.07 Soles.**
15. Fecha Adelanto de Materiales : **28 de octubre 2020**
16. fecha de Inicio del Plazo Contractual : **07 de marzo de 2020.**
17. Plazo de Ejecución de Obra : **240 Días Calendarios**
18. Fecha de Término del Plazo Contractual : **01 de noviembre de 2020**
19. %Avance Físico al mes : **2.77 %.**
20. %Avance Físico Acumulado : **42.75 %.**
21. %Avance Programado al mes : **25.84 %.**
22. %Avance Programado Acumulado : **74.49 %.**
23. Situación Actual de la Obra : **En ejecución atrasada.**

**1.3 DEL COORDINADOR**

Coordinador : **Ing.kenyo Alberto Montes Cuellar**

**1). ANTECEDENTES**

- El 14 de enero de 2020, el comité de selección adjudico la buena pro de la LICITACIÓN PUBLICA N° 006-2019-CSO-GRL, para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “**MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y LA CALLE UNION (JR. ITAYA / CA. HUSCAR) DL AA.HH. MANCO INCA, DEL DSTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO**”.
- El 20 de febrero del 2020 se firmó el Contrato de Ejecución de Obra N° 016-2020-GRL-GGR-GRI, entre la empresa contratista **CONSORCIO ITAYA** y el **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**, fijándose en dicho documento las cláusulas contractuales y legales para la ejecución de la obra



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

**“MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y LA CALLE UNION (JR. ITAYA / CA. HUSCAR) DL AA.HH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO”.**

- Con 06 de marzo de 2020 se procedió a realizar EL **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO**, a cargo del Gobierno Regional de Loreto.
- Con fecha 07 de marzo de 2020 se dio inicio al plazo contractual de la ejecución de obra, hasta el 01 de noviembre de 2020. Ejecutando las partidas de Obras Provisionales, Trabajos Preliminares y Seguridad y Salud.
- **Mediante Carta N°007/2021/CI** (04 de febrero del 2021), el Contratista presenta al Supervisor la Valorización de Ejecución de Obra N° 07, correspondiente al mes enero 2021, en la cual hace de conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:
  1. Copia de Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
  2. Copia de Contrato de Obra
  3. Copia del Acta de Entrega de Terreno.

**DOCUMENTACIÓN TECNICA:**

1. Copia de Contrato de Consorcio
2. Copia de comprobantes de pago emitidos por la Oficina de Ejecutiva de Tesorería y Documento que sustente la transferencia electrónica de fondos a la cuenta del Proveedor:
  - Adelantos Directos
  - Adelantos de Material
3. Cuadro de Resumen de pagos y Amortizaciones de los adelantos a la fecha valorizada de corresponder, visado por el supervisor o inspector
4. Copia de la Fórmula Polinómica del expediente Técnico
5. Calendario Actualizado del Programa de Valorización
6. Documento que acredite el control de calidad de las partidas Valorizadas en el mes
7. Certificado y/o reporte que acredite la habilidad vigente del residente
8. Pagos de Tributos del mes Valorizado:
  - SENCICO
  - ES-SALUD
  - ONP y/o AFP
  - SCTR
  - CONAFOVICER
  - Copia de Plantilla de Jornales
  - Copia de Declaración PDT-SUNAT
  - Copia de RNP
9. Copia visada de Cuaderno de Obra

M



**“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

10. Relación técnica del personal de acuerdo a la propuesta de las especialidades y el porcentaje de participación
11. Panel Fotográfico
12. Expediente de Valorización
13. Factura Electrónica
14. Informe de conformidad de Valorización emitida por la Subgerencia de Supervisión y Control
15. Copia de Cartas Fianza Vigentes

**DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:**

1. Certificado de habilidad
2. Copia de cartas fianzas
  - a. Fiel cumplimiento
3. Copia de calendario de obra vigente

**1. ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA**

Según Asiento del cuaderno de obra **N°322 de fecha 31/01/2021**, anotada por el residente, donde indica los Metrados ejecutados en el periodo, correspondiente a la valorización para su REVISION y CONFORMIDAD por parte del Supervisor con la finalidad de elaborar el informe de Valorización N°07

Asiento del cuaderno de obra **N° 323 de fecha 31/01/2021**, el Supervisor de obra, indica de los trabajos ejecutados por el contratista. Así mismo, manifiesta que da conformidad a los Metrados correspondientes del 01 al 20 de enero del 2021 y autoriza la elaboración de la valorización de obra N°07 correspondiente al mes de enero del 2021. Revisando

**CONTROL ECONÓMICO**

**- Presupuesto de Obra.**

Val. N7 OBRA: “MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y LA CALLE UNION (JR. ITAYA / CA. HUSCAR) DL AA.HH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO”	
Total del Costo Directo Resumen	S/. 4,153,813.34
Gastos Generales (8 %)	S/. 332,305.07
Utilidad (6.5 %)	S/. 269,997.87
<b>Total Presupuesto de Infraestructura</b>	<b>S/. 4,756,116.28</b>
<b>IGV (18%)</b>	<b>0.00</b>
<b>Presupuesto Total</b>	<b>S/. 4,756,116.28</b>



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

**2. CONTROL DE AVANCE DE OBRA**

VALORIZACION	Nº 07	FECHA : Enero 2021
OBRA	"MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYA/CA HUASCAR) DEL AAHH. MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO"	
PROPIETARIO	A Precios Unitarios	
CONTRATISTA	CONSORCIO ITAYA	
FECHA PTO. REFERENCIAL	FEB. 2019	
PRESUP. REFERENCIAL	S/. 4,776,885.34	sin IGV
PRESUP. OFERTADO	S/. 4,756,116.28	sin IGV
<b>HOJA DE LIQUIDACION</b>		
1. VALORIZACION Nº 07 - Enero 2021		
Monto Bruto		(a) 131,873.03
Amortización		
Adelanto Directo (10.00%)	-	
Adelanto por Materiales (Según D.S. Nº 079-VC, Ampliatorias y Modificatorias)	56,857.34	
	<u>56,857.34</u>	75,015.69
2. REAJUSTES DE LA VALORIZACION Nº 07		
Monto Bruto		(b) -
Deducción de reajuste que no corresponde		
- Del adelanto directo	-	
- Del adelanto por materiales	<u>-</u>	(b) -
		<u>-</u>
3. REGULARIZACION DE REAJUSTE VAL. Nº 07		
Monto Bruto		(c) -
Deducción de reajuste que no corresponde		
- Del adelanto directo	-	
- Del adelanto por materiales	<u>-</u>	(c) -
		<u>-</u>
4. TOTAL A PAGAR		
	75,015.69	2) Valorización Nº 05
		Deducción de reajuste que no corresponde
	<u>75,015.69</u>	4) TOTAL A PAGAR
5. SENCICO		
(a)+(b)+(c)	131,873.03 x 2/1000	S/. 263.75
DE ACUERDO AL D.S. Nº006-88-VC (12-05-88); Art. 2 ESTABLECE QUE LA FIRMA CONTRATISTA TIENE OBLIGACION DE ACREDITAR PREVIAMENTE ESTAR AL DIA EN EL PAGO DE SUS APORTACIONES AL SEGURO SOCIAL PARA DAR PASE A SU CANCELACION (Art. 4 D.L. 20024 de fecha 22-05-73)		

M



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”


**3. CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION DE OBRA**

GRÁFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES DE OBRA - VAL N° 07  
PROGRAMADO VS EJECUTADO

Obra :	MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACIÓN / CA. AMAZÓNAS) Y CALLE UNIÓN (JR. ITAYA /CA. HUASCAR) DEL AA.HH MANCO INCA, DEL DISTRITO DE BELÉN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
Ubicación :	DISTRITO DE DE BELÉN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

FECHA	PRESUPUESTO OBRA				PRESUPUESTO VALORIZADO				AVANCE / ATRAZO		
	PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	%	% ACUM.	EJECUTADO	ACUMULADO EJECUTADO	%	% ACUM.	RESPECTO A LO PROGRAMADO ACUMULADO		
									%	DESCRIP	
INICIO	MARZO 2020	-	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
VAL N° 01	MARZO 2020	8,537.83	8,537.83	0.18%	0.18%	8,775.99	8,775.99	0.18%	0.18%	0.01%	ADELANTADO
VAL N° 02	AGOSTO 2020	17,283.74	25,821.57	0.36%	0.54%	609,687.78	609,463.77	12.63%	12.81%	12.27%	ADELANTADO
VAL N° 03	SETIEMBRE 2020	202,326.57	228,148.14	4.25%	4.80%	336,248.70	945,712.47	7.07%	19.68%	15.09%	ADELANTADO
VAL N° 04	OCTUBRE 2020	264,144.79	492,292.93	5.55%	10.35%	445,531.89	1,391,244.36	9.37%	29.25%	18.90%	ADELANTADO
VAL N° 05	NOVIEMBRE 2020	702,682.11	1,194,975.04	14.77%	25.13%	253,265.72	1,644,510.08	5.33%	34.58%	9.45%	ADELANTADO
VAL N° 06	DICIEMBRE 2020-1	559,493.91	1,754,468.95	11.76%	36.89%	116,044.19	1,760,554.27	2.44%	37.02%	0.13%	ADELANTADO
VAL N° 06	DICIEMBRE 2020-2	559,493.91	2,313,962.86	11.76%	48.65%	140,613.81	1,901,168.06	2.96%	39.97%	-8.68%	ATRASADO
VAL N° 07	ENERO 2021	1,228,833.85	2,983,302.80	25.84%	74.49%	131,873.03	2,033,041.11	2.77%	42.75%	-31.74%	ATRASADO
VAL N° 08	FEBRERO 2021	681,388.10	3,664,690.90	14.33%	88.82%						
VAL N° 09	MARZO 2021	347,600.59	4,012,291.49	7.31%	96.12%						
VAL N° 10	ABRIL 2021	184,330.88	4,196,622.37	3.88%	100.00%						
TOTAL		4,756,116.28		100.00%		2,033,041.11					

GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES  
PROGRAMADO VS EJECUTADO

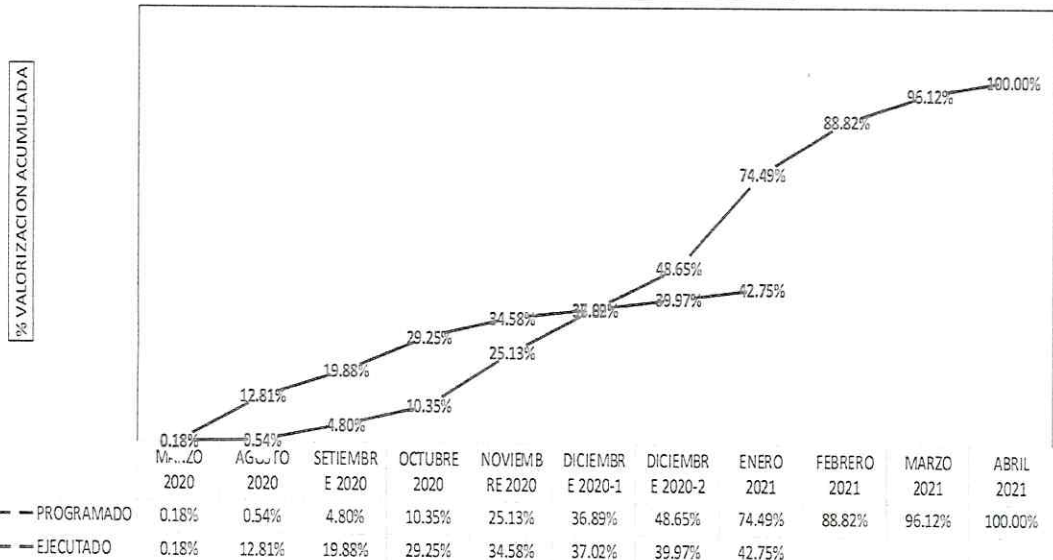



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

**4. CONCLUSIONES:**

- La presente documentación materia de su revisión, consta con los requerimientos y sustentos que derivan a la presente valorización descritos en el ítem 3. Contenido de la Documentación.
- En la documentación, se adjuntan las boletas de pagos realizados a **SENCICO**, **CONAFOVICER**, de acuerdo al porcentaje que estima la legislación vigente, pago de póliza **SCTR**.
- El avance físico del mes es:

- Avance Físico del mes (enero -2021) .....	2.77 %
- Avance Físico Acumulado.....	42.75%
- Avance Físico Prog del mes.....	25.84 %
- Avance Físico Prog.acum.....	74.49%

**La obra en mención tiene un avance físico mensual acumulado al mes de enero de 2021 de 42.75 %, siendo el estado de la obra ATRASADA.**

**5. RECOMENDACIONES:**

- El Supervisor indica que la obra en mención tiene un avance físico mensual de 2.77 % y un acumulado de 42.75 % de su avance EJECUTADO con un avance programado acumulado de 74.49 %, por lo que la obra, se encuentra atrasada en (31.74%), por lo que Está por debajo del avance acumulado programado por ende el porcentaje acumulado real esta es menor al 80% del porcentaje acumulado programado para el mes de enero 2021, por tanto, de conformidad con el artículo 203, numeral 203.1 se le ordena al contratista ejecutor de obra CONSORCIO ITAYA, a presentar un nuevo calendario de avance de obra valorizado, el cual contemple la aceleración de los trabajos.
- Cabe indicar, el contratista presenta la valorización N°07 del 01 al 20 de enero del 2021 y según la carta N°036-2021- CSB-GRL con fecha (04-02-2021) de la SUPERVISION, donde pide inicio de actividades para ejecución de obra, en vista que la obra fue paralizada con fecha 20-01-2021.
- Los metrados han sido conciliados por el Residente y Supervisor de Obra por lo mismo que Da Conformidad a la Valorización N°07 (Mediante la Carta N°038/2021-CSB-GRL, cuyos metrados fueron autorizados mediante el asiento del cuaderno de obra N°323 – Del Supervisor), de la obra “MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CA. AMAZONAS) Y LA CALLE UNION (JR. ITAYA / CA. HUSCAR) DL AA.HH. MANCO INCA, DEL DSTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO”.
- Visto la Carta N°038/2021-CSB-GRL de la Valorización N°07 correspondiente al mes de enero del 2021 y dado la conformidad por el Supervisor de obras, por el monto neto de s/ 75,015.69 (setenta y cinco mil quince y 69 /100 soles) sin IGV, a la empresa CONSORCIO ITAYA, teniendo el siguiente detalle:



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

1 Valorización N°06 diciembre del 2020	S/.	131,873.03
2 Reajuste y Reintegros	S/.	0.00
3 Amortización de Adelanto Directo	S/.	0.00
4 Amortización de Adelanto para Materiales	S/.	56,857.34
5 <b>Neto Facturar</b>	<b>S/.</b>	<b>75,015.69</b>

- Se recomienda derivar la presente documentación, a la Gerencia Regional de Infraestructura, previa revisión considerando que ya ha sido dada la conformidad por parte del Supervisor, cabe indicar que dicha valorización fue presentada por el Supervisor el 15-02-2021, por lo que no ha presentado en el plazo correspondiente exhortar al Supervisor para que pueda presentar en los plazos establecidos RLCE vigente; además se recomienda continuar con su trámite correspondiente cumpliendo con los plazos establecidos en el Art.194 Valorizaciones y Metrados de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento modificada por el Decreto Legislativo N°1444 y aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente

  
KENYO ALBERTO  
MONTES CUELLAR  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 193722

Ing. KENYO ALBERTO MONTES CUELLAR  
Coordinador de Obra  
Sub Gerencia de Supervisión y  
Control

Cc: Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar

Trámite: 03676

299

# CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

csb

Calle Pablo Rosell N° 906 – Iquitos – Maynas - Loreto

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Señores:  
Gobierno Regional de Loreto  
Av. Abelardo Quiñones Km 1.5 – Belén  
Atención.-  
Gerencia Regional de Infraestructura  
Sub Gerencia de Supervisión y Control

CARTA N° 038-2021-CSB-GRL  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
15 FEB 2021  
12.47 pm

Iquitos, 05 FEB 2021  
3676  
15 FEB 2021  
Hora: Fecha: CONTROL

ASUNTO : Aprobación y Remisión de VALORIZACION DE OBRA N° 07 - Obra: "Mejoramiento del Jr. Itaya [Av. Participación / Ca. Amazonas] y la Calle Unión [Jr. Itaya / Ca. Huáscar] del AA.HH Manco Inca, del Distrito de Belén – Maynas - Loreto"  
REFERENCIA : A) Informe N° 017-2021-CSB/JSO-JCGM  
B) Contrato N° 013-2020-GRL-GGR-GRI – Contratación de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Jr. Itaya [Av. Participación / Ca. Amazonas] y la Calle Unión [Jr. Itaya / Ca. Huáscar] del AA.HH Manco Inca, del Distrito de Belén – Maynas - Loreto"  
16 FEB 2021  
Fecha: 03676 Hora: 10:46 AM  
N° Reg:

De mi mayor consideración:

Mediante la presente me dirijo a Usted, con la finalidad de saludarle y a la vez remitir a su despacho la VALORIZACION DE OBRA N° 07 ENERO 2021 de la obra mencionada en el asunto, en vista que esta ha sido aprobada por nuestra representada a través del Jefe de Supervisión de Obra según el informe de la referencia A], el mismo que corresponde a un monto de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 07 ENERO 2021		
a)	Valorización de Obra N° 07	S/ 131,873.03
b)	Reajustes y Reintegros	S/ 0.00
c)	Amortización por Adelanto Directo	S/ 0.00
d)	Amortización por Adelanto de Materiales	S/ [56,857.34]
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>		<b>S/ 75,015.69</b>

Cabe resaltar que dicha Remisión y Aprobación de la Valorización de obra en mención, es en virtud al cumplimiento de los Términos de Referencia para la ejecución del Servicio de Consultoría de Obra – Supervisión de Obra, mencionada en la referencia B]; y al artículo 194, numeral 194.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que deberá ser cancelada de conformidad con el artículo mencionado precedentemente.

Sin otro particular me despido de Usted no sin antes agradecerle su atención a la presente.

Atentamente.

PROVEIDOR N° 03676  
A Iva Kenyo Montes

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
SR. JORGE CAMILO RUIZ ROJAS  
REPRESENTANTE COMÚN

PROVEIDO N° 3676  
A SASUC - Q2  
MIRA Trámite Loreto  
GRL



298

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

INFORME N° 017-2021-CSB-GRL/JSO-JCGM

Al	:	Ing. Jorge Camilo Ruiz Rojas – Representante Común Consortio Supervisor Belén
Del	:	Ing. José Carlos Gómez Mego – Jefe de Supervisión de Obra Consortio Supervisor Belén
Asunto	:	Aprobación y Remisión de Valorización de Obra N° 06 [I] – 06 [II] – Obra: “Mejoramiento del Jr. Itaya [Av. Participación / Ca. Amazonas] y la Calle Unión [Jr. Itaya / Ca. Huáscar] del AA.HH Manco Inca, del Distrito de Belén – Maynas - Loreto”
Referencia	:	Carta N° 007-2021/CI [04/02/2021]
Fecha	:	

A) ANTECEDENTES

- ✓ Con fecha 20/02/2020, se suscribió el Contrato N° 016-2020-GRL-GGR, para la ejecución de la obra mencionada en el asunto, entre el Gobierno Regional de Loreto y la empresa contratista ejecutor de obra Consortio Itaya conformado por [Becerra Hnos. Contratistas Generales SAC – Constructora e Inmobiliaria Amazónica EIRL], por un monto de [S/ 4’756,116.28] – Sin Incluir IGV, y un plazo de ejecución de [240] días calendario.
- ✓ Con fecha 12/02/2020, se suscribió el Contrato N° 013-2020-GRL-GGR-GRI, para la Supervisión de la ejecución de la obra mencionada en el asunto, entre el Gobierno Regional de Loreto y la empresa consultora supervisor de obra Consortio Supervisor Belén conformado por [Gómez Mego José Carlos y Correa López Jean Paul], por un monto de [S/ 358,148.00] – Sin Incluir IGV y un plazo de ejecución de [270] días calendario.
- ✓ Mediante Carta N° 143-2020-GRL-GRI-SGSyC, de fecha 28/02/2020, se comunica a la supervisión Consortio Supervisor Belén, iniciar sus funciones cuando la obra inicie su ejecución; de acuerdo al artículo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y que en representación de la entidad se proceda a la entrega de terreno en el lugar de la citada obra, en cumplimiento al artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- ✓ Con fecha 06/03/2020, se procedió a la entrega de terreno, de conformidad con lo descrito en el párrafo precedente, y en el mismo acto de entrega se determinó que el inicio el plazo de ejecución empieza el día 07/03/2020.
- ✓ Con fecha 15/03/2020, se promulgó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el Decreto Supremo que declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, por lo que se Declara el Estado de

297

Emergencia Nacional por el plazo de quince [15] días calendario, y dispóngase el aislamiento social obligatorio [cuarentena], por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19 .

- ✓ Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 051-2020-PCM de fecha 27/03/2020, se decreta en su artículo 1: Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM por el término de Trece [13] días calendario, a partir del 31/03/2020 .
- ✓ Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 064-2020-PCM de fecha 10/04/2020, que indica en su artículo 1: Prorroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado temporalmente mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y precisados por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM y N° 068-2020-PCM, por el termino de Catorce (14) días calendario, a partir del 13/04/2020 hasta el 26/04/2020.
- ✓ Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 075-2020-PCM de fecha 23/04/ 2020 decreta en su artículo 1: Prorroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM; y precisados o modificados por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, por el termino de Catorce [14] días calendario, a partir de 27/04/2020 hasta el 10/05/2020.
- ✓ Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 083-2020-PCM de fecha 10/05/2020 que decreta en su artículo 1: Prorroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM, y N° 075-2020-PCM; y precisados o modificados por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 072-2020-PCM, por el termino de Catorce [14] días calendario, a partir del 11/05/2020 hasta el 24/05/2020.
- ✓ Con fecha 10/05/2020, se promulga en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1486, en la Disposiciones Complementarias Transitorias. **“Segunda. Reactivación de obras públicas contratadas conforme al régimen general de contrataciones del estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”.**
- ✓ Con fecha 19/05/2020, el Organismo Supervisor de las Contrataciones [OSCE], publica la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, **“Alcances y Disposiciones para la Reactivación de Obras Públicas y Contratos de Supervisión, en el marco de la Segunda Disposición complementaria transitoria del decreto legislativo N° 1486”.**
- ✓ Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 094-2020-PCM de fecha 23/05/2020 decreta en su artículo 2: Prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM, y N° 075-2020-PCM; y precisados o modificados por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, por el termino de Treinta y Siete [37] días calendario, a partir del 25/05/2020 hasta el 30/06/2020.

- ✓ Con fecha 04/06/2020, se promulga en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Decreto Supremo que Aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas, dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM.
- ✓ Mediante Resolución Gerencial Regional N° 048-2020-GRL-GRI, de fecha 13/07/2020, se aprueba las siguientes Ampliaciones de Plazo:

ETAPA	AMPLIACION DE PLAZO
A] Ampliación de Plazo por Paralización del Estado de Emergencia	95 [Días Calendario]
B] Ampliación de Plazo por la Re Movilización de Personal y Equipos como las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo para la prevención y control frente a la propagación del COVID 19	15 [Días Calendario]
C] Ampliación de Plazo para Culminar los trabajos de Saldo de Obra	25 [Días Calendario]

- ✓ Mediante Carta N° 011-2020/CI, de fecha 27/07/2020, el Consorcio Itaya, solicita el reinicio de actividades con adecuaciones del ambiente de trabajo e implementación del Plan Covid19, RM N° 448-2020-MINSA, con fecha 03/08/2020.
- ✓ Mediante Carta N° 010-2020-CSB-GRL, de fecha 30/07/2020, la Supervisión de Obra: Consorcio Supervisor Belén, traslada la solicitud mencionada en el párrafo precedente, a la entidad para su aprobación y posterior verificación por parte de esta última.
- ✓ Mediante Carta N° 0371-2020-GRL-GRI-SGSyC, de fecha 03/08/2020, la entidad Gobierno Regional de Loreto, acepta el Reinicio de Plazo contractual de obra, de conformidad con la Directiva N° 005-2020-OSCE.

**B] BASE LEGAL**

Los alcances del presente informe y de los actuados administrativos para la ejecución de la Supervisión de Obra, se enmarcan en la Ley de Contrataciones del Estado, y que los artículos más resaltantes a aplicarse son los siguientes:

- ✓ De acuerdo al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o a través de terceros. El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.

Para iniciar la ejecución de una obra que requiera Supervisión, puede designarse un Inspector de Obra o un Equipo de Inspectores en tanto se contrata la Supervisión.

- ✓ El artículo 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, define que, durante la ejecución de la obra, se cuenta de modo permanente y directo, con un Inspector o con un Supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra.
- ✓ Que de acuerdo al artículo 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, define que la Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del Inspector o Supervisor según corresponda, quién es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución

técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.

El Inspector o el Supervisor, según corresponda, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, lo señalado, su actuación se ajusta al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

El contratista brinda al Inspector o Supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales están estrictamente relacionadas con esta.

- ✓ Por otro lado, el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaborados el último día de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista. Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro los plazos que establezca el contrato.

El plazo máximo de aprobación por el Inspector o el Supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente.

**C] ALCANCES PARA EL DESARROLLO DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

Obra	:	"Mejoramiento del Jr. Itaya [Av. Participación / Ca. Amazonas] y la Calle Unión [Jr. Itaya / Ca. Huáscar] del AA.HH Manco Inca, del Distrito de Belén – Maynas - Loreto"		
Ubicación	:	Distrito: Belén	Provincia: Maynas	Región: Loreto
Sistema de Contratación	:	A Precios Unitarios		
Procedimiento de Selección	:	Licitación Pública N° 006-2019-CSO-GRL		
Presupuesto Referencial	:	S/ 5'636,724.70 [Incluido IGV]		
Presupuesto Contratado	:	S/ 4'756,116.28 [Sin Incluir IGV]		
Fecha del Presupuesto Referencial	:	Febrero de 2019		
Fecha Firma de Contrato	:	20/02/2020		
Plazo de Ejecución de Obra	:	240 Días Calendario		
Adelanto Directo	:	_____		
Adelanto para Materiales	:	_____		
Fecha de Pago de Adelanto Directo	:	_____		

# CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

Calle Pablo Rosell N° 906 – Iquitos – Maynas - Loreto

295  
CSB

Fecha de Pago de Adelanto de Materiales	:	_____
Fecha de Entrega de Terreno	:	07/03/2020
Fecha de Inicio Contractual de Obra	:	07/03/2020
Fecha de Paralización de Obra	:	15/03/2020
Ampliación de Plazo N° 01	:	135 [Días Calendario]
Nueva Fecha de Inicio de Obra	:	03/08/2020
Nueva Fecha de Término Contractual	:	15/04/2021
Ingeniero Residente de Obra	:	Ing. Emigdio Hidalgo Zevallos – CIP N° 74047
Supervisor de Obra	:	Consortio Supervisor Belén [Jefe de Supervisión de Obra – Ing. José Carlos Gómez Mego – CIP N° 51521]
Ejecutor de Obra	:	Consortio Itaya [Becerra Hnos. Contratistas Generales SAC – constructora e Inmobiliaria Amazónica EIRL]

## D) DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE VALORIZACION DE OBRA

De conformidad con las directivas internas del Gobierno Regional de Loreto, las valorizaciones de obras deberán contener como mínimo los siguientes documentos:

- ✓ Datos Generales de la Obra
- ✓ Informe del Ingeniero Residente
- ✓ Hoja de Liquidación
- ✓ Valorización
- ✓ Calendario Valorizado Actualizado
- ✓ Planilla de Metrados de Mes
- ✓ Cuadro de Avance de Obra
- ✓ Copia de Contrato de Obra
- ✓ Copia del Acta de Entrega de Terreno.
- ✓ Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente
- ✓ Copia de las Garantías Vigentes
- ✓ Copia de la Fórmula Polinómica
- ✓ Copia de Comprobantes de Pago de SENCICO, CONAFOVICER Y SCTR
- ✓ Copia de Cuaderno de Obra
- ✓ Panel Fotográfico
- ✓ Ensayos de Laboratorio [Resistencia a la Compresión – Densidad de Campo]

Mediante documento de la referencia, el contratista alcanza a la supervisión la documentación sustentatoria de la VALORIZACIÓN N° 07 – ENERO 2021, por lo que se pudo evidenciar que dicha valorización, contiene todos los documentos mencionados precedentemente por lo que la documentación contenida es conforme, de acuerdo a el monto valorizado.

294

E] ANALISIS

En virtud al control efectuado por el suscrito en el lugar de la obra, se han verificado los metrados realmente ejecutados por el contratista, habiéndose cuantificado y APROBADO los metrados para la VALORIZACION N° 07, correspondiente al mes de ENERO 2021, luego de efectuada la revisión al procedimiento de cálculo de los montos consignados en la Valorización en mención, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación presentada.

En consecuencia y en conformidad con lo mencionado en el párrafo precedente, el suscrito APRUEBA el monto y el pago de la VALORIZACION N° 07 – ENERO 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 07 – ENERO 2021			
a]	Valorización de Obra N° 07	S/	131,873.03
b]	Reajustes y Reintegros	S/	0.00
c]	Amortización por Adelanto Directo	S/	0.00
d]	Amortización por Adelanto de Materiales	S/	[56,857.34]
MONTO NETO A PAGAR		S/	75,015.69

La obra tiene un avance acumulado al mes de ENERO 2021 del 42.75%, y el avance acumulado programado indica 74.49 %, por lo tanto, la obra está **ATRAZADA** en [31.74%], por lo que está por debajo del avance acumulado programado. Cabe resaltar que el porcentaje acumulado Real, es menor al 80% del porcentaje acumulado programado para el mes de Enero 2021, por tanto, de conformidad con el artículo 203, numeral 203.1 se le ordena al contratista ejecutor de obra CONSORCIO ITAYA, a presentar un nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado, el cuál contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra, dentro del plazo previsto, para lo cual se anotó en el cuaderno de obra mediante asiento N° 324, de fecha 01/02/2021.

F] CONCLUSIONES

La obra tiene un avance acumulado al mes de ENERO 2021 del 42.75%, y el avance acumulado programado indica 74.49 %, por lo tanto, la obra está **ATRAZADA** en [31.74%], por lo que está por debajo del avance acumulado programado. Cabe resaltar que el porcentaje acumulado Real, es menor al 80% del porcentaje acumulado programado para el mes de Enero 2021, por tanto, de conformidad con el artículo 203, numeral 203.1 se le ordena al contratista ejecutor de obra CONSORCIO ITAYA, a presentar un nuevo Calendario de Avance de Obra Valorizado, el cuál contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra, dentro del plazo previsto, para lo cual se anotó en el cuaderno de obra mediante asiento N° 324, de fecha 01/02/2021.

Se advierte que conforme se establece en el artículo 194.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.

En virtud a la documentación y cálculos presentados, se concluye que es procedente efectuar el pago al contratista: **Consortio Itaya** conformado por [Becerra Hnos. Contratistas Generales SAC – Constructora e Inmobiliaria Amazónica EIRL], de acuerdo al siguiente detalle:

293

# CONSORCIO SUPERVISOR BELEN


CSB

Calle Pablo Rosell N° 906 – Iquitos – Maynas - Loreto

RESUMEN VALORIZACIÓN N° 07 – ENERO 2021			
a]	Valorización de Obra N° 07	S/	131,873.03
b]	Reajustes y Reintegros	S/	0.00
c]	Amortización por Adelanto Directo	S/	0.00
d]	Amortización por Adelanto de Materiales	S/	[56,857.34]
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>		<b>S/</b>	<b>75,015.69</b>

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.

  
CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
CIP N° 5152









CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL J.R. ITAYA 48% PARTICIPACIONICA, AMAZONAS Y LA CALLE UNION (J.R. ITAYAICA, HUASCAR)  
 UBICACION: DISTRITO DE BELÉN, MAYNAS - LORETO  
 FECHA: 15/05/2020  
 PLAZ. E.JEC. 280 d c

CODIGO	DESCRIPCION	PLAZO DE EJECUCION 265 (dias calendario)												TOTAL (285 DIAS) ACUMULADO					
		MARZ-06 DIAS	AGO (28 dias)	SE (30 dias)	OCT (31 dias)	NOV (30 dias)	DIC (31 dias)	ENE (31 dias)	FEB (28 dias)	MAR (31 dias)	ABR (30 dias)	MAY (31 dias)	JUN (30 dias)						
05.01.03.10	PRUBA HIDRAULICA DE TUBERIAS					1.570,74													3.926,86
05.02	OBRAS DE DESAGUE																		
05.02.01	RED DE DESAGUE AUXILIAR																		
05.02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
05.02.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS			1.360,44		2.040,65													6.802,18
05.02.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO			471,50		707,25													2.357,50
05.02.01.02.01	RED DE DESAGUE AUXILIAR																		
05.02.01.02.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP Ø=6"			1.208,16		6.040,79													12.081,57
05.02.01.02.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCOPVC SAP Ø=6" Y 90°			963,30		4.816,48													9.632,95
05.02.01.02.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC SAP Ø=6"			894,84		4.474,21													8.948,42
05.03	RED DE DESAGUE SANITARIO																		
05.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
05.03.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS			2.395,76		11.978,79													23.957,56
05.03.01.02	CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS			812,57		4.082,84													6.125,67
05.03.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO			467,06		2.335,28													3.642,28
05.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCESIVO F. PMD DISTANCIA MINIMA DE 2cm - 20% estacionamiento					1.922,63													66.841,43
05.03.02	RECONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE																		5.653,97
05.03.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø 250mm CHD			34.270,72		34.270,72													68.541,43
05.03.02.02	REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA SISTEMA RESIDUAL TUB. PVC UF 160mm.			5.629,26		5.629,26													11.258,55
05.03.02.03	DAÑO DE MORTERO TUBERIA VENTANA																		
10	VARIA																		
10.01	VARIA LOS COMPLEMENTARIOS																		
10.01.01	REUBRICACION Y MUYLACION DE CAJAS REACTIVADORAS TIPO I			27.684,72		27.684,72													55.369,44
10.01.02	REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE PVC Ø 1/2"			2.040,56		2.040,56													4.081,92
10.01.03	REPOSICION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA RESIDUALES			6.465,92		6.465,92													16.937,84
10.01.04	REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE TUBERIA PVC UF 90mm C-10			473,88		473,88													947,75
10.01.05	REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLO PVC CORRUGADO UF 50mm			7.626,62		7.626,62													15.253,23
10.01.06	DEMOLICION DE MUROS DE BIZONES HASTA NIVEL DE RASANTE			1.903,55		1.903,55													3.807,09
10.01.07	ENDAMADO DE MUROS DE BIZONES HASTA NIVEL DE RASANTE			4.658,46		4.658,46													9.316,92
10.01.08	REPOSICION DE CAJAS DE VALVULAS			2.713,95		2.713,95													5.427,90
10.01.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCOS TIPO COLONIAL																		48.744,07
10.02	SEÑALIZACION																		
10.02.01	PINTADO SOBRE SARDINEL COLOR AMARILLO																		9.819,05
10.02.02	SENALES CURVAS Y RECTAS COLORES AMARILLO																		4.770,39
10.02.03	SEÑALIZACION RESTRICTIVA OCTOGONAL DE 1,50m x 0,80m																		7.967,85
10.02.04	SENALES PREVENTIVAS DE LADO DE 0,8m x 1,50m																		8.129,30
10.03	MITIGACION AMBIENTAL																		
10.03.01	ELABORACION IMPLEN Y ADMINIS. DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO			2.000,00		2.000,00													2.000,00
10.03.02	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL			7.200,00		7.200,00													14.400,00
10.03.03	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD			960,00		960,00													4.600,00
10.03.04	PROGRAMA DE CONTINGENCIA EN LA ETAPA DE LA CONSTRUCCION			650,00		650,00													4.600,00
10.03.05	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD			3.885,00		3.885,00													7.170,00
10.04	JARDINERIA																		
10.04.01	SEMBRADO DE GRASS EN AREAS VERDEES																		8.389,18
10.04.02	SEMBRADO DE PLANTONES																		2.287,98
10.05	INSTALACIONES ELECTRICAS																		
10.05.01	INSTALACION DE TIERRAS Y ZANJAS																		
10.05.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS																		1.325,64
10.05.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO																		3.018,53
10.05.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCESIVO A UNA DISTANCIA MINIMA DE 2cm - 20% estacionamiento																		759,85
10.05.02	POSTES																		

  
 Abelardo Rios Isern  
 Representante Legal  
 CONSORCIO ITAYA

  
 Ing. José Carlos Gómez Mego  
 Jefe de Sección División de Obra  
 CIP-N° 61621

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

  
 CONSORCIO ITAYA  
 ABELARDO RIOS ISERN  
 Representante Común



000012



# PANEL FOTOGRÁFICO



27 ene. 2021 9:37:07 a. m.  
18M 692854 9582975  
795 Participación  
R. 9 de Octubre Etapa 4  
Iquitos  
Maynas  
Loreto

CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
*[Signature]*  
ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
CIP N° 51621



29 ene. 2021 4:07:09 p. m.  
18M 692857 9582945  
819 Participación  
Iquitos  
Maynas  
Loreto

Proceso constructivo de canal fluvial

*[Signature]*  
ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

CONSORCIO ITAYA  
*[Signature]*  
ABELARDO RIOS ISEBNI  
Representante Común



Solado de la calle itaya



28 ene 2021 10:08:40 a. m.  
18M.692873.9582934  
795 Participación  
Pj.9 de Octubre Etapa 4  
Iquitos  
Maynas

CONSORCIO SUPERVISOR DELEN

ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEOO  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
CIP N° 81521



28 ene 2021 10:10:02 a. m.  
18M.692883.9582926  
819 Participación  
Iquitos  
Maynas  
Loreto

Proceso constructivo de la calle itaya

*[Signature]*  
Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

CONSORCIO ITAYA  
*[Signature]*  
ABELARDO RÍOS ISERN  
Representante Común



Solado de la calle unión



CONSORCIO SUPERVISOR BELEN

*[Signature]*  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MERO  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CIP N° 51521



Armadura de canal de la calle itaya

*[Signature]*  
 Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

CONSORCIO ITAYA  
*[Signature]*  
 ABELARDO RIOS ISERN  
 Representante Comunal



Proceso constructivo de canal fluvial



27 ene. 2021 7:56:14 a. m.  
+51 692833 9582969  
811 Participación  
Iquitos  
Maynas  
Loreto

CONSORCIO SUPERVISOR SFL EN

ING. JOSÉ CARLOS GOMEZ MEGO  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
CIP N° 51521



21 ene. 2021 8:12:46 a. m.  
+51 692833 9582969  
811 Participación  
Iquitos  
Maynas  
Loreto

Proceso constructivo de canal fluvial

Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

CONSORCIO ITAYA  
ABELARDO RIOS ISERN  
Representante Común



### Limpieza de terreno



CONSORCIO SUPERVISOR TEFEN  
  
 ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MEGO  
 JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
 CIP N° 51821



### Conexiones de tubería para desagüe de 200mm de la calle unión

Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

CONSORCIO ITAYA  
  
 ABELARDO RÍOS ISERN  
 Representante Contratista



000007



### Armadura de buzón de la calle itaya



CONSORCIO SUPERVISOR BELEN  
ING. JOSÉ CARLOS GÓMEZ MENDOZA  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA  
CIP N° 51521



Ing. CIP. Emigdio Hidalgo Zevallos  
INGENIERO CIVIL  
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 74047

CONSORCIO ITAYA  
ABELARDO RIOS IZQUIERDO  
Representante Común
