

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA
DE LA I.E.I.P. N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE
OBRA REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO

CONTRATISTA CONSORCIO REQUENILLO

PAGO AL CONTRATISTA (NETO A PAGAR)

ADELANTO, Valorizacion, Reajustes, Adicionales, Materiales, etc

FECHA	CONCEPTO	MONTOS	
		PARCIAL	TOTAL
28-feb-20	Adelanto Directo	S/. 660,644.43	S/. 660,644.43
27-abr-20	Adelanto de Materiales	S/. 1,321,288.85	S/. 1,321,288.85
29-feb-20	Valorizacion N° 01	S/. 630,412.17	
	Reajuste Valorizacion N° 01	S/. 7,666.67	
	I.G.V.	S/. 114,854.19	S/. 752,933.03
15-mar-20	Valorizacion N° 02	S/. 300,915.07	
	Reajuste Valorizacion N° 02	S/. 3,966.49	
	I.G.V.	S/. 54,878.68	S/. 359,760.24
31-ago-20	Valorizacion N° 03	S/. 418,081.83	
	Reajuste Valorizacion N° 03	S/. 9,813.20	
	I.G.V.	S/. 77,021.11	S/. 504,916.14
30-sep-20	Valorizacion N° 04	S/. 477,277.48	
	Reajuste Valorizacion N° 04	S/. 11,171.13	
	I.G.V.	S/. 87,920.75	S/. 576,369.36
31-oct-20	Valorizacion N° 05	S/. 379,323.19	
	Reajuste Valorizacion N° 05	S/. 4,787.34	
	I.G.V.	S/. 69,139.90	S/. 453,250.43
30-nov-20	Valorizacion N° 06	S/. 257,131.26	
	Reajuste Valorizacion N° 06	(S/. 8,662.01)	
	I.G.V.	S/. 44,724.47	S/. 293,193.72
31-dic-20	Valorizacion N° 07	S/. 398,748.67	
	Reajuste Valorizacion N° 07	(S/. 1,833.34)	
	I.G.V.	S/. 71,444.76	S/. 468,360.09
31-ene-21	Valorizacion N° 08	S/. 374,972.43	
	Reajuste Valorizacion N° 08	S/. 27,471.50	
	I.G.V.	S/. 72,439.91	S/. 474,883.84
28-feb-21	Valorizacion N° 09	S/. 0.00	
	Reajuste Valorizacion N° 09	S/. 0.00	
	I.G.V.	S/. 0.00	S/. 0.00
04-mar-21	Valorizacion N° 10	S/. 0.00	
	Reajuste Valorizacion N° 10	S/. 0.00	
	I.G.V.	S/. 0.00	S/. 0.00
			S/. 5,865,600.13

Jose Luis Bendayan Miguel

OBRA DE LA I.E.I.P. N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE

CONTRATISTA CONSORCIO REQUENILLO

DEDUCCIONES AL CONTRATISTA (CARGADAS A LA OBRA)

Bonos, Fondo de garantía, Amortizaciones de adelanto de materiales e impuestos al BANMP.

FECHA	CONCEPTO	MONTOS	
		PARCIAL	TOTAL
29-feb-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 82,654.04	
29-feb-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 0.00	S/. 82,654.04
15-mar-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 39,453.31	
15-mar-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 0.00	S/. 39,453.31
31-ago-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 236,000.00	
31-ago-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 104,213.09	S/. 340,213.09
30-sep-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 92,104.59	
30-sep-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 265,753.87	S/. 357,858.46
31-oct-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 57,411.76	
31-oct-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 69,104.47	S/. 126,516.23
30-nov-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 153,020.73	
30-nov-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 153,396.39	S/. 306,417.12
31-dic-20	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 0.00	
31-dic-20	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 165,200.00	S/. 165,200.00
31-ene-21	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 0.00	
31-ene-21	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 118,000.00	S/. 118,000.00
28-feb-21	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 0.00	
28-feb-21	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00
04-mar-21	Amortizacion Adelanto en Efectivo	S/. 0.00	
04-mar-21	Amortizacion Adelanto Materiales	S/. 0.00	S/. 0.00
			S/. 1,536,312.25


 Jose Luis Bendayan Miguel
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colg. Ingenieros N° 44674

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P. N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO

OBRA

CONTRATISTA CONSORCIO REQUENILLO

VALOR REFERENCIAL	S/. 6,606,444.26 (INC. I.G.V.)
PRESUPUESTO CONTRATADO	S/. 6,606,444.26 (INC. I.G.V.)
FECHA PRESUPUESTO BASE	jun-19
INICIO PLAZO DE EJECUCION	17 DE FEBRERO DEL 2,020
PLAZO DE EJECUCION	180 DIAS CALENDARIO
VENCIMIENTO PLAZO DE EJECUCION INICIAL	15 DE AGOSTO DEL 2,020
AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO	170 D.C. R.G.R. N° 068-2020-GRL-GRI
FECHA DE REINICIO DE OBRA	05 DE AGOSTO DEL 2020
NUEVA FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL	04 DE MARZO DE 2021
AVANCE DE OBRA DEL MES	8.48%
AVANCE ACUMULADO	81.07%

FECHA	PROGRAMADO		REAL	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
29-feb-20	826,540.40	826,540.40	826,540.40	826,540.40
15-mar-20	394,533.09	1,221,073.49	394,533.09	1,221,073.49
31-ago-20	593,514.13	1,814,587.62	833,549.65	2,054,623.14
30-sep-20	674,044.32	2,488,631.94	921,045.88	2,975,669.02
31-oct-20	653,365.23	3,141,997.17	574,117.59	3,549,786.61
30-nov-20	699,478.92	3,841,476.09	609,832.00	4,159,618.61
31-dic-20	722,239.57	4,563,715.66	635,723.42	4,795,342.03
31-ene-21	931,651.25	5,495,366.91	560,467.47	5,355,809.50
28-feb-21	860,927.39	6,356,294.30		
04-mar-21	250,149.96	6,606,444.26		

NOTA.- El presente Calendario deberá adjuntarse a toda solicitud de pago por Valorización sin cuyo requisito no se dará trámite a la misma, bajo responsabilidad del Ingeniero Supervisor, quien deberá en su informe pronunciarse sobre la marcha de la programación contractual, en toda Valorización.

Mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 068-2020-GRL-GRI, de fecha 20.JUL.2020, aprueba la solicitud de Ampliación excepcional de plazo a favor del CONSORCIO REQUENILLO, por 170 días calendario, siendo la nueva fecha de reinicio de obra el 05.AGO.2020. A la vez mediante CARTA N° 380-2020-GRL-GRI-SGSyC de fecha 06.AGO.2020, aprueba el Nuevo calendario Valorizado Actualizado.

Handwritten initials and signature.

CURVA DE AVANCE DE OBRA

AD GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

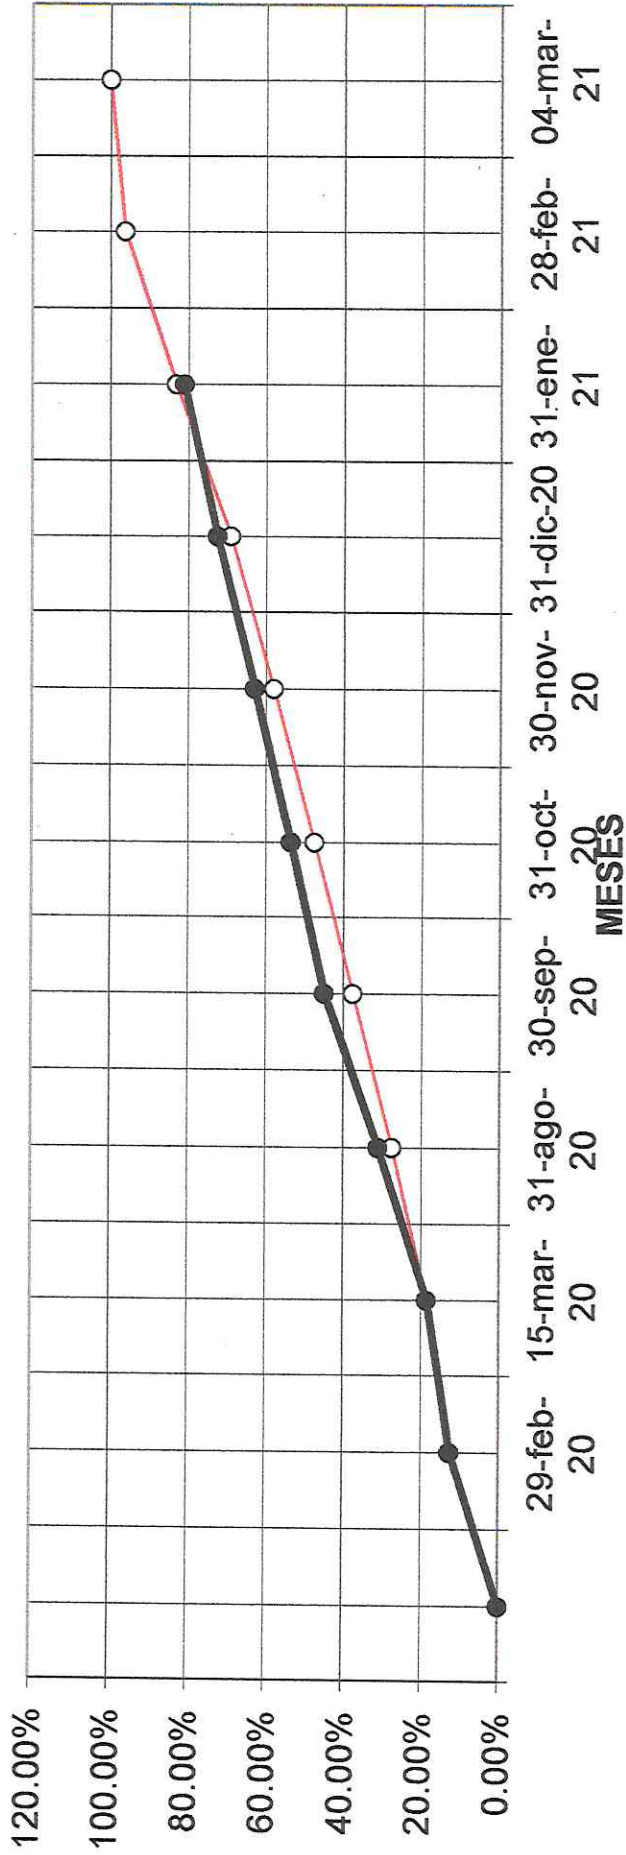
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA
I.E.I.P. N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA,
DEPARTAMENTO DE LORETO

RATISTA CONSORCIO REQUENILLO

REVISOR : ING° JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL


NO. CONT. SI. 6,606,444.26

SITUACION ACTUAL DE LA
OBRA
OBRA ATRASADA



-○- PROGRAMADO ●- REAL

ENTAJE	MESES											
	29-feb-20	15-mar-20	31-mar-20	30-sep-20	30-oct-20	30-nov-20	31-dic-20	31-ene-21	28-feb-21	04-mar-21		
AVANCE	0.00%	18.48%	27.46%	37.66%	47.55%	58.14%	69.07%	83.17%	96.20%	100.00%		
REAL	0.00%	18.48%	31.10%	45.04%	53.73%	62.96%	72.59%	81.07%	81.07%	81.07%		


 Jose Luis Bendayan Miguel
 INGENIERO CIVIL
 Reg. Colg. Ingenieros N° 44674

RESUMEN

VALORIZACION N° 08 - AL 31 ENERO DEL 2021

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E.I.P. N°60640, BARRIO REQUENILLO, CIUDAD DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA, DEPARTAMENTO DE LORETO

OBRA

CONTRATISTA	CONSORCIO REQUENILLO	REGION	LORETO
RESIDENTE	ING° YENY VARGAS CABANILLAS	DPTO.	LORETO
JEFE DE SUPERVISION	ING° JOSE LUIS BENDAYAN MIGUEL	PROV.	REQUENA
PRESUPUESTO CONTRATADO	SI. 6,606,444.26	DISTRITO	REQUENA
FECHA DE INICIO DE OBRA	17 DE FEBRERO DEL 2,020	LUGAR	REQUENA
PLAZO DE EJECUCION	180 DIAS CALENDARIO		
FECHA TERMINO CONTRAC. INICIAL	15 DE AGOSTO DEL 2,020		
AMPLIAC. EXCEPCIONAL DE PLAZO	170 D.C. R.G.R. N° 068-2020-GRL-GRI		
NUOVA FECHA TERMINO CONTRAC.	04 DE MARZO DE 2021		

CUADRO COMPARATIVO DEL CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA


VALORIZACION MENSUAL	PROGRAMADO						REAL			
	NUMERO VALORIZ.	PERIODO DEL	AL	MONTO		AVANCE		MONTO ACUMUL.	AVANCE PARCIAL	AVANCE ACUMUL.
				PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.			
01	17-feb-20	29-feb-20	826,540.40	826,540.40	12.51%	12.51%	826,540.40	12.51%	12.51%	
02	01-mar-20	15-mar-20	394,533.09	1,221,073.49	5.97%	18.48%	1,221,073.49	5.97%	18.48%	
03	05-ago-20	31-ago-20	593,514.13	1,814,587.62	8.98%	27.46%	2,054,623.14	12.62%	31.10%	
04	01-sep-20	30-sep-20	674,044.32	2,488,631.94	10.20%	37.66%	2,975,669.02	13.94%	45.04%	
05	01-oct-20	31-oct-20	653,365.23	3,141,997.17	9.89%	47.55%	3,549,786.61	8.69%	53.73%	
06	01-nov-20	30-nov-20	699,478.92	3,841,476.09	10.59%	58.14%	4,159,618.61	9.23%	62.96%	
07	01-dic-20	31-dic-20	722,239.57	4,563,715.66	10.93%	69.07%	4,795,342.03	9.62%	72.59%	
08	01-ene-21	31-ene-21	931,651.25	5,495,366.91	14.10%	83.17%	5,355,809.50	8.48%	81.07%	
09	01-feb-21	28-feb-21	860,927.39	6,356,294.30	13.03%	96.20%				
10	01-mar-21	04-mar-21	250,149.96	6,606,444.26	3.80%	100.00%				

SI. 5,495,366.91

SI. 5,355,809.50
97.46%

CONCLUSION: Como se puede observar del cuadro comparativo, se concluye que la obra se encuentra atrasada respecto al Cronograma de Avance Valorizado Programado.

Mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 068-2020-GRL-GRI, de fecha 20.JUL.2020, aprueba la solicitud de Ampliacion excepcional de plazo a favor del CONSORCIO REQUENILLO, por 170 dias calendarios, siendo la nueva fecha de reinicio de obra el 05.AGO.2020. A la vez mediante CARTA N° 380-2020-GRL-GRI-IGSyC de fecha 06.AGO.2020, aprueba el Nuevo calendario Valorizado Actualizado.


Jose Luis Bendayan Miguel
INGENIERO CIVIL
Reg. Cdlg. Ingenieros N° 44674

413



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Iquitos, 04 de febrero del 2021

CARTA N°003-2021-CONSORCIOREQUENILLO

Señores,
CONSORCIO CONSULTOR B&P
Calle Távara - 442 - Iquitos

Atención:
Jefe de Supervisión
Ing. José Luis Bendayan Miguel
Presente. -

Asunto: **REMITO VALORIZACIÓN DE OBRA N°08 – ENERO 2021**

Referencia: Obra: "Mejoramiento del servicio educativo en los niveles de inicial y primaria de la I.E.I.P N°60640, Barrio Requeno, Ciudad de Requena, Distrito de Requena, Provincia de Requena, Departamento de Loreto"

De mi especial consideración;


Por la presente, le saludo muy cordialmente y al mismo tiempo, en aplicación del art. 194° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, remitimos a vuestro despacho la **Valorización de obra N°08 – ENERO 2021**; para su evaluación, aprobación y trámite correspondiente, siendo el monto formulado lo siguiente:

Valorización del MesS/	474,972.43 (+)
Reajuste neto (+)S/	27,471.50 (+)
Amortización por Adelanto directo (-)S/	0.00 (-)
Amortización Adelanto de Materiales (-)S/	100,000.00 (-)
Neto a FacturarS/	402,443.93
I.G.V 18%S/	72,439.91 (+)
Total, Neto a PagarS/	474,883.84

Cabe precisar que la presente Valorización de Obra N°08 asciende a la suma de **Cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y tres y 84/100 (S/ 474,883.84)**

Sin otro particular y agradeciendo su amable atención, quedamos de usted.

Atentamente.


 CONSORCIO REQUENILLO
 JUAN E. VARGAS CABANILLAS
 REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO CONSULTOR B&P

Ing. José Luis Bendayan Miguel
REPRESENTANTE LEGAL

04/02/2021
