



"AÑO DEL BICENTENARIO PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Belén, 14 de abril de 2021

CARGO

Oficio n. ° 1073-2021-GRL/GRI/SGSyC

Ing.Mg.
Artemio del águila Panduro.
Gerente Regional de Infraestructura.
Presente.



Asunto: Conformidad valorización N°06 – de obra-
Correspondiente al Mes de Marzo (22 al 31) - 2021.

Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA IBERIA TRUJILLO Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA - DISTRITO DE TRAPICHE-PROVINCIA DE REQUENA-DEPARTAMENTO DE LORETO".

Ref.: a). Informe N° 096-2021-GRL-GRI-SGSyC-DPCL
b). Carta N°022-2021-C.S.IBERIA

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización n° 06, por EJECUCION de obra**, que asciende a la suma **S/ 82,780.50 Soles (Ochenta y dos mil setecientos ochenta con 50/100 soles) sin IGV**, presentado por el supervisor de la obra y su conformidad mediante la referencia b), **correspondiente al mes febrero de 2021**, de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización monto bruto n°06 (22 al 31 de marzo del 2021)	S/	526,318.78
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización Adelanto para Materiales	S/	- 443,538.28
Neto Facturar	S/.	82,780.50

Asimismo, la obra al mes de marzo de 2021, tiene un avance físico acumulado del 92.42%, versus el calendario programado de **97.18%**, siendo el estado de la obra **ATRASADA** y en ejecución.

Por lo tanto, encontrándose conforme la documentación que sustenta el supervisor, se solicita continuar con el trámite respectivo a favor de **CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L**

Atentamente.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
[Signature]
Ing. RAUL FLORES AQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: Coordinadora de Obra
Ing. Diana Paola Castro Litano
SGSyC – File de obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)



"AÑO DEL BICENTENARIO PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

INFORME N° 096-2021-GRL-GRI-SGSyC-DPCL

AL : Raúl Flores Aquepucho
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.

DE : DIANA PAOLA CASTRO LITANO.
INSPECTOR DE OBRA.

ASUNTO : Remito informe de Valorización de Obra N°06- **Correspondiente (PERIODO 22 AL 31) del mes de marzo de 2021**
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA IBERIA TRUJILLO Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA - DISTRITO DE TRAPICHE-PROVINCIA DE REQUENA-DEPARTAMENTO DE LORETO".

REFERENCIA: a) Carta N°022-2021-C.S.IBERIA
b) informe: 011-2021-MJFN/JS
TRAMITE: 07659

FECHA : Iquitos, 14 de abril de 2021.



*Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informar a su despacho, sobre la documentación presentada por el Inspector de obra referente a la **Valorización de Obra N°06**, correspondiente al mes de marzo de 2021, que mediante Proveído N°07659 de la SGSyC, se solicita su revisión e informe correspondiente.*

1. DATOS GENERALES

Nombre de la obra : "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA IBERIA TRUJILLO Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA - DISTRITO DE TRAPICHE-PROVINCIA DE REQUENA-DEPARTAMENTO DE LORETO".

Ubicación : Localidad de Iberia - Tapiche-Requena-Loreto

Entidad : Gobierno Regional de Loreto

Contrato : N° 018-2020-GRL-GGR-GRI

Firma de Contrato : 10 de Junio del 2020

Valor Contratado : S/. 4,630,854.69

Valor Referencial : S/. 5,059,595.67

Ubicación : Localidad de Iberia

Otorgamiento de Buena Pro : 17/03/2020

Plazo Contratado : 150 días Calendarios

Modalidad de Ejecución : A suma Alzada.

Adelanto Directo : S/463,086.00

Adelanto de Materiales (20%) : No Solicito.

Entrega de Terreno : 31/08/2020

Fecha Inicio plazo : 09 de septiembre de 2020.

Fecha termino de Plazo : 05 de febrero del 2021.

Residente de Obra : Ing Lan Caballero Nashnate

Inspector de Obra : Ing. Diana Paola Castro Litano



“AÑO DEL BICENTENARIO PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

1. Antecedentes

Mediante la Licitación Publica N°001-2020-CSO-GRL (Primera Convocatoria), se firmó el Contrato N°018-2020-GRL-GGR-GRI (10/06/2020), de la Obra descrita líneas arriba.

Mediante Carta N°048-2020-CCGEIRL-LCN-GG(17/06/2020), **La Empresa CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L**, representado por su titular Gerente LAN CABALLERO NASHNATE, solicita adelanto Directo 10% para la ejecución de la Obra, por el monto de ascendente a s/463,085.46(Cuatrocientos sesenta y tres mil ochenta y cinco con 46/100 soles), por lo que adjunta su Carta Fianza N°220300933 emitida por **INSUR S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, con su respectiva factura E001-103 y documentación correspondientes, en concordancia con lo establecido en el artículo N°181 del RLC que rige esta contratación.

Mediante Carta N°072-2020-CNE-MLT-RC de fecha 16/09/2020, la empresa CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, presentó el Calendario de Avance de OBRA ACTUALIZADO, Programa de Ejecución de Obra Actualizado, Calendario de Adquisición Actualizado y Calendario de Equipos Actualizado, teniendo como fecha de Inicio de obra el 09/09/2020.

Con Carta N° **022-2021-C.S.IBERIA (13/04/2021)**, el **CONSORCIO SUPERVISOR IBERIA**, presenta la Valorización de Obra N° 06 – correspondiente al mes de **marzo - 2021**, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de S/. 526,318.78 Soles.

Handwritten mark

1. CONTROL DE AVANCE DE OBRA

*El Residente de Obra manifiesta en su informe que el avance de obra presentado para la Valorización N°06 Marzo del 2021, que su porcentaje de avance de obra programado es de 3.08% mientras que su porcentaje de avance de obra ejecutado es de 11.37%, su porcentaje de avance de obra programado acumulado es de 97.18% mientras que su porcentaje de avance de obra acumulado ejecutado es de 92.42%, lo cual indica que la obra se encuentra **ATRASADA**.*

Montos y/o porcentajes valorizados programados				
Días plazo	Nuevos soles		Porcentajes	
	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
0d	0.00	0.00	0.00%	0.00%
22d	716,460.74	716,460.74	15.47%	15.47%
53d	1,219,975.87	1,936,436.61	26.34%	41.82%
83d	1,028,936.96	2,965,373.57	22.22%	64.04%
114d	1,056,603.20	4,021,976.77	22.82%	86.85%
145d	335,573.11	4,357,549.88	7.25%	94.10%
173d	0.00	4,357,549.88	0.00%	94.10%
204d	142,534.92	4,500,084.80	3.08%	97.18%
216d	130,769.89	4,630,854.69	2.82%	100.00%
	4,630,854.69		100.00%	




"AÑO DEL BICENTENARIO PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Montos y/o porcentajes valorizados ejecutados

Días plazo	Nuevos soles		Porcentajes	
	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
0d	0.00	0.00	0.00%	0.00%
22d	1,091,877.31	1,091,877.31	23.58%	23.58%
53d	852,268.15	1,944,145.46	18.40%	41.82%
83d	907,328.18	2,851,473.64	19.59%	61.58%
114d	674,754.37	3,526,228.01	14.57%	76.15%
145d	227,273.49	3,753,501.50	4.91%	81.05%
173d	0.00	3,753,501.50	0.00	81.05%
204d	526,318.78	4,279,820.28	11.37%	92.42%
216d				
	4,279,820.28			

CURVA DE AVANCE PROGRAMADO Vs. EJECUTADO (CURVA "S")

reemplazar curva actualizada

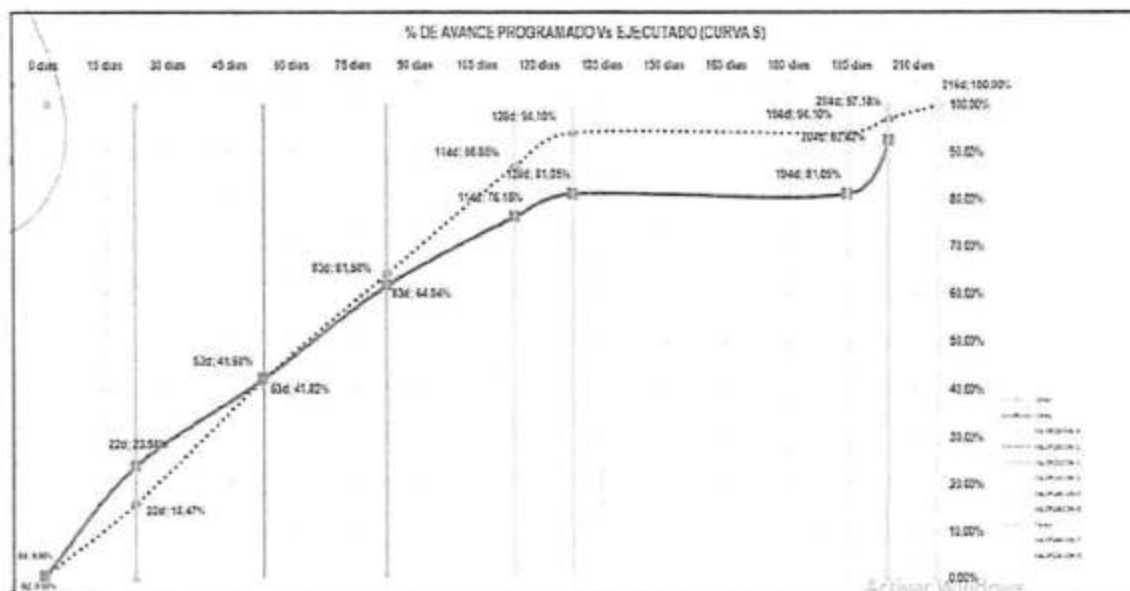

La Valorización de Obra N° 06– correspondiente al mes de marzo- 2021, cuenta con la documentación correspondiente, para lo cual se realizó la compatibilización de metrados aprobados por el Inspector de la obra en el cuaderno de obra, con la Valorización de obra presentada de acuerdo a lo siguiente:



"AÑO DEL BICENTENARIO PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		AVANCE			SALDO
		Und.	Metrado	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
				Metrado	Metrado	Metrado	
01.00	OBRAS PROVISIONALES						
01.01	CARTEL DE OBRA DE 4.80 X 2.60 m. GIGANTOGRAFIA Cibast. De madera 2"x2"	und	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
01.02	ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINA	mes	5.00	4.50	0.25	4.75	0.25
01.03	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1.00X2.00X1.20 m Inc. Tarrajeo	und	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
01.04	TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	ton	1,205.41	1178.68	65.27	1,243.95	61.46
02.00	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA						
02.01	ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	0.90	0.10	1.00	0.00
02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	1.00	0.90	0.10	1.00	0.00
02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	und	1.00	0.90	0.10	1.00	0.00
02.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE E	und	1.00	0.90	0.10	1.00	0.00
02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	und	1.00	0.90	0.10	1.00	0.00
03.00	OBRAS PRELIMINARES						
03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	8,701.38	8701.38	0.00	8,701.38	0.00
03.02	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	8,701.38	8701.38	0.00	8,701.38	0.00
03.03	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE DE MORTERO SIMPLE	m2	1,775.20	1775.20	0.00	1,775.20	0.00
03.04	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN OBRA	m	1,836.04	1836.04	0.00	1,836.04	0.00
04.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
4.01	CORTES Y EXCAVACIONES						
04.01.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE CON HERRAMIENTAS MANUALES	m3	4,759.98	4759.98	0.00	4,759.98	0.00
04.01.02	CORTE DE TERRENO MANUAL EN VEREDA	m3	572.76	0.00	572.76	572.76	0.00
04.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA A 100 M.	m3	6,478.80	5944.04	534.76	6,478.80	0.00
4.02	NIVELACIONES						
04.02.01	REFINE Y NIVELACION A NIVEL DE SUB RASANTE	m2	6,741.07	6741.07	0.00	6,741.07	0.00
04.02.02	REFINE Y NIVELACION DE TERRENO PARA VEREDAS	m2	1,960.31	0.00	1960.31	1,960.31	0.00
05.00	PAVIMENTO RIGIDO						
05.01	SUB BASE DE PAVIMENTO CON ARENA, E=0.40 M. Inc. Compactacion	m3	2,202.25	2202.25	0.00	2,202.25	0.00
05.02	BASE DE MORTERO 1:8 PARA PAVIMENTO RIGIDO E=0.10 m	m3	523.27	523.27	0.00	523.27	0.00
05.03	LOSA DE RODADURA F'c=210kg/cm2 E=0.20 m	m3	1,101.62	1090.90	10.72	1,101.62	0.00
05.04	UÑAS EN PAVIMENTO MORTERO F'c=210 kg/cm2	m2	137.70	136.96	0.74	137.70	0.00
05.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA	m2	1,500.02	1356.24	143.78	1,500.02	0.00
05.06	CURADO DE LOSA DE RODADURA, durante 7 dias- 4 veces x dias	m2	5,508.12	5454.48	53.64	5,508.12	0.00
05.07	JUNTAS DE DILATACION 1"X8" @ 9.00	m	636.00	0.00	636.00	636.00	0.00
05.08	JUNTAS DE CONTRACCION 1"X2"	m	1,200.04	0.00	1200.04	1,200.04	0.00
05.09	JUNTAS DE ARTICULACION LONGITUDINAL 1"X2"	m	918.02	0.00	918.02	918.02	0.00
05.10	JUNTA LATERAL DE CONSTRUCCION 1"X8"	m	1,836.04	0.00	1836.04	1,836.04	0.00
05.11	PASADORES DE FIERRO CORRUGADO D=5/8" PARA JUNTA DE ARTICULACION LONGITUD	kg	2,565.00	2299.07	265.93	2,565.00	0.00
05.12	PASADORES DE FIERRO CORRUGADO D=5/8" PARA JUNTA DE CONTRACCION	kg	3,163.00	2832.49	330.51	3,163.00	0.00
05.13	PASADOR DE FIERRO LISO D=5/8" PARA JUNTA DE DILATACION	kg	1,583.00	1418.25	164.75	1,583.00	0.00
05.14	ESPIGAS DE FIJACION CON TUBO PVC 3/4"	kg	2,041.00	1920.91	120.09	2,041.00	0.00
06.00	VEREDA						
06.01	CAMA DE ARENA ANTICONTAMINANTE EN VEREDA e=0.10m	m3	176.64	0.00	76.03	76.03	100.61
06.02	Solado de mortero 1:3 (c.a), e= 2"	m2	1,960.31	0.00	762.24	762.24	1,197.07
06.03	VEREDA, E=0.10m, MORTERO F'c= 175 kg/cm2, acabado con brocha de canto y transversal	m3	211.97	0.00	91.24	91.24	120.73
06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	1,130.41	0.00	486.55	486.55	643.86
06.05	JUNTA DE DILATACION EN VEREDA CON MEZCLA DE ASFALTO Y ARENA @ 3.00m	m	705.60	0.00	0.00	0.00	705.60
06.06	CURADO DE LOSA DE VEREDA, durante 7 dias- 4 veces x dias	m2	2,119.70	0.00	912.38	912.38	1,207.32
07.00	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE						
07.01	SARDINEL						
7.01.01	MORTERO F'c=175kg/cm2	m3	211.97	72.71	93.99	166.70	45.27
7.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL	m2	1,787.03	601.14	792.35	1,393.49	393.54
7.01.03	FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" Inc. 5% desp.	kg	8,705.00	2684.64	3859.66	6,544.30	2,160.70
7.01.04	TARRAJEO PULIDO EN SARDINELES	m2	529.93	176.58	234.96	411.52	118.41
7.01.05	JUNTA DE DILATACION 1" @ 9.00m EN SARDINEL	m	117.76	0.00	0.00	0.00	117.76
07.02	CUNETAS						
07.02.01	CAMA DE ARENA ANTICONTAMINANTE EN CUNETA e=0.05m	m3	62.99	17.65	22.59	40.24	22.75
07.02.02	MORTERO F'c=175kg/cm2	m3	90.09	30.64	39.94	70.58	19.51
07.02.03	FIERRO CORRUGADO Ø 3/8" Inc. 5% desp.	kg	6,924.37	2109.63	3070.18	5,179.81	1,744.56

Página 1

BA



"AÑO DEL BICENTENARIO PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

07.02.04	TARRAJEO PULIDO EN CUNETAS	m2	918.54	33.66	407.27	440.93	477.61
07.02.05	JUNTA DE DILATACION 1" @ 9.00m EN CUNETAS	m	102.06	0.00	0.00	0.00	102.06
08.00	SISTEMA PARA ALCANTARILLA EMISOR DE AGUAS PLUVIALES						
08.01	OBRAS PRELIMINARES						
08.01.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m2	616.78	616.78	0.00	616.78	0.00
08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
08.02.01	CORTES Y EXCAVACIONES						
08.02.01.01	EXCAVACION PARA ALCANTARILLA EMISOR DE AGUAS PLUVIALES	m3	1,229.36	1229.36	0.00	1,229.36	0.00
08.02.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES	und	125.30	125.30	0.00	125.30	0.00
08.02.01.03	EXCAVACION MANUAL PARA SUMIDERO	und	69.25	27.54	14.84	42.38	26.87
08.02.01.04	EXCAVACION DE ZANJA PARA CONEXION DE SUMIDERO	m3	195.02	195.02	0.00	195.02	0.00
08.03	NIVELACIONES						
08.03.01	REFINE Y NIVELACION EN ZANJA DE ALCANTARILLA DE AGUAS PLUVIALES	m2	624.78	624.78	0.00	624.78	0.00
08.03.02	REFINE Y NIVELACION EN CONEXIONES DE SUMIDERS	m2	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00
08.04	RELLENOS						
08.04.01	RELLENO EN ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES CON ARENA	m3	280.25	280.25	0.00	280.25	0.00
08.04.02	RELLENO PARA CONEXION DE SUMIDERO CON ARENA	m3	75.15	75.15	0.00	75.15	0.00
08.04.03	CAMA DE ARENA EN 15 M	m3	93.72	93.72	0.00	93.72	0.00
08.05	SUMIDEROS						
08.05.01	SUMIDERO PARA DRENAJE PLUVIAL (INC. REJILLA)	und	94.00	37.00	29.00	65.00	29.00
08.05.02	CONEXION DE SUMIDERO A RED DE DESAGUE D=200mm, con tuberia PVC D=160mm	und	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
08.06	DISIPADOR						
08.06.01	Solado 1:10, C.A e= 2"	m2	3.62	0.00	0.00	0.00	3.62
08.06.02	MORTERO F'c = 175 Kg/cm2, VACEADO CON CARRETILLA	m3	3.98	0.00	0.00	0.00	3.95
08.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	13.54	0.00	0.00	0.00	13.54
08.06.04	Acero Corrugado Ø 1/2" Fc = 4200 Kg/cm2 + 5% desperdicio	kg	144.13	0.00	0.00	0.00	144.13
08.06.05	TARRAJEO PULIDO	m2	13.54	0.00	0.00	0.00	13.54
08.07	SISTEMA DE DESAGUE						
08.07.01	SISTEMA PARA ALCANTARILLA EMISOR DE AGUAS PLUVIALES						
08.07.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO-UFD=200mm	m	1,037.97	1037.97	0.00	1,037.97	0.00
08.07.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO-UFD=355mm	m	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
08.07.01.03	SOLADO DE BUZON 1:10, C.A E=2"	m2	63.62	63.62	0.00	63.62	0.00
08.07.01.04	BUZON DE MORTERO ARMADO ALTURA PROMEDIO 2.25 MT F'c=210kg/cm2	und	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
09.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
09.01	SUB DREN TUBO Ø 4" PVC						
09.01.01	TUBERIA PVC ISO 4422 - Ø 150.00 mm UJF	m	918.00	918.00	0.00	918.00	0.00
10.00	VIARIOS						
10.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	8,701.38	0.00	0.00	0.00	8,701.38

Página 2

BA

FECHA	PROGRAMADO				REAL		
	PARCIAL	%	ACUMULADO	%	PARCIAL	ACUMULADO	%
09/09/2020	716,460.74	15.47%	716,460.74	15.47%	1,091,877.31	1,091,877.31	23.58%
31/10/2020	1,219,975.87	26.34%	1,936,436.61	41.82%	852,268.15	1,944,145.46	41.82%
30/11/2020	1,028,936.96	22.22%	2,965,373.57	64.04%	907,328.18	2,851,473.64	61.58%
31/12/2020	1,056,603.20	22.82%	4,021,976.77	86.85%	674,754.37	3,526,228.01	76.15%
31/01/2021	335,573.11	7.25%	4,357,549.88	94.10%	227,273.49	3,753,501.50	81.05%
28/02/2021	0.00	0.00%	4,357,549.88	94.10%	0.00	3,753,501.50	81.05%
31/03/2021	142,534.92	3.08%	4,500,084.80	97.18%	526,318.78	4,279,820.28	92.42%
12/04/2021	130,769.89	2.82%	4,630,854.69	100.00%			
TOTAL	4,630,854.69		4,630,854.69		4,279,820.28		

CONCLUSIONES:

- Los metrados han sido conciliados por el Residente y Supervisor de Obra por lo mismo que Da Conformidad a la **Valorización N°06** correspondiente al mes de **MARZO**, de la obra obra **"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES VARGAS GUERRA IBERIA TRUJILLO Y RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA - DISTRITO DE TRAPICHE-PROVINCIA DE REQUENA-DEPARTAMENTO DE LORETO"**



"AÑO DEL BICENTENARIO PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

- La suscrita en calidad de coordinador, verifico que la documentación presentada, se encuentra conforme, debido a que se verifico que los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son compatible con la **Valorización de Obra N° 06 – mes de MARZO** del 2021. Asimismo, La firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de S/.1,053.00 y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVICER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.
- Así mismo se hace mención que tiene un avance real acumulado ejecutado de 92.42% contra un programado de **97.18%**, encontrándose **ATRASADA** y en ejecución.
- Se realizó la revisión del cálculo de la amortización de Adelanto de materiales, correspondiente a la **Valorización de Obra N° 06 –al mes de MARZO-** 2021, por el cual se otorga la conformidad respectiva.

RECOMENDACIONES:

- *Visto el informe Mensual N°06 correspondiente al mes de **MARZO** 2021 y dado la conformidad por el supervisor de obra, se recomienda el pago correspondiente a la empresa **CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L** siendo el monto a pagar de **S/ 82,780.50 Soles (Ochenta y dos mil setecientos ochenta con 50/100 soles) sin IGV, como se detalla:***

Valorización monto bruto n°06 (22 al 31 de marzo del 2021)	S/	526,318.78
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización Adelanto para Materiales	S/	- 443,538.28

Neto Facturar **S/. 82,780.50**

- *Así mismo la suscrita le hace de su conocimiento que se ha revisado la documentación presentada; pero **no se ha realizado la verificación IN SITU.***
- *Se recomienda seguir los procedimientos de acuerdo al RLCE artículo 194, y continuar con su trámite correspondiente*

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente

DIANA PAOLA CASTRO LITANO
Ing. Civil – Inspector de Obra
