



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Belén, 12 de mayo de 2021



Oficio n° 1417-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mg. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Conformidad de Valorización de Obra n°03
abril 2021.

Obra: "Mejoramiento de la Calle 04 de Septiembre, Calle
Urarinas, Pasaje Secoya y Adyacentes al ámbito de su
influencia - Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas -Loreto".

Ref. : a. Informe n° 122-2021-GRL/GRI/SGSyC/VOSSDA
b. Carta n° 029-2021-C/BDRL

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización de obra n°03 correspondiente a abril 2021**, que asciende a la suma **Cuatrocientos cuarenta y dos mil novecientos uno con 86/100 Soles (S/. 442 901.86) sin IGV**, presentada y aprobada por la supervisión de la obra mediante carta de la referencia b), revisada por el Coordinador según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 03– abril 2021	S/. 442 901.86
Reajuste	S/ 0.00
Amortización Adelanto Directo	S/ 0.00
Amortización Adelanto Materiales	S/ 0.00
Neto a Pagar	S/. 442 901.86

Asimismo, la obra a abril de 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado de 14.59% versus un avance programado de 13.71%, encontrándose la obra en proceso de ejecución.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación de la valorización que sustenta el supervisor, se solicita continuar con el trámite respectivo **a favor de CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.** Se adjunta factura electrónica.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAUL FLORES ACQUEPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control
CIP. 23850



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Belén, 11 de Mayo del 2,021

INFORME N° **122**-2021-GRL-GRI/SGSYCVODSDA



Al: **ING. RAÚL FLORES AQUEPUCHO**
Sub Gerente de Supervisión y Control

Del: **ING. VÍCTOR OSWALDO DA SILVA DEL ÁGUILA.**
Coordinador de Obra.

Asunto: Valorización de Obra N° 03 – correspondiente al mes de Abril - 2021 de la Obra: “Sub Ítem 1.1 “Mejoramiento de la Calle 4 de Septiembre, Calle Urarina” CUI N° 2194661; Distrito de Iquitos – Provincia de Manas – Loreto”.

Referencia: **Carta N° 029-2021-C/BDRL** (Reg. N° 10476)

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarle muy cordialmente, así mismo informarle que el Supervisor ha presentado la Valorización de Obra N° 03 – correspondiente al mes de Abril - 2021, a fin de determinar si cumple con los lineamientos y requerimientos establecidos para el trámite de pago, de acuerdo a lo siguiente:

DATOS GENERALES:

Obra : “Sub Ítem 1.1 “Mejoramiento de la Calle 4 de Septiembre, Calle Urarina” CUI N° 2194661; Distrito de Iquitos – Provincia de Manas – Loreto”.

Ubicación : Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto.

Entrega de Terreno : 12 de Enero del 2021

Pago de Adelanto Directo : No Solicitado

Pago de Adelanto de Materiales : No Solicitado

Fecha de Inicio Ejecución : 01 de Febrero del 2021

Fecha de Término Ejecución : 28 de Octubre del 2021

Estado de la obra : **En Ejecución**

%Avance Físico Acumulado : **14.59%**

%Avance Programado Acumulado : **13.71%**

Contratista : **Caballero Contratistas Generales EIRL**

Contrato de Obra : 001-2021-GRL-GRI

Fecha de Contrato : 05 de Enero del 2021

Monto Contractual : **S/. 8'400,000.00 (Sin IGV)**

Plazo de Ejecución : **270 días calendario**

Supervisión de Obra : **CONSORCIO BDRL**


Ing. Residente de Obra : Ing. Tito Eduardo Herrera Sabogal

Ing. Jefe Supervisión de Obra : Ing. Julio Vela Alvarado

Ing. Coordinador de Obra : Ing. Víctor Oswaldo Da Silva del Águila.

I. ANTECEDENTES:

Mediante Licitación Publica N° 027-2020-CSO-GRL, el comité de selección adjudico la buena pro a la empresa contratista **Caballero Contratistas Generales EIRL**; para la ejecución de la Obra antes mencionada y mediante Contrato N° 001-2021-GRL-GRI, con fecha 05 de Enero del 2021, la empresa contratista **Caballero Contratistas Generales EIRL** firmó el contrato de obra, para su ejecución; Con fecha 12 de Enero del 2021, se realizó la entrega de terreno para la ejecución de la Obra Antes mencionada en el asunto, no otorgo el Adelanto Directo, difiriendo el inicio de la obra hasta subsanar temas de propiedades, con fecha 01 de febrero del 2021, se procedió a dar por Inicio de la Obra, que es el último evento cumpliendo así con los requisitos de ley.



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Con Carta N° 007-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS 04 DE SEPTIEMBRE (05/03/2021), la empresa contratista **Caballero Contratistas Generales EIRL**, presenta la Valorización de Obra N° 01 – correspondiente al mes de Febrero - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 267,779.65 Soles**.

Con Carta N° 017-2021-C/BDRL (09/04/2021), la empresa Consultora **Consorcio BDRL**, presenta la Valorización de Obra N° 02 – correspondiente al mes de Marzo - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 515,003.44 Soles**.

Con Carta N° 029-2021-C/BDRL (06/05/2021), la empresa Consultora **Consorcio BDRL**, presenta la Valorización de Obra N° 03 – correspondiente al mes de Abril - 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 442,901.86 Soles**; de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- Valorización de Obra.
- Cálculo de Reintegro, Deducciones y Amortizaciones.
- Relación de Partidas y Metrados Ejecutados.
- Copia de Fórmula Polinómica de Expediente Técnico.
- Índices Unificados.
- Protocolos de Prueba (de corresponder).
- Certificados de Calidad (de corresponder).
- Panel Fotográfico de Actividades Realizadas en el Mes Valorizado.
- Copias de Asientos de Cuaderno de Obra del Periodo Valorizado.
- Calendario Valorizado de Avance de Obra.
- Certificado de habilidad del Residente de Obra.
- Copia de Acta de Entrega de Terreno.
- Copia de Contrato de Ejecución de Obra.
- Copia de documentos varios

II. EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:

Visto las copias del Cuaderno de Obra, del Ingeniero Residente conjuntamente con el **Supervisor**, en la que se consigna, cuantifica y aprueba los trabajos ejecutados para la Valorización de Obra N° 03 – correspondiente al mes de Abril - 2021, las cuales son aprobados por el Supervisor de la Obra y plasmados en la documentación tramitada indicando a su vez que luego de efectuada la revisión al procedimiento del cálculo de los montos consignados en la Valorización N° 03, obra de la referencia, se ha podido determinar que se ajustan a los procedimientos que rigen el cálculo de las valorizaciones de obras públicas, en concordancia con la documentación sustentadora presentada.

La presente Valorización tiene como fFuente de Financiamiento: 05 Recursos Determinados Rubro: 18 Canon y SobreCanon, Petrolero y en concordancia con la documentación y cálculos adjuntos se ha encontrado procedente efectuar el pago con cargo al contrato, por lo que el monto neto asciende a la suma de **Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Uno y 86/100 Soles (S/. 442,901.86)**, sin incluir IGV, el cual es tramitada de acuerdo al siguiente detalle:

10:07 AM
12/05/2021



Tramite Respectivo
Oficina a GR
Comisario



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Valorización N° 03 – Abril - 2021	442,901.86
Reajuste Neto	
Amortización Adelanto Directo	
Amortización Adelanto Materiales	
Deducción de Reajuste Adelanto Directo	
Deducción de Reajuste Adelanto de Materiales	
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	442,901.86
NETO A PAGAR AL CONTRATISTA	442,901.86

III. CONCLUSIONES:


La Valorización de Obra N° 03 – correspondiente al mes de Abril - 2021, cuenta con la documentación correspondiente, para lo cual se realizó la compatibilización de metrados aprobados por el supervisor en el cuaderno de obra, con la Valorización de obra presentada y Amortizaciones efectuadas hasta la fecha, las cuales se reflejan en los siguientes cuadros:

MONTO CONTRATADO				ADELANTO DIRECTO	ADELANTO MATERIALES	DEDUCCIONES	
8,400,000.00				No Otorgado	No Otorgado		
VALORIZACIÓN TRAMITADA	MONTO BRUTO VALORIZADO	REAJUSTE	MONTO A PAGAR DE VALORIZACIÓN	AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO	AMORTIZACIÓN ADELANTO DE MATERIALES	ADELANTO DIRECTO	ADELANTO DE MATERIALES
N° 01 feb-21	267,779.65	-	267,779.65				
N° 02 mar-21	515,003.44	-	515,003.44				
N° 02 abr-21	442,901.86	-	442,901.86				
N° 03 may-21		-	-				
N° 04 jun-21		-	-				
N° 05 jul-21		-	-				
N° 06 ago-21		-	-				
TOTAL ACUMULADO	1,225,684.95	-	1,225,684.95	-	-	-	-
SALDOS	7,174,315.05			-	-		

FECHA	PROGRAMADO				REAL			
	PARCIAL	%	ACUMULADO	%	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
01/02/2021	111,100.58	1.32%	111,100.58	1.32%	267,779.65	3.19%	267,779.65	3.19%
01/03/2021	293,897.99	3.50%	404,998.57	4.82%	515,003.44	6.13%	782,783.17	9.32%
01/04/2021	746,294.34	8.88%	1,151,292.91	13.71%	442,901.86	5.27%	1,225,685.00	14.59%
01/05/2021	1,807,934.47	21.52%	2,959,227.38	35.23%				
01/06/2021	2,233,534.02	26.59%	5,192,761.40	61.82%				
01/07/2021	1,718,806.38	20.46%	6,911,567.78	82.28%				
01/08/2021	888,545.14	10.58%	7,800,112.92	92.86%				
01/09/2021	451,566.03	5.38%	8,251,678.95	98.23%				
01/10/2021	148,321.05	1.77%	8,400,000.00	100.00%				
TOTAL SI/	8,400,000.00	100.00%			1,225,685.00			



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

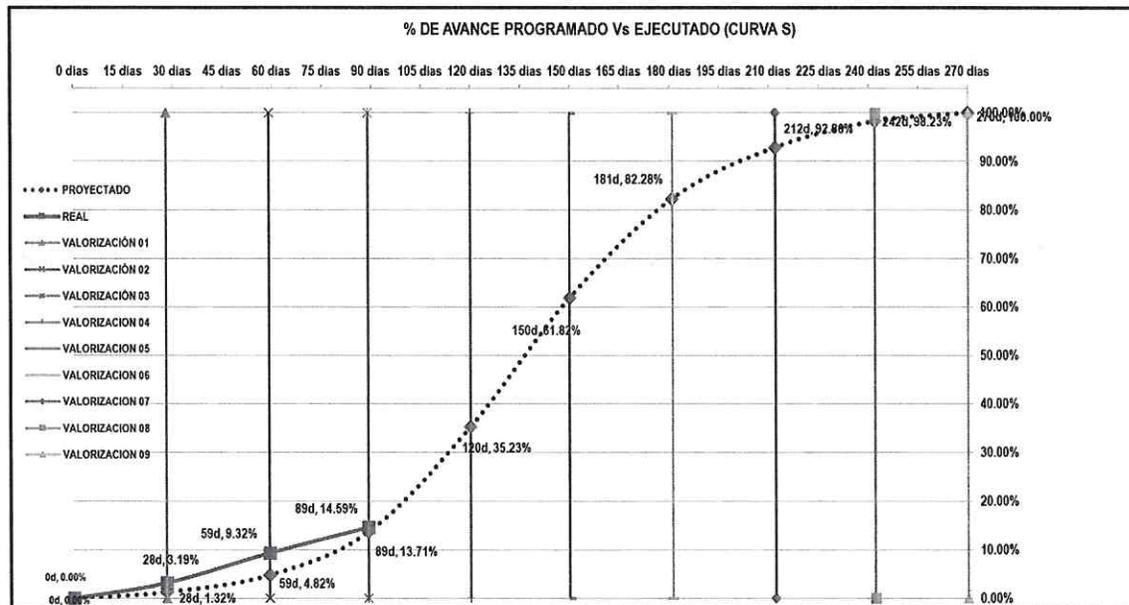

El suscrito en Calidad de Coordinador, verifico que la documentación presentada, se encuentra conforme, debido a que el suscrito verifico los metrados descritos en el Cuaderno de Obra, son compatible con la Valorización de Obra N° 03 – del Mes de Abril del 2021. Asimismo, La firma contratista acredita el pago a SENCICO por la suma de S/. 886.00 y la constancia de estar al día en sus pagos a ESSALUD - CONAFOVISER, ONP, SCTR. Presentando comprobante de pago al mes de la valorización, en cumplimiento de la Ley.

Se verifico que la empresa contratista **Caballero Contratistas Generales EIRL**, no tiene ninguna amortización por no haberse otorgados ningún adelanto a la fecha; La Obra al Mes de Abril 2021, cuenta con un avance real acumulado ejecutado de 14.59% contra un programado de 13.71%, encontrándose en proceso de Ejecución, por el cual el suscrito da la conformidad respectiva.

IV. RECOMENDACIÓN:

Se recomienda, tramitar el pago de la valorización Obra N° 03 – correspondiente al Mes de Abril – 2021, por un monto Neto a Pagar de **Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Uno y 86/100 Soles (S/. 442,901.86)**, sin IG.V.; a favor de la empresa contratista **Caballero Contratistas Generales EIRL**, por la ejecución de la obra **“Sub Ítem 1.1 “Mejoramiento de la Calle 4 de Septiembre, Calle Urarina” CUI N° 2194661; Distrito de Iquitos – Provincia de Manas – Loreto”.**; por lo que el suscrito encuentra conforme a la documentación presentada.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y trámites correspondientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GRI - AGSYC

VÍCTOR OSWALDO DA SILVA DEL ÁGUILA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 146160
