

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

## SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Belén, 12 de julio del 2021

Oficio n° 2152-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mg. Artemio del águila Panduro  
Gerente Regional de Infraestructura  
Presente

Asunto: Remite Valorización de Obra n° 40 junio 2021.

Obra: "Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital de Iquitos César Garayar García, Provincia de Maynas".

Ref.: a. Informe n° 473-2021-GRL-GRI-SGSyC/NCGR  
b. Carta n° 352-2021-CSG/JS

Tengo el agrado de saludarle cordialmente, a su vez alcanzarle la documentación de la Valorización n° 40 por ejecución de obra, que asciende a la suma de **Trecientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos diez con 63/100 soles (S/. 397 410.63)**, presentada y aprobada por el Supervisor de la obra mediante carta de la referencia b), correspondiente a junio del 2021, revisada por el área de coordinación según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 40 junio 2021- con IGV		S/.	799 989.79
Reajuste		S/.	82 915.78
Valorización + Reajuste		S/.	882 905.57
Deducciones (AD+AM)		S/.	105 833.22
Amortización (AD+AM)		S/.	440 283.68
Adelanto Directo	S/.	159 977.96	
Adelanto Materiales 2	S/.	195 114.78	
Adelanto Materiales 3	S/.	39 355.25	
Adelanto Materiales 4	S/.	45 815.69	
Valorización Neta		S/.	336 788.67
IGV (18%)		S/.	60 621.96
<b>Neto a Pagar al Contratista</b>		<b>S/.</b>	<b>397 410.63</b>

Por lo tanto, se remite la valorización, para continuar con el trámite respectivo a favor del **CONSORCIO SALUD LORETO**, considerando que dicho trámite corresponde dentro del reglamento de la ley que la rige.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
Gerente Regional de Infraestructura  
Ing. Mg. ARTEMIO DEL ÁGUILA PANDURO  
Sub Gerente de Supervisión y Control

Copia: SGSyC – File de obra (01)  
SGSyC – File correlativo (01)  
SGSyC – File Personal (01)  
Tramite: 15625  
RFA – S.G.  
dap – Sec.



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

**INFORME N° 473- 2021-GRL/GRI/SGSyC-NCGR**



**Al** : ING. RAÚL FLORES AQUEPUCHO  
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

**Del** : ING. NICIA CORIN GARCIA RAMIREZ.  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

**Asunto** : REMITO INFORME DE VALORIACION N° 040 – JUNIO 2021 DEL CONSORCIO SALUD LORETO  
Obra: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA – PROVINCIA DE MAYNAS" – CUI 2255793

**Ref.** : a) Carta N° 352-2021-CSG/JS – Proveído N° 15625 – 2021  
b) Carta N° 270-2021-CSL-OBRA

**FECHA** : 07 DE JULIO DEL 2021

Por el presente documento me dirijo a usted para saludarle, y a la vez, remitirle el informe, respecto a la Valorización N° 040, correspondiente al mes de Junio; de acuerdo a lo siguiente:

**I ANTECEDENTES:**

- Con fecha 04-03-2016 el Gobierno Regional de Loreto y el CONSORCIO SALUD LORETO suscribieron el CONTRATO DE OBRA N°014-2016-GRL-GGR, para la ejecución de la obra: "Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Iquitos Cesar Garayar García, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto", por un monto de S/.192,037,480.52 (ciento noventa y dos millones treinta y siete mil cuatrocientos ochenta con 52/100 soles), incl. IGV y con un plazo de ejecución de 960 días calendario, de los cuales 240 días estaban destinados a la elaboración del Expediente Técnico y 720 días calendario estaban destinados a la ejecución de la obra civil, equipamiento y puesta en marcha, bajo el Sistema de Suma Alzada.
- Con fecha 16-05-2016 se firma la primera adenda la cual modifica la cláusula quinta del contrato, estableciendo plazos de entrega de informes para la elaboración del Expediente Técnico.
- Con fecha 02-10-2017 se firma la segunda adenda al Contrato, la cual modifica el presupuesto realizando un incremento por ampliación en la meta a causa de la normativa vigente de cumplimiento obligatorio, por un monto de S/.25'189,002.04 (veinticinco millones ciento ochenta y nueve mil dos con 04/100 soles).
- Con fecha 06-10-2017 se firma la tercera adenda cuyo objetivo es rectificar el monto contractual con el adicional de la segunda adenda teniendo como resultado un monto final de S/.217'226,482.36 (doscientos diecisiete millones doscientos veintiséis cuatrocientos ochenta y dos con 36/100 soles).
- Con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°073-2019-GRL-GRI, declarando precedente la Ampliación de Plazo N°05 por un (01) día calendario.
- Con RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°153-2019-GRL-GRI, declarando precedente la Ampliación de Plazo N°10 por ciento veinte y uno (121) días calendarios.
- Con fecha 15 de enero del 2020, la ENTIDAD y el CONSORCIO SALUD LORETO suscribieron el ACTA DE PARALIZACION CON SUSPENSION DE PLAZO N°01, con fecha 16-01-2020 por eventos no atribuibles a las partes.

*Nicia Corin Garcia Ramirez*  
Ingeniero Civil  
CIP N° 73438





**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

- Con fecha 13-03-2020, el Gobierno Regional de Loreto convocó la contratación de la Supervisión por el Saldo de la Obra "Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Iquitos Cesar Garayar García, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto", con fecha de otorgamiento de la Buena Pro el 26-06-2020.
- Se debe tener en cuenta que la entidad con Carta 172-2020-GRL-GRI, de fecha 13-03-2020, notificó al contratista el término de la causal por la Suspensión de plazo.
- Con fecha 15-03-2020 se emite el DS-N°044-2020-PCM, declarando estado de emergencia a la Nación el mismo que dispone el aislamiento social obligatorio por un periodo de 15 días calendario, periodo que fue prorrogado hasta el 30 de junio del 2020, mediante DS-N°064-2020-PCM (14 días calendario), DS-N°075-2020-PCM (14 días calendarios), DS-N°083-2020-PCM (14 días calendario) y DS-N°094-2020-PCM (36 días calendario), respectivamente.
- Con fecha 27-03-2020, mediante Decreto Supremo N°051-2020-PC, el Presidente de la Republica emite la primera Prorroga al Estado de Emergencia Nacional por 13 días calendario adicionales, los mismos que rigen a partir del 31-03-2020 hasta 12-04-2020.
- Mediante Decreto Supremo N°064-2020-PCM de fecha 10-04-2020 el Presidente de la Republica promulga la segunda prórroga al Estado de Emergencia y aislamiento social obligatorio por 14 días calendarios adicionales a partir del 13 de abril de 2020 al 26 de abril del 2020.
- Mediante Decreto Supremo N°075-2020-PCM, el presidente de la República, comunica la tercera prórroga al Estado de Emergencia y aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, por 14 días calendarios adicionales a partir del 27 de abril del 2020 al 10 de mayo del 2020.
- Mediante DS N°083-2020-PCM, el presidente de la Republica comunica la cuarta prórroga al Estado de Emergencia y aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, por 14 días calendarios adicionales a partir del 11 de mayo del 2020 al 24 de mayo del 2020.
- Mediante DS N°094-2020-PCM, el presidente de la Republica comunica la quinta prórroga al Estado de Emergencia y aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, por 14 días calendarios adicionales a partir del 25 de mayo del 2020 al 30 de junio del 2020.
- Mediante Carta N°064-2020-CSL (19/06/2020), El Consorcio Salud Loreto remite la Solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo.
- Mediante Carta N°072-2020-CSL (06/07/2020), El Consorcio Salud Loreto remite el levantamiento de las observaciones a la Solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo.
- Mediante Carta N° 185 -2020-GRL-GRI, de fecha 08.07.2020; se comunica al Consorcio Salud Loreto la Resolución Gerencial Regional N° 040-2020-GRL-GRI.
- Con Carta N° 163-2020 – CSG/JS, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N°032 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al saldo contractual perteneciente al mes de noviembre del 2020 conforme a la estipulado en el RLCE al Consorcio Supervisor Garayar.
- Con 07/12/2020 esta valorización es recibida por la entidad y el 09/12/2020 es derivado a la Sub Gerencia de Supervisión y Control para su proseguir con el trámite respectivo; el mismo que mediante Proveído N° 37175 es derivado a mi persona para su atención como coordinadora de Obra.
- Con fecha 14 de diciembre la Entidad y el Consorcio Salud Loreto en mérito al DU 133-2020, firma la adenda N° 06 al Contrato N° 014-2016-GRL-GGR, modificando la Cláusula Cuarto: del pago del Contrato N° 014-2016-GRL-GGR, en el extremo referido en el periodo de valorizaciones mensuales, en el sentido, que la ejecución

*Nidia Corina Pareda Pineda*  
Ingeniero Civil  
CIP N° 73453



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"


**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

de la obra efectuada en el mes de diciembre de 2020 se valorice en 02 periodos, conforme se detalla a continuación:

1. Primer periodo: Valorización por la ejecución de la Obra en el periodo del 01 al 20 de diciembre de 2020.
2. Segundo periodo: Valorización por la ejecución de la Obra en el periodo del 21 al 31 de diciembre de 2020.
  - Con Carta N° 184-2020-CSG/JS, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N°033 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al saldo contractual perteneciente al mes de diciembre del 2020 del 01.12.2020 al 20.12.2020; conforme a la estipulado en la Cláusula Segunda de la adenda N° 06 al Contrato N° 014-2016-GRL-GGR.
  - Con Carta N° 129-2021-CSG/JS, de fecha 05.02.2021, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N° 035 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al mes de enero 2021 (01.01.2021 al 17.01.2021).
  - Con Carta N° 146-2021-CSG/JS, de fecha 05.03.2021, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N° 036 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al mes de FEBRERO 2021 (del 25.02.2021 al 28.02.2021).
  - Mediante Informe N° 133-2021-GRL/GRI/SGSyC-NCGR, de fecha 10.03.2021; la suscrita recomienda a la Sub Gerencia de Supervisión y Control devolver al CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR el Informe de Valorización N° 036 correspondiente al mes de febrero del 2021; a fin que la Supervisión adjunte el Informe de los Especialistas por parte el Consorcio Supervisor Garayar, en el que debe incluir las características de los mismos, tales como: marca, año de fabricación, especificaciones técnicas, vigencia tecnología, fotos de los equipos, etc.; y la Conformidad respectiva.
  - Mediante Carta N° 192-2021-CSG/JS, el Ing. Saturdino Raúl Melgar Paitán Jefe de Supervisión del CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR, remite el Informe del Levantamiento de Observaciones (Informe Técnico N° 04-2021); en el que indica que se evidencia el panel fotográfico de los equipos que llegaron a obra durante la paralización que inicio el 18 de enero y culmino el 25 de febrero del 2021, en la cual se encuentra en valorización (Valorización de Obra N° 36) del Contratista Consorcio Salud Loreto (Adjunta guía de remisión con fecha de ingreso)

Así mismo en el referido informe a) la Supervisión da la CONFORMIDAD a la Valorización N° 36 del Consorcio Salud Loreto para ser tramitada por la Entidad.

- Con Carta N° 215-2021-CSG/JS, de fecha 09.04.2021, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N° 037 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al mes de Marzo 2021 (del 01.03.2021 al 31.03.2021).
- Con Carta N° 258-2021-CSG/JS, de fecha 07.05.2021, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N° 038 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al mes de Abril 2021 (del 01.04.2021 al 30.04.2021).

  
Nicia Corín García Ramírez  
Ingeniero Civil  
CIP N° 73433



**SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**

- Con Carta N° 309-2021-CSG/JS, de fecha 07.06.2021, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N° 039 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al mes de MAYO 2021 (del 01.05.2021 al 31.05.2021).
- Con Carta N° 352-2021-CSG/JS, de fecha 05.07.2021, el Consorcio Supervisor Garayar remite a la Entidad el Informe de la Valorización N° 040 presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al mes de JUNIO 2021 (del 01.06.2021 al 30.06.2021).

**II ANALISIS:**

- Se ha tomado conocimiento de la Valorización de Obra N° 40, correspondiente al mes de Junio 2021 practicada por el Residente de Obra Ing. Fernando Raúl Baracco Miller, y presentada la **CONFORMIDAD** por el Supervisor de Obra a través del Jefe de Supervisión de Obra Ing. Saturdino Raúl Melgar Paitán, mediante documento de la referencia a).
- Así mismo de la revisión de las copias del Cuaderno de Obra, el Ing. Residente Fernando Raúl Baracco Miller, en su Asiento N° 1295 del cuaderno de obra (página 86- folio N° 325), de fecha 30 de Junio de 2021, presenta los metrados ejecutados. El Supervisor, mediante Asiento N° 1296 del cuaderno de obra (página 97 – folio N° 314), indica que se ha verificado metrados presentados por el contratista por lo que da la **CONFORMIDAD** a los metrados ejecutados en el mes de Junio 2021; por lo que procede a la elaboración de la Valorización de Junio 2021 y presentado a la Entidad por el Consorcio Supervisor Garayar con Carta N° 352-2021-CSG/JS, de fecha 05.07.2021, la **Valorización N° 040** presentada por el Consorcio Salud Loreto correspondiente al mes de Junio 2021 (del 01.06.2021 al 30.06.2021).
- En el cuadro se observa que el contratista asume que tiene un avance real del mes de junio del 2021 de 0.44% y un avance real acumulado de 63.90%, mientras que su avance programado mensual es de 7.27% y su avance programado acumulado es de 71.98%; presentando la obra un retraso en su ejecución de 8.08%.
- Los montos aprobados por el Consorcio Supervisor Garayar son los siguientes:

**CON RESPECTO AL AVANCE FISICO DE LA OBRA:**

- El Contratista presenta el siguiente cuadro comparativo:

  
Nicia Corina García Ramírez  
Ingeniero Civil  
CIP N° 73433





BICENTENARIO PERU 2021

LORETO GOBIERNO REGIONAL *compromiso con TODOS*




RIS Amazonas *Reserva Natural del Mundo*  
*Reserva Tropical, Maravilla Natural del Mundo*

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

CURVA S - PROGRAMADO VS EJECUTADO

Grafico de Avance Programado (vs) Ejecutado  
Ejecucion Hospital Cesar Garayar Iquitos

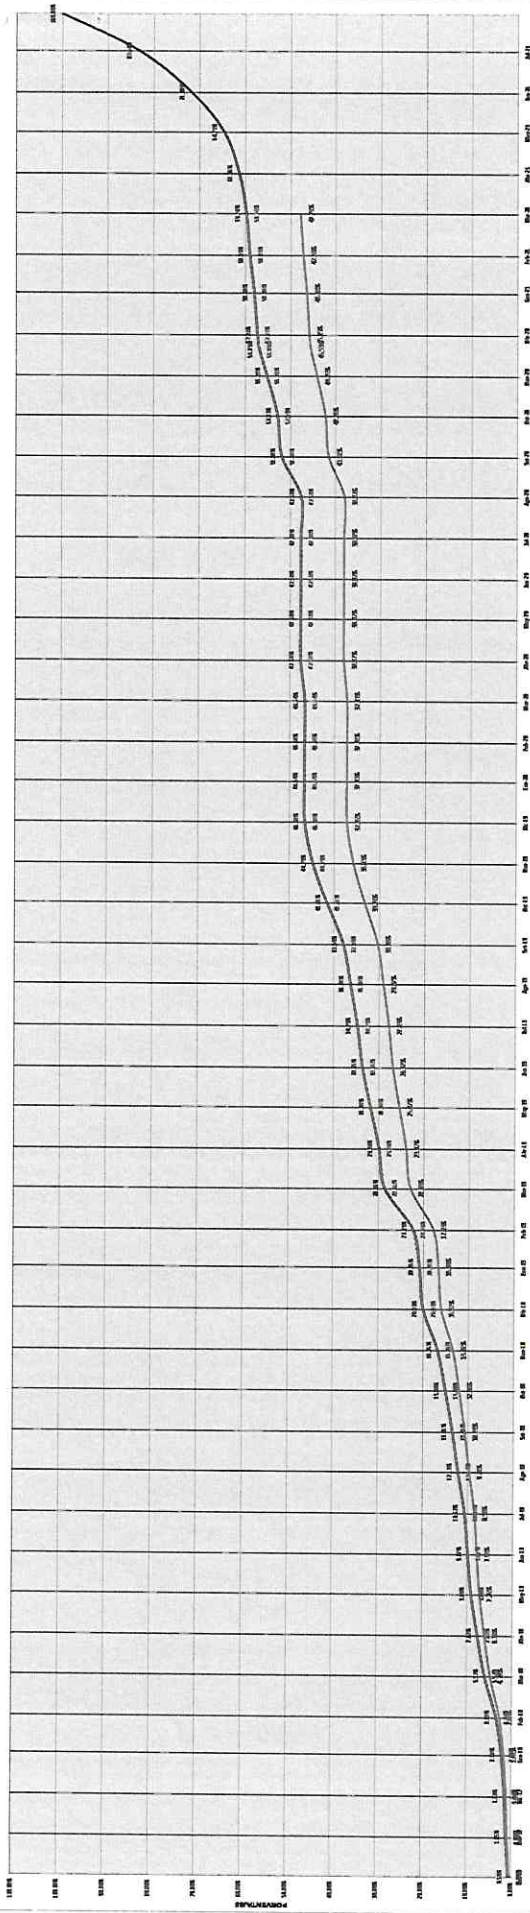

SEMESTRE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAMADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
DIFERENCIA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
VARIAZION	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
OTROS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

*[Signature]*  
Nidia Conin García Ramírez  
Ingeniero Civil  
CIP Nº 73423

Oficina Principal  
Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5 - Belén, Maynas - Loreto  
Av. José Pardo Nº 257 Dpto. 201, Miraflores - Lima  
(065) 26-6989 / 26-7010  
(01) 44773434

www.regionloreto.gob.pe  
[Social Media Icons]



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

RESUMEN DE LA VALORIZACION:

- El contratista en el mes de Junio del 2021 (del 01.06.2021 al 30.06.2021) presenta el siguiente detalle de su valorización N° 40:

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 40						
L.P.N.		: 010-2015-GORELORETO - I CONVOCATORIA				
OBRA		: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".				
CONTRATISTA		: CONSORCIO SALUD LORETO				
SUPERVISOR		: CONSORCIO CESAR GARAYAR				
FECHA		: 30-Jun-21				
DESCRIPCION	MONTO PRESUPUESTO (S/IGV)	VALORIZACION (S/.)			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR (S/.)
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
<b>A. VALORIZACION CONTRACTUAL</b>						
FP No 1 ESTRUCTURAS	40,862,651.79	40,770,672.25	10,203.45	40,780,875.70	99.80%	81,776.09
FP No 2 ARQUITECTURA	30,786,289.94	19,687,906.11	219,908.90	19,907,815.01	64.66%	10,878,474.93
FP No 3 INSTALACIONES SANITARIAS	10,247,970.19	9,157,187.51	225,319.46	9,382,506.98	91.55%	865,463.21
FP No 4 INSTALACIONES ELECTRICAS	12,235,735.02	8,596,315.87	82,217.76	8,678,533.63	70.93%	3,557,201.39
FP No 5 INSTALACIONES MECANICAS	18,944,854.26	12,543,821.94	184,132.58	12,727,954.52	67.18%	6,216,899.74
FP No 6 INSTALACION COMUNICACIONES	14,934,836.43	4,213,587.23	78,207.64	4,291,794.87	28.74%	10,643,041.56
FP No 7 EQUIPAMIENTO	53,603,510.19	20,285,738.40	0.00	20,285,738.40	37.84%	33,317,771.79
<b>TOTAL (A)</b>	<b>181,615,847.82</b>	<b>115,255,229.32</b>	<b>799,989.79</b>	<b>116,055,219.11</b>		<b>65,560,628.71</b>
<b>AVANCE REAL DE OBRA</b>		<b>63.46%</b>	<b>0.44%</b>	<b>63.90%</b>	<b>63.90%</b>	<b>36.10%</b>
<b>AVANCE PROGRAMADO</b>		<b>64.71%</b>	<b>7.27%</b>	<b>71.98%</b>		
<b>B. REAJUSTES</b>						
FP No 1 ESTRUCTURAS		3,258,924.06	0.00	3,258,924.06		
FP No 2 ARQUITECTURA		2,525,785.80	57,815.09	2,583,600.89		
FP No 3 INSTALACIONES SANITARIAS		820,316.50	0.00	820,316.50		
FP No 4 INSTALACIONES ELECTRICAS		670,345.74	0.00	670,345.74		
FP No 5 INSTALACIONES MECANICAS		1,612,282.38	0.00	1,612,282.38		
FP No 6 INSTALACION COMUNICACIONES		657,645.49	25,100.69	682,746.18		
FP No 7 EQUIPAMIENTO		2,628,563.05	0.00	2,628,563.05		
<b>TOTAL (B)</b>		<b>12,173,863.02</b>	<b>82,915.78</b>	<b>12,256,778.80</b>		
<b>VALORIZACION BRUTA ( VB = A + B )</b>		<b>127,429,092.34</b>	<b>882,905.57</b>	<b>128,311,997.91</b>		
<b>C. DEDUCCIONES</b>						
DEDUCCION ADELANTO EN EFECTIVO		1,537,100.46	41,908.48	1,579,008.94		
DEDUCCION ADELANTO MATERIALES		1,251,542.18	63,924.74	1,315,466.92		
<b>TOTAL (C)</b>		<b>2,788,642.64</b>	<b>105,833.22</b>	<b>2,894,475.86</b>		
<b>D. AMORTIZACIONES</b>						
AMORTIZ. ADELANTO EFECTIVO	36,323,169.56	23,051,044.74	159,997.96	23,211,042.70		13,112,126.86
AMORTIZ. ADELANTO MATERIALES 1	8,461,201.74	8,461,201.74	0.00	8,461,201.74		0.00
AMORTIZ. ADELANTO MATERIALES 2	23,621,092.69	14,819,895.48	195,114.78	15,015,010.26		8,606,082.43
AMORTIZ. ADELANTO MATERIALES 3	1,571,899.28	951,945.92	39,355.25	991,301.17		580,598.11
AMORTIZ. ADELANTO MATERIALES 4	31,397,285.79	9,656,280.50	45,815.69	9,702,096.19		21,695,189.60
AMORTIZ. ADELANTO MATERIALES 5	7,594,638.89					7,594,638.89
<b>TOTAL (D)</b>	<b>108,969,287.95</b>	<b>56,940,368.38</b>	<b>440,283.68</b>	<b>57,380,652.06</b>		<b>51,588,635.89</b>
<b>VALORIZACION NETA ( VN = VB - D - C )</b>		<b>67,700,081.32</b>	<b>336,788.67</b>	<b>68,036,869.99</b>		
<b>E. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>						
VALORIZACION NETA		67,700,081.32	336,788.67	68,036,869.99		
EN I.G.V. (18%*VN)		12,186,014.64	60,621.96	12,246,636.60		
<b>TOTAL (E)</b>		<b>79,886,095.96</b>	<b>397,410.63</b>	<b>80,283,506.59</b>		
<b>LÍQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>		<b>79,886,095.96</b>	<b>397,410.63</b>	<b>80,283,506.59</b>		

NOTA: Los reajuste fueron calculados con la aprobación de las fórmulas polinómicas, con la resoluciones RGR N°171-2018-GRL-GRI (Estructura y Arquitectura), RGR N°014-2019-GRL-GRI (Sanitarias y Eléctricas), RGR N°014-2020-GRL-GRI (Mecánicas) y RGR N°015-2020-GRL-GRI (Comunicaciones)





SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Visto el informe mensual N° 40 correspondiente al mes Junio del 2021 (del 01.06.2021 al 30.06.2021); quien en su carta de la referencia a), el Jefe de Supervisión de la Obra luego de revisar los metrados de avance de obra y cálculos respectivos, da la **CONFORMIDAD** para el tramite respectivo; por lo que se recomienda a la Entidad el pago correspondiente a la **empresa CONSORCIO SALUD LORETO**, siendo el monto a pagar de **S/. 397,410.63** (Trescientos Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Diez con 63/00) con IGV, como se detalla:

o Valorización N° 40 Junio 2021 Sin IGV	: S/.	799,989.79
o Reajuste	: S/.	82,915.78
o <b>Valorización + Reajuste</b>	<b>: S/.</b>	<b>882,905.57</b>
o Deducciones (AD+AM)	: S/.	105,833.22
o Amortización (AD +AM)	: S/.	440,283.68
Adelanto Directo	: S/.	159,997.96
Adelanto de Materiales 2	: S/.	195,114.78
Adelanto de Materiales 3	: S/.	39,355.25
Adelanto de Materiales 4	: S/.	45,815.69
o <b>Valorización Neta</b>	<b>: S/.</b>	<b>336,788.67</b>
o IGV 18%	: S/.	60,621.96
o <b>Monto a Facturar</b>	<b>: S/.</b>	<b>397,410.63</b>

- Teniendo en cuenta que esta valorización cuenta con la revisión, verificación, evaluación y **CONFORMIDAD** del Jefe de Supervisión Ing. Saturdino Raúl Melgar Paitán del Consorcio Supervisor Garayar, la suscrita; en base a la Conformidad de la Supervisión; recomienda a la Sub Gerencia de Supervisión y Control que la Valorización N° 40 correspondiente al mes de Junio de 2021 continuar con el trámite respectivo de pago.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

Nicia Corín García Ramírez  
Ing. Nicia Corín García Ramírez  
Administrador de Contrato de Obra  
CIP: 73438

Cc. File Personal NCGR



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Iquitos, 05 de julio del 2021

**Carta N° 352-2021-CSG/JS**

Señores:  
Gobierno Regional de Loreto  
Ing. Mg. ARTEMIO DEL ÁGUILA PANDURO  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
AV. ABELARDO QUIÑONES KM 1.5 BELEN  
IQUITOS

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
07 JUL. 2021

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
OFICINA DE ADM. DOCUMENTARIA  
UNIDAD TRÁMITE DOCUMENTARIO  
05 JUL 2021

**ASUNTO:** ALCANZO VALORIZACIÓN MENSUAL N°40 DEL CONSORCIO SALUD LORETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021.

**REFERENCIA:**

- 1) Concurso Público N°002-2020-CSO-GRL: Servicio De Consultoría De Obra Para Supervisión De Obra Del Saldo De Ejecución De La Obra: "Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital Iquitos Cesar Garayar García / Provincia De Maynas.
- 2) Contrato N°020-2020-GRL-GGR-GRI
- 3) Carta N° 270-2021-CSL, de fecha 03/07/2021

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
Sub Gerencia de Supervisión y Control  
07 JUL 2021  
Fecha: 15625 Hora: 12:36  
N° Reg: A

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez hacerle entrega del expediente de la Valorización de Ejecución de Obra N° 40, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2021, en un (01) original y tres copias (03) copias, se adjunta un CD con la versión digital, presentada por el contratista CONSORCIO SALUD LORETO mediante documento de la referencia 3), la misma que contiene el avance de los trabajos ejecutados según el siguiente detalle:

1	Valorización Neta	S/. 336, 788.67
2	IGV (18%*VN)	S/. 60, 621.96
3	<b>TOTAL A CANCELAR</b>	<b>S/. 397, 410.63</b>

Luego de revisar y verificar los metrados de avance de obra y los cálculos respectivos, se da conformidad a la Valorización de la Obra N° 40 correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2021, para su trámite respectivo por la Entidad.

PROVEIDO N° 15625  
A SUPERVISION Y GNTM  
P. M. SU EVALUADOR



07/07/21

Jirón Morona 484 (Frente Al Colegio La Científica) Loreto-Maynas - Iquitos.

Teléf.: 971454003

Email: mavbconsultor@gmail.com

PROVEIDO N° 15625  
A: Ing. Corina G.  
P.M. SU



07/07/2021



580


"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de  
Independencia"

---

Sin otro en particular, me suscribo de usted manifestándole las muestras de especial consideración y estimación personal.

Atentamente


CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

  
.....  
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
JEFE DE SUPERVISION  
CIP N° 41863

Se adjunta:

- VALORIZACION DE OBRA N°40 DEL MES DE JUNIO DEL PERIODO  
01/06/2021 AL 30/06/2021. CONSORCIO SALUD LOERETO
- VERSION EN DIGITAL-CD

c.c. Archivo.

 <b>CONSORCIO SALUD LORETO</b>	Proyecto:	<b>VALORIZACION No40 JUNIO 2021</b>
	“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”	Revisión:

## **VALORIZACIÓN DE ESTRUCTURAS**

VALORIZACION N° 40.- ESTRUCTURAS

Periodo del 01 al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".

IQUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

N° 217, 226, 482, 36

31/08/2015

ESTRUCTURAS

30-Jun-21

OBRA

UBICACION

ENTIDAD

CONTRATISTA

MONTO CONTRATADO

FECHA DE PRESUPUESTO

FORMULA POLITOMICA No. 01

FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, UNID CANTIDAD, P.U., CONTRACTUAL MONTO, ACCUMULADO ANTERIOR METRADO MONTO, PRESENTE MES METRADO MONTO, ACCUMULADO ACTUAL METRADO %, MONTO, METRADO %, MONTO. Rows include items like ESTRUCTURAS, OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, etc.



VALORIZACION N° 40 : ESTRUCTURAS

Periodo del 01 al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA",  
QUITOS - MAYNAS - LORETO  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONSORCIO SALUD LORETO  
SI: 217.226.482.35  
31/08/2015  
ESTRUCTURAS  
30-Jun-21

OBRA  
UBICACION  
ENTIDAD  
CONTRATISTA  
MONTO CONTRATADO  
FECHA DE PRESUPUESTO  
FORMULA POLINOMICA No. 01  
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, M E T R A D O (UNO CANTIDAD, P.U., MONTO CONTRACTUAL, MONTO METRADO), PRESENTE MES (MONTO METRADO), ACUMULADO ANTERIOR (MONTO METRADO), ACUMULADO ACTUAL (% METRADO, MONTO METRADO), SALDO (% METRADO, MONTO METRADO).



**VALORIZACIÓN N° 40 : ESTRUCTURAS**

Periodo del 01 al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

QUITOS - MAYNAS - LORETO  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONSORCIO SALUD LORETO  
SI: 217.226.482.36  
31/08/2016

**ESTRUCTURAS**  
30-Jun-21

OBRA  
UBICACIÓN  
ENTIDAD  
CONTRATISTA  
MONTO CONTRATADO  
FECHA DE PRESUPUESTO  
FORMULA POLINOMICA No. 01  
FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	M E T R A D O		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNO	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	METRADO
01020101	ALERO CONDUCCIÓN 4x20x2	m2	155,944.64	4.04	791,616.35	155,944.64	791,616.35			155,944.64	100.00%		
01020102	COCINA 005	m3	105.11	326.25	34,292.14	105.11	34,292.14			105.11	100.00%		
01020103	CONCRETO F.C. 15x15x20x30x40x50 - CEMENTO PORTLAND TIPO I	m3	1,724.96	67.48	116,400.30	1,724.96	116,400.30			1,724.96	100.00%		
01020104	ALERO CONDUCCIÓN 4x20x2	m2	4,760.05	4.04	19,351.84	4,760.05	19,351.84			4,760.05	100.00%		
01020105	ANILAS DE PASE (TRENTE) 4x20x2	m	830.16	37.53	31,197.41	830.16	31,197.41			830.16	100.00%		
01020106	WAS DE AMARRE	m3	187.29	375.50	70,323.64	187.29	70,323.64			187.29	100.00%		
01020107	CONCRETO F.C. 15x15x20x30x40x50 - CEMENTO PORTLAND TIPO I	m3	4,314.75	54.65	235,844.24	4,314.75	235,844.24			4,314.75	100.00%		
01020108	ALEROS CONDUCCIÓN 4x20x2	m2	19,122.68	4.04	77,255.63	19,122.68	77,255.63			19,122.68	100.00%		
01020109	LOSA WACZA 1.5x1.0x10	m3	33.45	674.04	22,546.64	33.45	22,546.64			33.45	100.00%		
01020110	CONCRETO F.C. 15x15x20x30x40x50 - CEMENTO PORTLAND TIPO I	m3	224.43	45.19	10,141.59	224.43	10,141.59			224.43	100.00%		
01020111	ALEROS CONDUCCIÓN 4x20x2	m2	1,605.77	4.04	6,487.31	1,605.77	6,487.31			1,605.77	100.00%		
01020112	LOSA WACZA 1.5x1.0x10	m3	2,179.33	674.04	1,463,996.04	2,179.33	1,463,996.04			2,179.33	100.00%		
01020113	CONCRETO F.C. 15x15x20x30x40x50 - CEMENTO PORTLAND TIPO I	m3	12,898.59	45.19	581,931.58	12,898.59	581,931.58			12,898.59	100.00%		
01020114	ALEROS CONDUCCIÓN 4x20x2	m2	165,532.35	4.04	672,190.63	165,532.35	672,190.63			165,532.35	100.00%		
01020115	LOSA WACZA 1.5x1.0x10	m3	801.18	674.04	540,027.37	801.18	540,027.37			801.18	100.00%		
01020116	CONCRETO F.C. 15x15x20x30x40x50 - CEMENTO PORTLAND TIPO I	m3	4,557.49	45.19	201,433.97	4,557.49	201,433.97			4,557.49	100.00%		
01020117	ALEROS CONDUCCIÓN 4x20x2	m2	83,848.40	4.04	338,848.40	83,848.40	338,848.40			83,848.40	100.00%		
01020118	LOSA WACZA 1.5x1.0x10	m3	183.76	674.04	124,731.79	183.76	124,731.79			183.76	100.00%		
01020119	CONCRETO F.C. 15x15x20x30x40x50 - CEMENTO PORTLAND TIPO I	m3	941.93	45.19	42,555.82	941.93	42,555.82			941.93	100.00%		
01020120	ALEROS CONDUCCIÓN 4x20x2	m2	16,155.68	4.04	65,268.95	16,155.68	65,268.95			16,155.68	100.00%		
01020121	LOSA COLABORANTE	m3	26.69	633.22	17,833.69	26.69	17,833.69			26.69	100.00%		
01020122	CONCRETO F.C. 15x15x20x30x40x50 - CEMENTO PORTLAND TIPO I	m3	259.93	119.17	30,848.39	259.93	30,848.39			259.93	100.00%		
01020123	ALEROS CONDUCCIÓN 4x20x2	m2	675.63	4.04	2,730.69	675.63	2,730.69			675.63	100.00%		
01020124	ESCALERAS	m3	181.01	672.72	121,763.05	181.01	121,763.05			181.01	100.00%		
01020125	CONCRETO F.C. 15x15x20x30x40x50 - CEMENTO PORTLAND TIPO I	m3	1,006.39	73.65	74,130.63	1,006.39	74,130.63			1,006.39	100.00%		
01020126	ALEROS CONDUCCIÓN 4x20x2	m2	18,106.03	4.04	73,148.36	18,106.03	73,148.36			18,106.03	100.00%		
01020127	OSTERIAS	m3	284.14	714.24	202,944.15	284.14	202,944.15			284.14	100.00%		
01020128	CONCRETO F.C. 15x15x20x30x40x50 - CEMENTO PORTLAND TIPO I	m3	1,768.91	38.61	68,297.62	1,768.91	68,297.62			1,768.91	100.00%		
01020129	ALEROS CONDUCCIÓN 4x20x2	m2	24,625.07	4.04	99,485.28	24,625.07	99,485.28			24,625.07	100.00%		
01020130	OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES												
01020131	BARRETERAS METALICAS	m3	116.48	330.18	38,459.37	116.48	38,459.37			116.48	100.00%		
01020132	CONCRETO F.C. 15x15x20x30x40x50 - CEMENTO PORTLAND TIPO I	m3	3,311.42	47.74	156,449.26	3,311.42	156,449.26			3,311.42	100.00%		
01020133	ALEROS CONDUCCIÓN 4x20x2	m2	7,086.05	4.04	28,627.63	7,086.05	28,627.63			7,086.05	100.00%		
01020134	BARRAS	kg	39.59	273.01	10,844.63	39.59	10,844.63			39.59	100.00%		
01020135	CONCRETO F.C. 15x15x20x30x40x50 - CEMENTO PORTLAND TIPO I	m3	30.89	273.01	8,430.55	30.89	8,430.55			30.89	100.00%		
01020136	CONCRETO F.C. 15x15x20x30x40x50 - CEMENTO PORTLAND TIPO I	m3	64.97	44.74	2,905.76	64.97	2,905.76			64.97	100.00%		
01020137	ALEROS CONDUCCIÓN 4x20x2	m2	913.24	4.04	3,689.49	913.24	3,689.49			913.24	100.00%		
01020138	BARRAS DE COBRE	kg	2.59	273.74	708.59	2.59	708.59			2.59	100.00%		
01020139	CONCRETO F.C. 15x15x20x30x40x50 - CEMENTO PORTLAND TIPO I	m3											



**VALORIZACIÓN N° 40 - ESTRUCTURAS**

Periodo del 01 al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".

LIQUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

SI: 217.226.482.36

31/08/2015

**ESTRUCTURAS**

30-Jun-21

OBRA  
UBICACION  
ENTIDAD  
CONTRATISTA  
MONTO CONTRATADO  
FECHA DE PRESUPUESTO  
FORMULA POLINOMICA No. 01  
FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	M.CANTIDAD	P.U.	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
				MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO
210201010101	ENCOFRADO Y RECONSTRUCCION DE LA VIGA DE CONCRETO	m <sup>2</sup>	34.57	33.56	1.160,17	34.57	1.160,17			34.57	100,00%	1.160,17	
210201010102	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	100,36	4,04	405,45	100,36	405,45			100,36	100,00%	405,45	
210201010103	BOQUILLA DE CONCRETO	m <sup>3</sup>	20,42	277,33	5.693,08	20,42	2.831,54			20,42	50,00%	2.831,54	10,21
210201010104	CONCRETO F-210 MPa/BOLAS DE CONCRETO-FERRENTA FERROUSO TPC	m <sup>3</sup>	153,43	33,55	6.558,63	97,72	3.279,32			97,72	50,00%	3.279,32	97,72
210201010105	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	246,68	4,04	1.319,79	163,34	659,69			163,34	50,00%	659,69	163,34
210201010106	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	22,75	312,63	7.107,54	22,75	7.107,54			22,75	98,00%	7.107,54	13,83
210201010107	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	16,33	38,53	16.041,97	403,02	15.721,13			403,02	98,00%	15.721,13	8,33
210201010108	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	22,75	4,04	80.395,97	21,927,74	89.589,05			21,927,74	98,00%	89.589,05	447,50
210201010109	CONCRETO F-210 MPa/BOLAS DE CONCRETO-FERRENTA FERROUSO	m <sup>3</sup>	27,93	69,75	19.544,02	25,14	17.559,62			25,14	90,00%	17.559,62	2,79
210201010110	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	172,29	47,82	8.239,91	155,05	7.415,02			155,05	90,00%	7.415,02	17,23
210201010111	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	1.949,15	4,04	7.874,57	1.754,23	7.087,11			1.754,23	90,00%	7.087,11	194,92
210201010112	CONCRETO F-210 MPa/BOLAS DE CONCRETO-FERRENTA FERROUSO	m <sup>3</sup>	187,35	701,75	131.472,63	187,35	131.472,63			187,35	100,00%	131.472,63	
210201010113	CONCRETO F-210 MPa/BOLAS DE CONCRETO-FERRENTA FERROUSO	m <sup>3</sup>	1.219,09	39,61	47.069,06	1.219,09	47.069,06			1.219,09	100,00%	47.069,06	
210201010114	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	12.890,02	4,04	49.530,48	12.260,02	49.530,48			12.260,02	100,00%	49.530,48	
210201010115	CONCRETO F-210 MPa/BOLAS DE CONCRETO-FERRENTA FERROUSO	m <sup>3</sup>	11,81	697,71	8.239,96	11,81	8.239,96			11,81	100,00%	8.239,96	
210201010116	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	104,71	38,61	4.942,85	104,71	4.942,85			104,71	100,00%	4.942,85	
210201010117	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	912,54	4,04	3.688,63	912,54	3.688,63			912,54	100,00%	3.688,63	
210201010118	CONCRETO F-210 MPa/BOLAS DE CONCRETO-FERRENTA FERROUSO	m <sup>3</sup>	9,62	271,28	2.609,71	9,62	2.609,71			9,62	100,00%	2.609,71	
210201010119	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	80,62	41,10	3.313,48	80,62	3.313,48			80,62	100,00%	3.313,48	
210201010120	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	715,89	4,04	2.892,16	715,89	2.892,16			715,89	100,00%	2.892,16	
210201010121	CONCRETO F-210 MPa/BOLAS DE CONCRETO-FERRENTA FERROUSO	m <sup>3</sup>	132,65	308,81	40.963,65	132,65	40.963,65			132,65	100,00%	40.963,65	
210201010122	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	294,17	56,63	16.673,55	294,17	16.673,55			294,17	100,00%	16.673,55	
210201010123	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	10.489,09	4,04	42.375,92	10.489,09	42.375,92			10.489,09	100,00%	42.375,92	
210201010124	CONCRETO F-210 MPa/BOLAS DE CONCRETO-FERRENTA FERROUSO	m <sup>3</sup>	349,02	334,48	116.740,21	349,02	116.740,21			349,02	100,00%	116.740,21	
210201010125	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	2.713,71	50,34	136.608,16	2.713,71	136.608,16			2.713,71	100,00%	136.608,16	
210201010126	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	6.307,27	4,04	25.481,37	6.307,27	25.481,37			6.307,27	100,00%	25.481,37	
210201010127	CONCRETO F-210 MPa/BOLAS DE CONCRETO-FERRENTA FERROUSO	m <sup>3</sup>	735,09	3,93	2.868,90	735,09	2.868,90			735,09	100,00%	2.868,90	
210201010128	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	3.675,47	4,64	17.054,18	3.675,47	17.054,18			3.675,47	100,00%	17.054,18	
210201010129	CONCRETO F-210 MPa/BOLAS DE CONCRETO-FERRENTA FERROUSO	m <sup>3</sup>	3.675,47	43,03	159.339,25	3.675,47	159.339,25			3.675,47	100,00%	159.339,25	
210201010130	CONCRETO F-210 MPa/BOLAS DE CONCRETO-FERRENTA FERROUSO	m <sup>3</sup>	629,00	329,38	206.191,63	629,00	206.191,63			629,00	100,00%	206.191,63	
210201010131	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	159,69	91,51	8.228,93	159,69	8.228,93			159,69	100,00%	8.228,93	
210201010132	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	20.630,69	4,04	83.347,95	20.630,69	83.347,95			20.630,69	100,00%	83.347,95	
210201010133	CONCRETO F-210 MPa/BOLAS DE CONCRETO-FERRENTA FERROUSO	m <sup>3</sup>	891,66	5,55	5.305,38	891,66	5.305,38			891,66	90,00%	4.774,84	89,17
210201010134	CONCRETO F-210 MPa/BOLAS DE CONCRETO-FERRENTA FERROUSO	m <sup>3</sup>	73,203,69	2,65	210.827,20	73,203,69	210.827,20			73,203,69	100,00%	210.827,20	
210201010135	ACEROS CORROSIVOS FY = 4200 MPa/m <sup>2</sup>	kg	827,74	10,48	8.674,72	827,74	8.674,72			827,74	100,00%	8.674,72	
210201010136	TRABAJOS PRELIMINARES	m											





VALORIZACIÓN N° 40 : ESTRUCTURAS

Periodo del 01 al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".

PERIODO DEL 01 AL 30-JUN-21

IQUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

S/N. 217.226.482.36

31/08/2016

ESTRUCTURAS

30-Jun-21

OBRA

UBICACION

ENTIDAD

CONTRATISTA

MONTO CONTRATADO

FECHA DE PRESUPUESTO

FORMULA POLINOMICA No. 01

FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	UNID	CANTIDAD	P.U.	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
					MONTO	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO
010203107	FORMALIZACION DE VALORIZACION DE EQUIPOS	gr	1.00	275.730.59			1.00	275.730.59			1.00	100.00%		
010203107	PROTESIS													
010203107	PROTESIS DE 0.35m. L.6000A 11.000	und	102.00	6.030.79			102.00	615.140.59			102.00	100.00%		
010203107	PROTESIS DE 0.35m. L.1000A 11.000	und	905.00	7.471.81			905.00	6.761.807.05			905.00	100.00%		
010203107	ALCEPO PARA PROTESIS	kg	305.655.77	4.04			305.655.77	1.240.222.51			305.655.77	100.00%		
010203107	ALCEPO CON LIGAMIENTOS	kg												
010203107	HERMALES METALICOS (PARA HERIRAS DE LOS HERIALES)	kg												
010203107	HERMALES METALICOS	kg	3.610.57	10.72			3.610.57	37.831.20			3.610.57	81.00%		774.09
010203107	HERMALES METALICOS (PARA HERIRAS DE LOS HERIALES)	kg	3.804.74	10.72			3.804.74	39.871.08			3.804.74	81.00%		815.63
010203107	COBRES METALICAS	kg	13.466.92	10.72			13.466.92	141.793.24			13.466.92	81.00%		2.893.76
010203107	COBRES METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	6.323.25	10.72			6.323.25	65.429.54			6.323.25	81.00%		1.355.76
010203107	ARROSTRES METALICOS	kg	773.45	10.72			773.45	8.125.55			773.45	81.00%		165.84
010203107	ARROSTRES METALICOS (3"	kg												
010203107	ANGARAS SOLO PARA ATADORNADO 3"	kg	13.50	13.50			13.50	144.77			13.50	54.00%		3.00
010203107	ANGARAS METALICAS (3"	kg	41.87	14.72			41.87	439.87			41.87	81.00%		9.00
010203107	ANGARAS METALICAS	kg												
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	135.84	10.72			135.84	1.451.20			135.84	81.00%		145.59
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	782.32	10.72			782.32	8.365.47			782.32	81.00%		838.63
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	180.37	10.72			180.37	1.933.57			180.37	81.00%		193.39
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	113.47	10.72			113.47	1.216.40			113.47	81.00%		121.67
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	783.93	10.72			783.93	8.403.73			783.93	81.00%		840.34
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	433.23	10.72			433.23	4.637.83			433.23	81.00%		463.75
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	649.24	10.72			649.24	6.959.85			649.24	81.00%		695.94
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	638.18	10.72			638.18	6.841.92			638.18	81.00%		684.47
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	137.22	10.72			137.22	1.471.00			137.22	81.00%		147.09
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	201.51	10.72			201.51	2.160.10			201.51	81.00%		216.01
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	49.21	10.72			49.21	527.59			49.21	81.00%		52.74
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	1.80	10.72			1.80	20.37			1.80	81.00%		2.04
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	17.650.19	10.72			17.650.19	191.354.04			17.650.19	100.00%		327.59
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	5.633.84	10.72			5.633.84	60.074.76			5.633.84	100.00%		207.67
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	282.65	10.72			282.65	3.028.94			282.65	100.00%		306.67
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	69.80	10.72			69.80	749.33			69.80	100.00%		749.33
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	246.35	10.72			246.35	2.640.87			246.35	100.00%		2.640.87
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	kg	620.47	39.95			620.47	32.777.78			620.47	99.00%		327.59
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	m3	465.40	44.65			465.40	20.764.76			465.40	99.00%		207.67
010203107	ANGARAS METALICAS (TUBO 2" X 2' E-3.00mm)	m3	355.05	87.23			355.05	30.692.16			355.05	99.00%		306.67



**VALORIZACIÓN N° 40 : ESTRUCTURAS**  
 Periodo del 01 al 30-Jun-21


"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".  
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 SI. 217.226.482.36  
 31/08/2015  
**ESTRUCTURAS**  
 30-Jun-21

OBRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CONTRATISTA  
 MONTO CONTRATADO  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA POLINOMICA No. 01  
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	M E T R A D O		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNO CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	METRADO	%
1.02.01.01.1	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m <sup>2</sup>	40.44	12,720.00	311.39	12,592.80	311.39	99.00%	311.39	12,592.80	311.39	99.00%	127.39
1.02.01.01.2	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m <sup>2</sup>	145.17	46,913.97	147.63	46,444.83	147.63	99.00%	147.63	46,444.83	147.63	99.00%	468.81
1.02.01.01.3	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m <sup>2</sup>	492.23	12,634.34	492.23	12,634.34	492.23	99.00%	492.23	12,634.34	492.23	99.00%	128.78
1.02.01.01.4	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m <sup>2</sup>	195.57	79,956.30	194.60	79,166.44	194.60	99.00%	194.60	79,166.44	194.60	99.00%	601.61
1.02.01.01.5	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m <sup>2</sup>	2,335.24	32.94	76,922.81	2,311.69	76,153.59	99.00%	2,311.69	76,153.59	2,311.69	99.00%	763.15
1.02.01.01.6	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	kg	11,739.50	4.04	47,427.59	11,622.11	46,953.30	99.00%	11,622.11	46,953.30	11,622.11	99.00%	474.30
1.02.01.01.7	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m <sup>2</sup>	40.20	18,179.65	39.80	17,697.65	39.80	99.00%	39.80	17,697.65	39.80	99.00%	160.63
1.02.01.01.8	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m <sup>2</sup>	643.20	46.36	29,816.76	636.77	29,520.59	99.00%	636.77	29,520.59	636.77	99.00%	263.03
1.02.01.01.9	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m <sup>2</sup>	31.05	11,657.28	30.74	11,542.68	30.74	99.00%	30.74	11,542.68	30.74	99.00%	116.41
1.02.01.01.10	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m <sup>2</sup>	372.57	20,364.63	368.84	20,161.03	368.84	99.00%	368.84	20,161.03	368.84	99.00%	209.89
1.02.01.01.11	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	kg	11,659.00	4.04	48,326.48	11,842.38	47,843.22	99.00%	11,842.38	47,843.22	11,842.38	99.00%	463.25
1.02.01.01.12	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m	139.20	37.59	5,231.14	137.81	5,176.82	99.00%	137.81	5,176.82	137.81	99.00%	52.24
1.02.01.01.13	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m	143.73	3,609.09	143.73	3,609.09	143.73	100.00%	143.73	3,609.09	143.73	100.00%	
1.02.01.01.14	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m	14,245.34	535,339.88	14,245.34	535,339.88	14,245.34	100.00%	14,245.34	535,339.88	14,245.34	100.00%	
1.02.01.01.15	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m	172.38	15,110.63	172.38	15,110.63	172.38	100.00%	172.38	15,110.63	172.38	100.00%	
1.02.01.01.16	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	m	5,748.43	19.56	114,736.65	4,311.32	86,054.00	75.00%	4,311.32	86,054.00	1,437.11	25.00%	28,684.72
1.02.01.01.17	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	ton	1,700.00	598,281.00	1,700.00	598,281.00	1,700.00	100.00%	1,700.00	598,281.00	1,700.00	100.00%	
1.02.01.01.18	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	ton	1,700.00	197,234.00	1,700.00	197,234.00	1,700.00	100.00%	1,700.00	197,234.00	1,700.00	100.00%	
1.02.01.01.19	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	SI.	34,651,009.41		34,651,009.41		34,651,009.41		34,651,009.41				69,386.32
1.02.01.01.20	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	14.69%	5,161,297.10		5,161,297.10		5,161,297.10		5,161,297.10				10,329.04
1.02.01.01.21	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	3.00%	1,039,645.23		1,039,645.23		1,039,645.23		1,039,645.23				2,080.59
1.02.01.01.22	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	SI.	40,843,651.79		40,843,651.79		40,843,651.79		40,843,651.79				81,776.35
1.02.01.01.23	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	18.00%	7,355,277.32		7,355,277.32		7,355,277.32		7,355,277.32				14,719.74
1.02.01.01.24	MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE LA SALA DE ATENCION	SI.	48,217,929.11		48,217,929.11		48,217,929.11		48,217,929.11				96,498.09
<b>COSTO DIRECTO</b>													
<b>GASTOS GENERALES</b>													
<b>UTILIDAD</b>													
<b>SUBTOTAL</b>													
<b>IG.V.</b>													
<b>TOTAL</b>													



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
 I.G. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

 <b>CONSORCIO SALUD LORETO</b>	Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	<b>VALORIZACION No40 JUNIO 2021</b>
		Revisión:

**VALORIZACIÓN DE  
ARQUITECTURA**

VALORIZACIÓN N° 40 : ARQUITECTURA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA.

GOBIERNO REGIONAL - LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

FORMULA POLITOMICA No 02

31/08/2018-02/30

30-Jun-21

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, MONTO, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO %, MONTO, SALDO %, MONTO.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

VALORACIÓN N° 40 : ARQUITECTURA

Fecha del 16 Ene al 30-Jun-21  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA -  
QUITOS - MAYNAS - LORETO  
CONSORCIO SUPLENTE REGIONAL DEL NOROCCIDENTE  
CONSORCIO SUPLENTE REGIONAL DEL NOROCCIDENTE  
SI/ 217.298.482.36  
31/08/2015  
ARQUITECTURA  
80-Jun-21

OBRA:  
INDICACION:  
INDICADO:  
CONTRATISTA:  
MONTO CONTRATADO:  
FECHA DE PRESUPUESTO:  
FORMULA POLINOMICA No 02  
FECHA DE CORTE:

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRACTUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR METRADO MONTO, PRESENTE MES METRADO MONTO, ACUMULADO ACTUAL METRADO MONTO, SALDO METRADO MONTO. Rows include items like CONTRAPISO DE CEMENTO, PISO DE CERAMICA, etc.

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
JEFE DE SUPERVISACION  
CIP N° 41863



508

VALORIZACION N° 40 - ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA"

QUITOS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

SI 217.239.482.38

318662015

ARQUITECTURA

30-Jun-21

OBRA

UBICACION

ENTIDAD

MONTA

MONTO CONTRATADO

FECHA DE PRESUPUESTO

FORMULA POLINOMICA No 02

FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO UNO CANTIDAD, P.U., CONTRACTUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR MONTO, PRESENTE MES MONTO, ACUMULADO ACTUAL MONTO, METRADO METRADO, SALDO MONTO. Rows include items like ESTRUCTURA METALICA ACABADA, LITON PAÑOL FERROCIDO, PUERTAS, PUERTAS DE 1 HOJA, PUERTAS DE 2 HOJAS, etc.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

VALORIZACIÓN N° 40 - ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA

UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO  
MONTO: 482.36  
FECHA DE PRESUPUESTO: 3/08/2015

FORMULA POLINOMICA No 02  
FECHA DE CORTE: 80-Jun-21

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, PRESENTE MES, ACUMULADO ANTERIOR, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, SALDO. Rows include items like VENTANA 1.00 x 0.50, VENTANA 1.00 x 0.80, etc.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
JEFE DE SUPERVISION  
CIP N° 41863

VALORIZACION N° 40 : ARQUITECTURA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA - IQUITOS - MAYNAS - LORETO

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

CONTRATISTA

MONTO CONTRATADO

FECHA DE PRESUPUESTO

FORMULA FOLIONOMICA No 02

FECHA DE CORTE

ARQUITECTURA

31/08/2015

30-Jun-21

Table with columns: CODIGO, PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRACTUAL, MONTO, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, MONTO, METRADO, SALDO, MONTO. Rows include items like 'SUA E INST. VE-25 VENTANAS DE FACHADA...', 'SUA E INST. VE-26 VENTANAS DE FACHADA...', etc.

CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863







VALORIZACION N° 40.- ARQUITECTURA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA.

UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
FORMULA ECONOMICA No 02

ARQUITECTURA

30-Jun-21

Período del: 16 Ene al 30-Jun-21

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA.
UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
FORMULA ECONOMICA No 02
FECHA DE PRESUPUESTO: 30-Jun-21
FECHA DE CORTE: 30-Jun-21

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO UNIDAD, P.U., MONTO CONTRACTUAL, METRADO ANTERIOR, MONTO ANTERIOR, PRESENTE MES METRADO, MONTO PRESENTE MES, ACUMULADO ANTERIOR METRADO, MONTO ANTERIOR ACUMULADO, METRADO ACTUAL, MONTO ACTUAL, SALDO %, MONTO.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

VALORIZACIÓN N° 40 : ARQUITECTURA

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA",  
QUITOS - MAYNAS - LORETO  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONSORCIO SALUD LORETO  
SI. 217.226.482.39  
310992015

ARQUITECTURA  
30-Jun-21

OBRA UBICACION  
ENTIDAD CONTRATISTA  
MONTO CONTRATADO  
FECHA DE PRESUPUESTO  
FORMULA POLINOMICA No 02  
FECHA DE CONTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO UNID CANTIDAD, P.U., CONTRACTUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR MONTO, PRESENTE MES MONTO, ACUMULADO ACTUAL MONTO, METRADO %, MONTO %, SALDO %, MONTO. Rows include items like SEÑALES ADHESIVAS, EXTINTORES, EXTRUJIDORES, etc.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
JEFE DE SUPERVISION  
CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : ARQUITECTURA**

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GANAYAR GARCIA".

QUITOS - MAYNAS - LORETO  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONSORCIO SALUD LORETO  
SI: 217.226.482.36

31/08/2015  
**ARQUITECTURA**  
30-Jun-21


OBRA  
UBICACION  
ENTIDAD  
CONTRATISTA  
MONTO CONTRATADO  
FECHA DE PRESUPUESTO  
FORMULA POLINOMICA No 02  
FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRATIA		ACUMLADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMLADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
02.16.01.01	MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR CAMBIO EN EL RELIEVE DEL SUELO												
02.16.01.01.01	PLAN DE CONTROL DE SEÑALACION PARA TRAFICO DE VAGANARIAS Y VEHICULOS	mies	24.00	1.970,23	47.255,52	23.00	45.315,25			23.00	95.83%	45.315,25	1.970,23
02.16.01.02	MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR CONTAMINACION DE AIRE												
02.16.01.02.01	CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL AIRE	mies	24.00	826,53	19.837,92	23.00	19.011,34			23.00	95,83%	19.011,34	826,53
02.16.01.02.02	PROTECCION DE MATERIAL DESCARGADO EN RUMAS	mies	12.00	435,51	5.226,12	12.00	5.226,12			12.00	100,00%	5.226,12	
02.16.01.02.03	ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE RUJIAS Y TIEMPOS PARAMINIMIZAR EL USO DE EQUIPOS	mies	6.00	150,42	902,52	6.00	902,52			6.00	100,00%	902,52	
02.16.01.02.04	COLOCACION DE MALLAS VERTICALES PARA EVITAR EMISION DE POLVO A LAS VIVIENDAS	mies	20.00	1.092,02	21.840,40	18.50	21.731,20			18.50	92,50%	21.731,20	109,20
02.16.01.02.05	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS Y MONITOREO AMBIENTAL	mies	8.00	1.092,02	8.736,16	8.00	8.736,16			8.00	100,00%	8.736,16	
02.16.01.02.06	PROGRAMA DE INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PORTATIL PARA TRABAJADORES	und	11.00	9.593,03	105.413,33	11.00	105.413,33			11.00	100,00%	105.413,33	
02.16.01.03	MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTO AMBIENTAL POR CONTAMINACION DEL AGUA												
02.16.01.03.01	MEDIDAS DE LA CONTAMINACION DEL AGUA Y MONITOREO AMBIENTAL	mies	12.00	1.317,06	15.804,72	12.00	15.804,72			12.00	100,00%	15.804,72	
02.16.01.03.02	RECHERCHES PARA LA REDUCCION DE LOS RIESGOS POR RESIPIROS SOLIDOS	mies	12.00	509,34	6.112,08	12.00	6.112,08			12.00	100,00%	6.112,08	
02.16.01.04.01	REPOSICION PARA LA REDUCCION DE LOS RIESGOS DE CONSTITUCION	mies	12.00	509,34	6.112,08	12.00	6.112,08			12.00	100,00%	6.112,08	
02.16.01.04.02	REPOSICION DE RECIUDOS PELIGROSOS Y/O PELIGROSOS SEGUN EL ANEXO EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION	mies	12.00	509,34	6.112,08	12.00	6.112,08			12.00	100,00%	6.112,08	
02.16.01.04.03	REUTILIZACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION (GAMARRA, BOLEAS DE CEMENTO, PLASTICO, ETC.)	mies	6.00	319,15	1.914,90	6.00	1.914,90			6.00	100,00%	1.914,90	
02.16.01.05	MEDIDAS DE CONTROL POR IMPACTOS A LA SALUD Y SEGURIDAD												
02.16.01.05.01	INFECCION GARRA PARA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL USO DE EPPS Y LOS ACUERDOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS	mies	24.00	569,60	14.150,40	23.50	13.855,60			23.50	97,92%	13.855,60	294,80
02.16.01.05.02	RESERVA ANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ENCAJO DE EMERGENCIAS	mies	6.00	1.543,15	9.258,90	6.00	9.258,90			6.00	100,00%	9.258,90	
02.16.02	ETAPA DE OBRAS												
02.16.02.01	MEDIDAS DE CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES POR DE TERRO DEL PASAJE												
02.16.02.01.01	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EXTERIORES DE OBRA	gb	1.00	9.224,63	9.224,63	1.00	9.224,63			1.00	100,00%	9.224,63	
02.16.03	ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO												
02.16.03.01	PLAN DE CONTINGENCIAS	mies	3.00	2.063,60	6.190,80	3.00	6.190,80			3.00	100,00%	6.190,80	
02.16.03.01.01	CAPACITACION DE EDUCACION AMBIENTAL	gb	1.00	9.799,02	9.799,02	0,97	9.502,14			0,97	97,00%	9.502,14	296,88
02.16.03.01.02	PLAN DE EMERGENCIAS Y COORDINACION												
02.16.03.02	ALMACENAMIENTO, RECOLECCION Y TRANSPORTE	gb	1.00	10.504,84	10.504,84	0,97	10.169,69			0,97	97,00%	10.169,69	335,15
02.16.03.02.01	COSTO DIRECTO												
	GASTOS GENERALES			SI,	26.114.293,41		16.700.153,16		186.535,46			16.886.889,61	9.227.607,21
	UNIDAD			14,89%	3.869.557,73		2.465.748,37		27.776,35			2.514.524,72	1.374.043,52
	I.G.V.			3,00%	783.425,80		501.004,59		5.698,09			506.602,68	276.828,22
	SUBTOTAL			SI,	30.786.289,94		19.687.906,11		219.805,90			19.907.415,02	10.878.478,95
	TOTAL			18,00%	5.541.532,19		3.543.823,10		39.583,60			3.583.406,70	1.958.126,21
				SI,	36.327.822,13		33.231.729,21		259.489,50			23.491.221,72	12.836.605,16



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
RESIDENTE DE OBRA  
SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
JEFE DE SUPERVISION  
CIP N° 41863

SOP

 <b>CONSORCIO SALUD LORETO</b>	Proyecto:	<b>VALORIZACION No40</b>
	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	<b>JUNIO 2021</b>
		Revisión:

**VALORIZACIÓN DE  
INSTALACIONES SANITARIAS**



**VALORIZACIÓN N° 40.- INSTALACIONES SANITARIAS**  
 Planificación 16 Enero al 30 Jun-21  
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N°2 CESAR GARAYAR GARCIA"  
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 SI: 211.226.482.36  
 31/08/2015  
**INSTALACIONES SANITARIAS**  
 30-Jun-21

OBRA: UBICACION  
 ENTIDAD:  
 CONTRATISTA:  
 MONTO CONTRATADO:  
 FECHA DE PRESUPUESTO:  
 FORMULA POLINOMICA No. 03  
 FECHA DE CORTE

CÓDIGO	PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	UNID	CANTIDAD	VAL. CONTRACTUAL	AGUILLADO ANTERIOR		PRESENTES		AGUILLADO ACTUAL		SALDO
						METRO	MONTO	METRO	MONTO	METRO	MONTO	
01.02.05.01	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA											
01.02.05.01	CODO DE COBRE 1" X 90°		pza	1,419.00	59.16	79,631.04	1,419.00			1,419.00	100.00%	79,631.04
01.02.05.01	CODO DE COBRE 3/4" X 90°		pza	92.00	59.27	5,350.84	92.00			92.00	100.00%	5,350.84
01.02.05.01	CODO DE COBRE 1" X 90°		pza	151.00	59.12	8,927.12	151.00			151.00	100.00%	8,927.12
01.02.05.01	CODO DE COBRE 1 1/4" X 90°		pza	1,002.00	62.81	62,935.62	1,002.00			1,002.00	100.00%	62,935.62
01.02.05.01	CODO DE COBRE 1 1/2" X 90°		pza	52.00	65.09	3,394.63	52.00			52.00	100.00%	3,394.63
01.02.05.01	CODO DE COBRE 2" X 90°		pza	12.00	76.42	918.24	12.00			12.00	100.00%	918.24
01.02.05.01	CODO DE COBRE 2 1/2" X 90°		pza	9.00	120.05	1,080.45	9.00			9.00	100.00%	1,080.45
01.02.05.01	CODO DE COBRE 3" X 90°		pza	18.00	140.16	2,522.88	18.00			18.00	100.00%	2,522.88
01.02.05.01	CODO DE COBRE 4" X 90°		pza	936.00	72.93	68,262.48	936.00			936.00	100.00%	68,262.48
01.02.05.01	CODO DE COBRE 6" X 90°		pza	171.00	64.44	11,019.24	171.00			171.00	100.00%	11,019.24
01.02.05.01	TEE DE COBRE 1"		pza	1,000.00	82.36	82,360.00	1,000.00			1,000.00	100.00%	82,360.00
01.02.05.01	TEE DE COBRE 1 1/4"		pza	981.00	92.36	90,624.36	981.00			981.00	100.00%	90,624.36
01.02.05.01	TEE DE COBRE 1 1/2"		pza	75.00	81.94	6,145.50	75.00			75.00	100.00%	6,145.50
01.02.05.01	TEE DE COBRE 2"		pza	76.00	112.41	8,543.16	76.00			76.00	100.00%	8,543.16
01.02.05.01	TEE DE COBRE 2 1/2"		pza	13.00	116.00	1,508.00	13.00			13.00	100.00%	1,508.00
01.02.05.01	TEE DE COBRE 3"		pza	10.00	131.22	1,312.20	10.00			10.00	100.00%	1,312.20
01.02.05.01	TEE DE COBRE 4"		pza	14.00	141.79	1,985.06	14.00			14.00	100.00%	1,985.06
01.02.05.01	REDACCION DE COBRE 3/4" X 1/2"		pza	201.00	58.39	11,738.39	201.00			201.00	100.00%	11,738.39
01.02.05.01	REDACCION DE COBRE 1" X 3/4"		pza	25.00	61.43	1,535.75	25.00			25.00	100.00%	1,535.75
01.02.05.01	REDACCION DE COBRE 1 1/4" X 1/2"		pza	157.00	58.35	9,160.95	157.00			157.00	100.00%	9,160.95
01.02.05.01	REDACCION DE COBRE 1 1/2" X 1/2"		pza	62.24	66.88	4,162.14	62.24			62.24	100.00%	4,162.14
01.02.05.01	REDACCION DE COBRE 1 1/4" X 3/4"		pza	312.00	63.49	19,809.88	312.00			312.00	100.00%	19,809.88
01.02.05.01	REDACCION DE COBRE 1 1/2" X 3/4"		pza	10.00	89.97	899.70	10.00			10.00	100.00%	899.70
01.02.05.01	REDACCION DE COBRE 1 1/2" X 1/2"		pza	25.00	63.16	1,579.00	25.00			25.00	100.00%	1,579.00
01.02.05.01	REDACCION DE COBRE 1 1/2" X 1 1/4"		pza	159.00	63.22	10,051.98	159.00			159.00	100.00%	10,051.98
01.02.05.01	REDACCION DE COBRE 2" X 1 1/4"		pza	9.00	69.66	626.94	9.00			9.00	100.00%	626.94
01.02.05.01	REDACCION DE COBRE 2" X 3"		pza	3.00	74.27	222.81	3.00			3.00	100.00%	222.81
01.02.05.01	REDACCION DE COBRE 2" X 1"		pza	2.00	74.67	149.34	2.00			2.00	100.00%	149.34
01.02.05.01	REDACCION DE COBRE 2" X 1 1/4"		pza	70.00	71.37	5,005.90	70.00			70.00	100.00%	5,005.90
01.02.05.01	REDACCION DE COBRE 2" X 1 1/2"		pza	875.00	3.98	3,482.50	875.00			875.00	100.00%	3,482.50
01.02.05.01	TAPON HEMBRA 1/2" CR		pza	38.00	3.98	151.24	38.00			38.00	100.00%	151.24
01.02.05.01	TAPON HEMBRA 1 1/4" CR		pza	39.00	3.72	145.08	39.00			39.00	100.00%	145.08
01.02.05.01	TAPON HEMBRA 1 1/2" CR		pza	3.00	3.33	9.99	3.00			3.00	100.00%	9.99
01.02.05.01	VALVULAS											
01.02.05.01	VALVULA COMPUESTA DE BRONZE DE 1/2"		pza	308.00	59.47	18,308.76	308.00			308.00	100.00%	18,308.76
01.02.05.01	VALVULA COMPUESTA DE BRONZE DE 1"		pza	48.00	76.53	3,674.12	48.00			48.00	100.00%	3,674.12
01.02.05.01	VALVULA COMPUESTA DE BRONZE DE 1 1/4"		pza	283.00	116.63	33,006.21	283.00			283.00	100.00%	33,006.21
01.02.05.01	VALVULA COMPUESTA DE BRONZE DE 1 1/2"		pza	48.00	139.23	6,703.04	44.00			44.00	91.67%	6,081.12
01.02.05.01	VALVULA COMPUESTA DE BRONZE DE 2"		pza	50.00	181.84	9,092.00	48.00			48.00	96.00%	8,728.32
01.02.05.01	VALVULA COMPUESTA DE BRONZE DE 2 1/2"		pza	7.00	289.10	2,022.70	7.00			7.00	100.00%	2,022.70
01.02.05.01	VALVULA COMPUESTA DE BRONZE DE 4"		pza	1.00	656.06	656.06	1.00			1.00	100.00%	656.06
01.02.05.01	LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2"		pza	1.00	40.16	40.16	1.00			1.00	100.00%	40.16
01.02.05.01	CAJA PIV VALVULA Ø X 20 CM		pza	208.00	40.95	8,517.60	183.00			183.00	87.93%	7,493.85
01.02.05.01	CAJA PIV VALVULA Ø X 30 CM		pza	12.00	54.55	654.57	9.15			9.15	76.25%	499.22
01.02.05.01	CAJA PIV VALVULA Ø X 35 CM		pza	233.00	59.82	13,933.06	189.00			189.00	80.69%	11,246.16
01.02.05.01	PREZAS VARIS											
01.02.05.01	COLOCADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOYA O SIMILAR		pza	658.00	39.94	26,369.52	658.00			658.00	100.00%	26,369.52
01.02.05.01	COLOCADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3/4" TIPO GOYA O SIMILAR		pza	148.00	35.04	5,185.92	144.00			144.00	97.29%	5,185.92
01.02.05.01	COLOCADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1" TIPO GOYA O SIMILAR		pza	48.00	38.04	1,825.92	47.00			47.00	97.92%	1,825.92
01.02.05.01	COLOCADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOYA O SIMILAR		pza	597.00	40.04	23,903.46	597.00			597.00	100.00%	23,903.46
01.02.05.01	JUNTAS											
01.02.05.01	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 1 1/2"		und	2.00	78.55	157.10	2.00			2.00	100.00%	157.10
01.02.05.01	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 2"		und	2.00	93.57	187.14	2.00			2.00	100.00%	187.14
01.02.05.01	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 2 1/2"		und	2.00	132.97	265.94	2.00			2.00	100.00%	265.94



**CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
 .....  
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863.

498

**VALORIZACIÓN N° 40 - INSTALACIONES SANITARIAS**  
 PUNTO DEL 15º ANIVERSARIO  
 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N°2 CESAR GARAYAR GARCIA -  
 IGUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 SI: 217.226.482.36  
 31/08/2015  
**INSTALACIONES SANITARIAS**  
 30-Jun-21

OBRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CONTRATISTA  
 PUNTO DE CONTROL  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA POLITAMICA No. 03  
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	M E T R A D O	CONTINGENCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE LINE	ACUMULADO ACTUAL	SALDO
UNID	CANTIDAD	VAL	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
03.03.01.01	JARJA DE ESPUNJACION PARA TUB. DE COBRE DE 3"	1.00	132.83	1.00	132.83	1.00	132.83
03.03.01.02	ALMACENAMIENTO DE AGUA	2.00	24,181.54	2.00	24,181.54	2.00	24,181.54
03.03.01.03	SISTEMA DE CLORACION	1.00	44,225.17	0.80	35,412.14	0.80	8,813.03
03.03.01.04	EQUIPOS Y OTAS INSTALACIONES	1.00	12,384.06	0.46	5,638.67	0.46	6,745.39
03.03.01.05	CUARTO DE EQUIPOS - AGUA FRIA	1.00	5,524.95	4.98	5,397.79	4.98	127.16
03.03.01.06	INSTALACION DE EQUIPOS CUARTO DE EMERGENCIAS	1.00	5,524.95	4.98	5,397.79	4.98	127.16
03.03.01.07	PREMISAS INDIVIDUALES	1.00	5,524.95	4.98	5,397.79	4.98	127.16
03.03.01.08	SISTEMA DE AGUA CALIENTE	1.00	5,524.95	4.98	5,397.79	4.98	127.16
03.03.01.09	SISTEMA DE AGUA CALIENTE 65°	1.00	5,524.95	4.98	5,397.79	4.98	127.16
03.03.01.10	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO 1 1/2"	192.00	274.59	191.00	52,446.69	191.00	52,446.69
03.03.01.11	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA CALIENTE 65°	810.58	67.73	54,900.53	810.58	54,900.53	810.58
03.03.01.12	TUBERIA DE COBRE TIPO 1"	73.72	123.71	73.72	9,553.23	73.72	9,553.23
03.03.01.13	TUBERIA DE COBRE TIPO 1 1/4"	348.04	122.71	42,462.57	348.04	42,462.57	348.04
03.03.01.14	TUBERIA DE COBRE TIPO 1 1/2"	54.70	153.39	8,390.43	54.70	8,390.43	54.70
03.03.01.15	TUBERIA DE COBRE TIPO 2"	20.60	187.91	3,870.95	20.60	3,870.95	20.60
03.03.01.16	TUBERIA DE COBRE TIPO 2 1/2"	165.10	235.09	39,048.45	165.10	39,048.45	165.10
03.03.01.17	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE 65°	3,149.59	48.72	153,448.02	3,149.59	153,448.02	3,149.59
03.03.01.18	TUBERIA DE COBRE TIPO 1 1/2"	683.23	91.82	61,356.88	683.23	61,356.88	683.23
03.03.01.19	TUBERIA DE COBRE TIPO 1 3/4"	789.00	56.16	44,310.24	789.00	44,310.24	789.00
03.03.01.20	COUDO DE COBRE 1 1/2" X 60°	170.00	9,950.90	170.00	170.00	170.00	170.00
03.03.01.21	COUDO DE COBRE 1 1/2" X 90°	8.00	246.60	8.00	246.60	8.00	246.60
03.03.01.22	COUDO DE COBRE 2 1/2" X 90°	6.00	256.72	6.00	256.72	6.00	256.72
03.03.01.23	TEE DE COBRE 1 1/2"	82.00	72.93	5,850.23	82.00	5,850.23	82.00
03.03.01.24	TEE DE COBRE 1 1/2" X 34"	29.00	76.44	2,216.76	29.00	2,216.76	29.00
03.03.01.25	TEE DE COBRE 2"	11.00	91.52	1,006.72	11.00	1,006.72	11.00
03.03.01.26	TEE DE COBRE 2 1/2"	5.00	112.26	561.30	5.00	561.30	5.00
03.03.01.27	REDUCCION DE COBRE 3 1/4" - 1 1/2"	63.00	58.39	4,028.91	63.00	4,028.91	63.00
03.03.01.28	REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2"	27.00	61.43	1,537.18	27.00	1,537.18	27.00
03.03.01.29	REDUCCION DE COBRE 1 1/4" - 1"	69.00	63.53	4,333.57	69.00	4,333.57	69.00
03.03.01.30	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4"	213.00	58.35	12,426.55	213.00	12,426.55	213.00
03.03.01.31	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/2"	14.00	69.49	825.37	14.00	825.37	14.00
03.03.01.32	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	79.00	59.97	4,729.73	79.00	4,729.73	79.00
03.03.01.33	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	101.00	63.78	6,314.23	101.00	6,314.23	101.00
03.03.01.34	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/4"	5.00	63.23	315.55	5.00	315.55	5.00
03.03.01.35	REDUCCION DE COBRE 2 1/2" - 2"	4.00	80.65	323.52	4.00	323.52	4.00
03.03.01.36	VALVULAS DE RED DE AGUA CALIENTE 65°	408.00	58.47	23,655.76	408.00	23,655.76	408.00
03.03.01.37	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	17.00	76.69	1,303.73	17.00	1,303.73	17.00
03.03.01.38	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	4.00	76.33	305.32	4.00	305.32	4.00
03.03.01.39	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	8.00	136.23	1,091.12	8.00	1,091.12	8.00
03.03.01.40	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	4.00	181.84	727.39	4.00	727.39	4.00
03.03.01.41	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"	2.00	56.97	193.94	2.00	193.94	2.00
03.03.01.42	VALVULA CHECK 1"	43.00	112.69	4,845.67	43.00	4,845.67	43.00
03.03.01.43	CAJA P/ VALVULA 20 X 30 CM	425.00	40.55	17,402.75	425.00	17,402.75	425.00
03.03.01.44	CAJA P/ VALVULA 30 X 30 CM	4.00	46.63	186.60	4.00	186.60	4.00
03.03.01.45	PREZAS VARIAS - RED DE AGUA CALIENTE 65°	14.00	54.58	763.84	14.00	763.84	14.00
03.03.01.46	COLADOR PARA UNA TUBERIA 9 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	392.00	30.84	11,810.08	392.00	11,810.08	392.00
03.03.01.47	COLADOR PARA UNA TUBERIA 9 3/4" TIPO GOTA O SIMILAR	263.00	35.04	9,216.72	263.00	9,216.72	263.00
03.03.01.48	COLADOR PARA UNA TUBERIA 9 1/2" TIPO GOTA O SIMILAR	302.00	31.69	9,580.78	302.00	9,580.78	302.00



**CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
 ING. SATURNINO RAUL MELGARO PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863



**VALORIZACIÓN N° 40.- INSTALACIONES SANITARIAS**  
 Periodo del 18 Ene al 30-Jun-21  
 "MEMORANDO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL "IZ CESAR GARAYAR GARCIA",  
 IQUITOS, MAYNAS, PERU  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 S/ 217,226,482.36  
 31/08/2015  
**INSTALACIONES SANITARIAS**  
**30-Jun-21**

OBRA: UBICACION: ENTIDAD: CONTRATISTA: MONTO CONTRATADO: FECHA DE PRESUPUESTO: FORMULA POLINOMICA No. 03: FECHA DE CORTE:

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO UNID	CONTRATUAL MONTO	ACUMLADO ANTERIOR METRADO MONTO	PRESENTE MES METRADO MONTO	ACUMLADO ACTUAL METRADO MONTO	METRADO %	SALDO MONTO	
03.03.03.04	COAGULADOR PARA UNA TUBERIA O 1 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	13.00	38.04	404.52		13.00	100.00%	494.52	
03.03.03.05	COAGULADOR PARA UNA TUBERIA O 1 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	116.00	40.64	4,644.64		116.00	100.00%	4,817.51	
03.03.04.05	COAGULADOR PARA UNA TUBERIA O 2 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	14.00	53.38	817.32		14.00	100.00%	817.51	
03.03.04.07	COAGULADOR PARA UNA TUBERIA O 2 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	18.00	61.59	1,103.62		18.00	100.00%	1,103.62	
03.03.07.01	JUNTAS - RED DE AGUA CALIENTE 65"	2.00	78.55	157.10	2.00	2.00	100.00%	157.10	
03.03.07.02	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 2"	2.00	93.57	187.14	2.00	2.00	100.00%	187.14	
03.03.07.03	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 2 1/2"	2.00	132.97	265.94	2.00	2.00	100.00%	265.94	
03.04	SISTEMA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE DE 93"								
03.04.01	REDES DE ALIMENTACION - RETORNO DE AGUA CALIENTE 65"								
03.04.01.01	REDES DE COBRE TIPO L 1/2"	27.60	45.72	1,354.42	27.60	27.60	100.00%	1,354.42	
03.04.01.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	77.37	53.97	4,407.77	77.37	77.37	100.00%	4,407.77	
03.04.01.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	67.73	62.909	92,909.98	1,371.77	1,371.77	100.00%	92,909.98	
03.04.01.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	22.71	21.85	218.5	2,645.63	2,645.63	100.00%	2,645.63	
03.04.01.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	15.43	10.71	107.1	15.43	15.43	100.00%	107.1	
03.04.01.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	153.39	29,045.93	29,045.93	153.39	153.39	100.00%	29,045.93	
03.04.02	ACCESORIOS - RETORNO DE AGUA CALIENTE 65"								
03.04.02.01	CORDO DE COBRE 1" X 50'	37.00	53.12	2,187.44	37.00	37.00	100.00%	2,187.44	
03.04.02.02	CORDO DE COBRE 1 1/2" X 50'	6.00	65.09	390.54	6.00	6.00	100.00%	390.54	
03.04.02.03	CORDO DE COBRE 2" X 50'	2.00	76.42	152.84	2.00	2.00	100.00%	152.84	
03.04.02.04	CORDO DE COBRE 2 1/2" X 50'	232.00	79.75	18,502.00	232.00	232.00	100.00%	18,502.00	
03.04.02.05	TEE DE COBRE 1"	58.00	43.10	2,847.80	58.00	58.00	100.00%	2,847.80	
03.04.02.06	TEE DE COBRE 1 1/2"	1.00	91.94	91.94	1.00	1.00	100.00%	91.94	
03.04.02.07	TEE DE COBRE 2"	8.00	65.75	526.00	8.00	8.00	100.00%	526.00	
03.04.02.08	VALVULA 1/2" DE COBRE 2" - 1"	2.00	74.87	149.34	2.00	2.00	100.00%	149.34	
03.04.03	VALVULA COMPLETIA DE BRONCE OS 1"								
03.04.03.01	VALVULA COMPLETIA DE BRONCE OS 1"	37.00	76.33	2,824.21	35.00	2,671.55	35.00	94.59%	2,671.55
03.04.03.02	VALVULA COMPLETIA DE BRONCE DE 1 1/2"	7.00	132.23	925.61	7.00	953.61	7.00	100.00%	953.61
03.04.03.03	VALVULA COMPLETIA DE BRONCE DE 2"	3.00	181.84	545.52	3.00	545.52	3.00	100.00%	545.52
03.04.04	PREZAS VARAS								
03.04.04.01	COAGULADOR PARA UNA TUBERIA O 1" TIPO GOTTA O SIMILAR	492.00	31.89	15,659.88	492.00	15,659.88	492.00	100.00%	15,659.88
03.04.04.02	COAGULADOR PARA UNA TUBERIA O 1 1/2" TIPO GOTTA O SIMILAR	11.00	40.04	440.44	11.00	440.44	11.00	100.00%	440.44
03.04.04.03	COAGULADOR PARA UNA TUBERIA O 2" TIPO GOTTA O SIMILAR	26.00	58.38	26,000.00	26.00	1,517.88	23.00	100.00%	1,517.88
03.04.05	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 1"								
03.04.05.01	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 1"	3.00	55.15	165.45	3.00	165.45	3.00	100.00%	165.45
03.04.06	INSTALACIONES ESPECIALES - RED DE AGUA CALIENTE 65"								
03.04.06.01	CUARTO DE BOQUAS - AGUA CALIENTE	1.00	221,517.73	221,517.73	0.60	177,214.18	0.60	80.00%	177,214.18
03.04.06.02	INSTALACIONES DE EQUIPO PUNTO DE EMERGENCIA TIPO 3"	1.00	57,292.83	57,292.83	0.30	17,187.86	0.30	30.00%	17,187.86
03.04.07.01	PROBETA HORIZONTAL - RED DE AGUA CALIENTE 65"								
03.04.07.02	PROBETA HORIZONTAL DE RETORNO AGUA CALIENTE	3,897.16	1.05	4,197.02	3,797.73	3,897.62	3,797.73	95.01%	3,897.62
03.05	SISTEMA DE AGUA CALIENTE 60"								
03.05.01	SALIDAS DE AGUA CALIENTE 60"								
03.05.01.01	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 1/2"	2.00	274.59	549.18	2.00	549.18	2.00	100.00%	549.18
03.05.01.02	SALIDA AGUA CALIENTE CON TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	8.00	425.63	3,831.21	9.00	3,831.21	9.00	100.00%	3,831.21
03.05.02	REDES DE ALIMENTACION DE AGUA CALIENTE 60"								
03.05.02.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1"	48.44	67.73	3,280.84	48.00	3,115.58	48.00	100.00%	3,280.84
03.05.02.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L 1 1/2"	152.17	92.83	14,125.94	152.17	14,125.94	152.17	100.00%	14,125.94
03.05.02.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L 2"	15.57	153.39	2,389.29	15.57	2,389.29	15.57	100.00%	2,389.29
03.05.03	REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE 60"								
03.05.03.01	TUBERIA DE COBRE TIPO L 3/4"	35.90	91.82	3,295.34	33.81	3,104.43	33.81	94.18%	3,295.34
03.05.04	ACCESORIOS - RED DE AGUA CALIENTE 60"								
03.05.04.01	CORDO DE COBRE 1 1/2" X 50'	2.00	55.16	112.32	2.00	112.32	2.00	100.00%	112.32
03.05.04.02	CORDO DE COBRE 1" X 50'	3.00	58.27	174.81	3.00	174.81	3.00	100.00%	174.81
03.05.04.03	CORDO DE COBRE 1 1/2" X 60'	4.00	59.12	235.48	4.00	235.48	4.00	100.00%	235.48
03.05.04.04	CORDO DE COBRE 2" X 60'	5.00	76.42	382.10	5.00	382.10	5.00	100.00%	382.10
03.05.04.05	TEE DE COBRE 3/4"	1.00	91.65	91.65	1.00	395.76	1.00	100.00%	395.76
03.05.04.06	TEE DE COBRE 1"	2.00	91.94	183.88	2.00	183.88	2.00	100.00%	183.88



**CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 - INSTALACIONES SANITARIAS**  
 Periodo del 18 Ene al 30 Jun-21  
 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N°2 CESAR GARAYAR GARCIA\*  
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 SI/ 211,226,482.36  
 31/08/2015  
**INSTALACIONES SANITARIAS**  
 30-Jun-21

OBRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CONTRATISTA  
 MONTO CONTRATADO  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA POLINOMICA No. 03  
 FECHA DE COBRE

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	ME TR D O	CON TRACTUAL	ACU M U L A D O A N T E R I O R	P R E S E N T E M E S	ACU M U L A D O A C T U A L	M E T R A D O	S A L D O
UNID	MONTO	M E T R A D O	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	%	MONTO
01.05.04.08	TEE DE COBRE 2"	1.00	112.41	112.41	2.41	114.82	100.00%	
01.05.04.09	REDACCION DE COBRE 1" - 3/4"	1.00	63.53	63.53	6.41	70.04	100.00%	
01.05.04.10	REDACCION DE COBRE 1 1/2" - 1 1/2"	1.00	63.53	63.53	6.41	70.04	100.00%	
01.05.04.11	REDACCION DE COBRE 1 1/2" - 3/4"	2.00	59.87	119.74	119.74	119.74	100.00%	
01.05.04.12	REDACCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	1.00	63.78	63.78	63.78	63.78	100.00%	
01.05.04.13	REDACCION DE COBRE 2" - 1"	1.00	63.11	63.11	63.11	63.11	100.00%	
01.05.04.14	REDACCION DE COBRE 2" - 1 1/2"	1.00	74.67	74.67	74.67	74.67	100.00%	
01.05.04.15	VALVULAS - RED DE AGUA CALIENTE 80"	1.00	72.56	72.56	72.56	72.56	100.00%	
01.05.05.01	VALVULA CUBIERTA DE BROSQUE DE 1 1/2"	2.00	53.47	116.94	116.94	116.94	100.00%	
01.05.05.02	VALVULA CUBIERTA DE BROSQUE DE 3/4"	2.00	76.33	153.38	153.38	153.38	100.00%	
01.05.05.03	VALVULA CUBIERTA DE BROSQUE DE 1"	1.00	76.33	76.33	76.33	76.33	100.00%	
01.05.05.04	VALVULA CHECK - TAPA DE BROSQUE DE 2"	1.00	181.84	181.84	181.84	181.84	100.00%	
01.05.05.05	VALVULA CHECK - TAPA DE BROSQUE DE 2"	1.00	121.09	339.07	339.07	339.07	100.00%	
01.05.05.06	CAJA PI VALVULA 20 X 20 CM	2.00	49.55	49.55	49.55	49.55	100.00%	
01.05.05.07	CAJA PI VALVULA 20 X 20 CM	1.00	54.56	54.56	54.56	54.56	100.00%	
01.05.05.08	CAJA PI VALVULA 30 X 30 CM	1.00	30.94	123.76	123.76	123.76	100.00%	
01.05.05.09	COGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTIA O SIMILAR	4.00	35.04	140.16	140.16	140.16	100.00%	
01.05.05.10	COGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3/4" TIPO GOTIA O SIMILAR	1.00	35.04	35.04	35.04	35.04	100.00%	
01.05.05.11	COGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1" TIPO GOTIA O SIMILAR	23.00	31.89	733.47	733.47	733.47	100.00%	
01.05.05.12	COGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTIA O SIMILAR	6.00	40.34	240.24	240.24	240.24	100.00%	
01.05.05.13	COGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 2" TIPO GOTIA O SIMILAR	10.00	58.38	583.80	583.80	583.80	100.00%	
01.05.05.14	JUNTAS - RED DE AGUA CALIENTE 80"	1.00	93.57	93.57	93.57	93.57	100.00%	
01.05.05.15	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 2"	1.00	93.57	93.57	93.57	93.57	100.00%	
01.05.05.16	REDES DE COBRE DE AGUA CALIENTE 80"	1.00	93.57	93.57	93.57	93.57	100.00%	
01.05.05.17	REDES DE COBRE TIPO 1 1/2"	1.00	93.57	93.57	93.57	93.57	100.00%	
01.05.05.18	TUBERIA DE COBRE TIPO 1 1/2"	1.00	93.57	93.57	93.57	93.57	100.00%	
01.05.05.19	TUBERIA DE COBRE TIPO 1 1/2"	1.00	93.57	93.57	93.57	93.57	100.00%	
01.05.05.20	TUBERIA DE COBRE TIPO 1 1/2"	1.00	93.57	93.57	93.57	93.57	100.00%	
01.05.05.21	ACCESORIOS - RETORNO DE AGUA CALIENTE 80"	1.00	93.57	93.57	93.57	93.57	100.00%	
01.05.05.22	COOD DE COBRE 1" X 90"	6.00	59.12	354.72	354.72	354.72	100.00%	
01.05.05.23	COOD DE COBRE 1 1/2" X 90"	3.00	65.09	195.27	195.27	195.27	100.00%	
01.05.05.24	COOD DE COBRE 2" X 90"	2.00	78.42	152.84	152.84	152.84	100.00%	
01.05.05.25	TEE DE COBRE 1"	1.00	91.52	91.52	91.52	91.52	100.00%	
01.05.05.26	TEE DE COBRE 1 1/2"	1.00	91.94	91.94	91.94	91.94	100.00%	
01.05.05.27	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" - 1"	1.00	63.11	63.11	63.11	63.11	100.00%	
01.05.05.28	REDUCCION DE COBRE 2" - 1 1/2"	1.00	74.67	74.67	74.67	74.67	100.00%	
01.05.05.29	REDUCCION DE COBRE 2" - 1"	1.00	72.56	72.56	72.56	72.56	100.00%	
01.05.05.30	PIEZAS DE RETORNO Y PAREDES RETORNO AGUA CALIENTE 80"	1.00	76.33	76.33	76.33	76.33	100.00%	
01.05.05.31	VALVULA CUBIERTA DE BROSQUE DE 1 1/2"	1.00	136.23	136.23	136.23	136.23	100.00%	
01.05.05.32	VALVULA CUBIERTA DE BROSQUE DE 1 1/2"	1.00	136.23	136.23	136.23	136.23	100.00%	
01.05.05.33	COGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1" TIPO GOTIA O SIMILAR	1.00	31.89	31.89	31.89	31.89	100.00%	
01.05.05.34	COGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1 1/2" TIPO GOTIA O SIMILAR	26.00	40.34	1048.84	1048.84	1048.84	100.00%	
01.05.05.35	COGADOR PARA UNA TUBERIA Ø 2" TIPO GOTIA O SIMILAR	1.00	40.34	40.34	40.34	40.34	100.00%	
01.05.05.36	JUNTAS DE REDES DE AGUA CALIENTE 80"	8.00	58.38	467.04	467.04	467.04	100.00%	
01.05.05.37	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 1"	1.00	55.15	55.15	55.15	55.15	100.00%	
01.05.05.38	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 2"	2.00	93.57	187.14	187.14	187.14	100.00%	
01.05.05.39	INSTALACIONES ESPECIALES - RED DE AGUA CALIENTE 80"	1.00	144.674.49	144.674.49	144.674.49	144.674.49	100.00%	
01.05.05.40	CUARTO DE EOGASAS - AGUA CALIENTE 60" Y PAC 60"	0.80	115.739.59	115.739.59	115.739.59	115.739.59	100.00%	
01.05.05.41	INSTALACION DE EQUIPOS PACTUADO DE BOMBAS T=30 C	0.26	4.148.79	4.148.79	4.148.79	4.148.79	100.00%	
01.05.05.42	PROBETA HIDRAULICA - RED DE AGUA CALIENTE 80"	259.40	294.69	294.69	294.69	294.69	100.00%	
01.05.05.43	PROBETA HIDRAULICA DE AGUA CALIENTE	259.40	294.69	294.69	294.69	294.69	100.00%	
01.05.05.44	PROBETA HIDRAULICA DE AGUA CALIENTE	259.40	294.69	294.69	294.69	294.69	100.00%	
01.05.05.45	SISTEMA DE AGUA BLANCA	1.05	227.34	227.34	227.34	227.34	100.00%	
01.05.05.46	SALIDAS DE AGUA BLANCA	1.00	385.92	385.92	385.92	385.92	100.00%	
01.05.05.47	SALIDA AGUA BLANCA CON TUBERIA DE COBRE TIPO 1 1/2"	11.00	4.245.12	4.245.12	4.245.12	4.245.12	100.00%	
01.05.05.48	SALIDA AGUA BLANCA CON TUBERIA DE COBRE TIPO 1 3/4"	18.00	9.550.08	9.550.08	9.550.08	9.550.08	100.00%	
01.05.05.49	REDES DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION	1.00	530.56	530.56	530.56	530.56	100.00%	



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES SANITARIAS**  
 Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21  
 \*MEDICAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GANAYAR GARCÍA\*  
 IGUIGOS MANNAS LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 SI: 217.426.482.35  
 31/08/2015  
**INSTALACIONES SANITARIAS**  
 30-Jun-21

OBRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CONTRATISTA  
 MONTO CONTRATADO  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA PRESUPUESTICA No. 03  
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	PLU	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
01.07.03.01	TUBERIA DE COBRE TIPO 1 1/2"	m	48.72		2,097.65						48.72	2,097.65	
01.07.03.02	TUBERIA DE COBRE TIPO 3/4"	m	163.07	91.82	14,973.09	163.07	14,973.09			163.07	14,973.09		
01.07.03.03	TUBERIA DE COBRE TIPO 1"	m	43.05	67.73	29,548.57	433.27	29,548.57			433.27	29,548.57		
01.07.03.04	TUBERIA DE COBRE TIPO 1 1/4"	m	54.86	92.83	5,092.45	54.86	5,092.45			54.86	5,092.45		
01.07.03.05	TUBERIA DE COBRE TIPO 2"	m	72.78	153.39	11,165.26	72.78	11,165.26			72.78	11,165.26		
01.07.03.06	TUBERIA DE COBRE TIPO 2 1/2"	m	126.22	187.91	23,718.00	126.22	23,718.00			126.22	23,718.00		
01.07.03	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA BLANDA												
01.07.03.01	COODO DE COBRE 1/2" X 50'	pza	4.00	56.16	224.64	4.00	224.64			4.00	224.64		
01.07.03.02	COODO DE COBRE 3/4" X 50'	pza	47.00	58.27	2,738.63	47.00	2,738.63			47.00	2,738.63		
01.07.03.03	COODO DE COBRE 1" X 50'	pza	21.00	59.12	1,241.52	21.00	1,241.52			21.00	1,241.52		
01.07.03.04	COODO DE COBRE 1 1/2" X 40'	pza	1.00	65.09	65.09	1.00	65.09			1.00	65.09		
01.07.03.05	COODO DE COBRE 3" X 40'	pza	2.00	48.13	96.26	2.00	96.26			2.00	96.26		
01.07.03.06	TEE DE COBRE 1/2"	pza	2.00	145.95	291.90	2.00	291.90			2.00	291.90		
01.07.03.07	TEE DE COBRE 1"	pza	11.00	51.52	566.72	11.00	566.72			11.00	566.72		
01.07.03.08	REDUCCION DE COBRE 3/4" X 1/2"	pza	6.00	60.91	365.46	6.00	365.46			6.00	365.46		
01.07.03.09	REDUCCION DE COBRE 1" X 1/2"	pza	6.00	63.49	380.64	6.00	380.64			6.00	380.64		
01.07.03.10	REDUCCION DE COBRE 1" X 3/4"	pza	4.00	63.49	253.96	4.00	253.96			4.00	253.96		
01.07.03.11	REDUCCION DE COBRE 1 1/2" X 1"	pza	2.00	63.11	126.22	2.00	126.22			2.00	126.22		
01.07.04	VALVULAS												
01.07.04.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"	pza	10.00	58.47	584.70	10.00	584.70			10.00	584.70		
01.07.04.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4"	pza	13.00	76.63	996.39	13.00	996.39			13.00	996.39		
01.07.04.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"	pza	16.00	76.33	1,221.28	16.00	1,221.28			16.00	1,221.28		
01.07.04.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	3.00	113.64	340.92	3.00	340.92			3.00	340.92		
01.07.04.05	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2"	pza	4.00	135.23	540.92	4.00	540.92			4.00	540.92		
01.07.04.06	CAJAS P/ VALVULA 20 X 30 CM	pza	13.00	40.55	527.15	13.00	527.15			13.00	527.15		
01.07.04.07	CAJA P/ VALVULA 24 X 24 CM	pza	13.00	40.55	527.15	13.00	527.15			13.00	527.15		
01.07.04.08	CAJA P/ VALVULA 30 X 30 CM	pza	7.00	54.59	382.13	7.00	382.13			7.00	382.13		
01.07.05	PIEZAS VARIAS												
01.07.05.01	COLOCADOR PARA UNA TUBERIA Ø 1/2" TIPO OTOA O SIMILAR	pza	1.00	30.94	30.94	1.00	30.94			1.00	30.94		
01.07.05.02	COLOCADOR PARA UNA TUBERIA Ø 3/4" TIPO OTOA O SIMILAR	pza	10.00	35.04	350.40	10.00	350.40			10.00	350.40		
01.07.06	JUNTAS												
01.07.06.01	JUNTA DE EXPANSION PARA TUB. DE COBRE DE 1 1/2"	und	1.00	78.55	78.55	1.00	78.55			1.00	78.55		
01.07.07	INSTALACIONES ESPECIALES DE AGUA BLANDAS												
01.07.07.01	CURTIDE EXPANSION AGUA BLANDA	und	1.00	69.620.55	69.620.55	1.00	69.620.55			1.00	69.620.55		
01.07.07.02	INSTALACION DE EQUIPOS PUERTO DE BOMBEO AGUA BLANDA	g/b	1.00	5,109.63	5,109.63	1.00	5,109.63			1.00	5,109.63		
01.07.07.03	SISTEMA DE AGUA BLANDA	m	942.12	2.38	2,223.40	942.12	2,223.40			942.12	2,223.40		
01.08	REDES DE ALIMENTACION EN BRONCE												
01.08.01.01	TUBERIA SCH-40 DE 1" - ROGADOROS	m	6,393.55	29.00	185,413.24	6,393.55	185,413.24			6,393.55	185,413.24		
01.08.01.02	TUBERIA SCH-40 DE 1 1/4" - ROGADOROS	m	975.17	32.18	31,420.48	975.17	31,420.48			975.17	31,420.48		
01.08.01.03	TUBERIA SCH-40 DE 1 1/2" - ROGADOROS	m	694.02	41.93	29,030.96	694.02	29,030.96			694.02	29,030.96		
01.08.01.04	TUBERIA SCH-40 DE 2" - ROGADOROS	m	579.34	50.30	29,140.80	579.34	29,140.80			579.34	29,140.80		
01.08.01.05	TUBERIA SCH-40 DE 3" - ROGADOROS	m	351.17	53.27	20,813.65	351.17	20,813.65			351.17	20,813.65		
01.08.01.06	TUBERIA SCH-40 DE 4" - ROGADOROS	m	335.84	116.78	39,336.18	335.28	39,164.00			335.28	39,164.00		
01.08.01.07	TUBERIA SCH-40 DE 2 1/2" - GABINETES COLGADAS	m	176.69	50.30	8,895.00	176.69	8,895.00			176.69	8,895.00		
01.08.01.08	TUBERIA SCH-40 DE 4" - GABINETES COLGADAS	m	18.28	116.78	2,134.74	17.68	2,044.67			17.68	2,044.67		
01.08.01.09	TUBERIA HDPE -40 DE 2 1/2" (CON OVALA DE ARENA)	m	338.14	171.38	57,950.43	338.14	57,950.43			338.14	57,950.43		
01.08.01.10	TUBERIA HDPE -40 DE 4" (CON OVALA DE ARENA)	m	194.73	195.29	38,028.82	194.73	38,028.82			194.73	38,028.82		
01.08.01.11	TUBERIA HDPE -40 DE 6" (CON OVALA DE ARENA)	m	577.25	197.45	113,978.01	577.25	113,978.01			577.25	113,978.01		
01.08.02	ACCESORIOS												
01.08.02.01	COODO SCH-40 1" X 1.60' - RANURADO	pza	685.00	59.60	41,004.80	684.00	40,765.40			684.00	40,765.40		
01.08.02.02	COODO SCH-40 1 1/4" X 1.60' - RANURADO	pza	15.00	63.64	954.60	15.00	954.60			15.00	954.60		
01.08.02.03	COODO SCH-40 1 1/2" X 1.60' - RANURADO	pza	133.00	69.38	9,227.74	133.00	9,227.74			133.00	9,227.74		
01.08.02.04	COODO SCH-40 2" X 1.60' - RANURADO	pza	101.00	50.53	5,112.63	101.00	5,112.63			101.00	5,112.63		
01.08.02.05	COODO SCH-40 3" X 1.60' - RANURADO	pza	47.00	105.38	4,950.23	47.00	4,950.23			47.00	4,950.23		



**CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863



VALORIZACIÓN N° 40 : - INSTALACIONES SANITARIAS

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA -
IGUOTOS - MAYNAS - LORETO
CONSORCIO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
31,775,489.36
17,720,489.36
14,055,000.00
INSTALACIONES SANITARIAS
30-Jun-21

FORMULA POLINOMICA No. 03
FECHA DE PRESUPUESTO
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRATOCTUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR METRADO MONTO, PRESENTES METRADO MONTO, ACUMULADO ACTUAL METRADO MONTO, SALDO METRADO MONTO. Rows include items like JUNTAS, TUBERIA PVC, and SISTEMAS DE VENTILACION.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATORRINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

VALORIZACIÓN N° 40 - INSTALACIONES SANITARIAS
Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II:2 CESAR GARAYAR GARCIA-
QUITOS - MAYNAS - LORETO
REGIONAL LORETO
CONSORCIO SODI LORETO
31/6/20215
SI/217.296.482.38

INSTALACIONES SANITARIAS
30-Jun-21

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRATUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO %, MONTO, METRADO %, MONTO, SALDO %, MONTO.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES SANITARIAS**  
 Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21  
 \*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA\*  
 IGUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 C/ 217 298.482.39  
 31/08/2015

**INSTALACIONES SANITARIAS**  
 31/08/2015  
**30-Jun-21**


OBRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CANTON  
 MUNICIPIO  
 MONTO CONTRATADO  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA POLINOMICA No. 03  
 FECHA DE CORTE

CÓDIGO PARTIDA	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	FUO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
03.10.03.01	BUCONSTRUIR TIPO TUBA H+ 1.63 M	und	14.00	1.355.76	18.950.64	14.00	18.950.64			14.00	100.00%	18.950.64	
03.10.09.01	INSTALACIONES ESPECIALES	und	1.00	1.254.20	1.254.20	1.00	1.254.20			1.00	100.00%	1.254.20	
03.10.09.01	TANQUE SEPTICO 10.000	und	1.00	1.254.20	1.254.20	1.00	1.254.20			1.00	100.00%	1.254.20	
03.10.09.03	TANQUE SEPTICO 3.14 M3	und	1.00	1.248.28	1.248.28	1.00	1.248.28			1.00	100.00%	1.248.28	
03.10.09.04	ALTIERA DE REBOSÉ - CISTERNA	und	1.00	6.816.60	6.816.60	1.00	6.816.60			1.00	100.00%	6.816.60	
03.10.09.05	CARPINTERIA METALICA	und	1.00	6.857.37	6.857.37	1.00	6.857.37			1.00	100.00%	6.857.37	
03.10.09.05	TRAMPAS DE GRASA	und	1.00	121.74	121.74	1.00	121.74			1.00	100.00%	121.74	
03.10.09.07	EMPALME A REDES EXTERIAS	und	2.00	6.763.12	17.526.24					2.00	100.00%	17.526.24	
03.10.10.01	SISTEMA DE BOMBEO DE DESAGUE	und	1.00	54.350.62	54.350.62	0.75	40.763.12			0.75	75.00%	40.763.12	
03.10.10.01.01	CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE	und	1.00	54.350.62	54.350.62	0.75	40.763.12			0.75	75.00%	40.763.12	
03.10.11.01	PRIEBAS HIDRAULICAS	m	7.455.54	0.80	5.956.83	7.383.97	5.907.17			7.383.97	99.00%	5.907.17	
03.11	SISTEMA DRENAJE DE EQUIPOS												
03.11.01	SALIDA DE DRENAJE DE EQUIPOS	pds	215.00	54.26	11.692.84	215.50	11.693.03			215.50	99.40%	11.693.03	
03.11.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC DS - CP D 2"	m	1.467.53	18.11	26.576.97	1.467.53	26.576.97			1.467.53	100.00%	26.576.97	
03.11.02.01	TUBERIA PVC DS - CP D 2"	m	127.15	28.03	3.584.01	127.15	3.584.01			127.15	100.00%	3.584.01	
03.11.02.02	MOVILANTE DE PVC DS - CP 84°	m	191.25	32.80	6.234.75	191.25	6.234.75			191.25	100.00%	6.234.75	
03.11.03.01	ACCESORIOS DE REDES DE DRENAJACION												
03.11.03.01	COUDO PVC DS - CP 2" x 1/2"	pza	70.00	8.00	560.00	70.00	560.00			70.00	100.00%	560.00	
03.11.03.02	COUDO PVC DS - CP 2" x 4/8"	pza	263.00	8.00	2.144.00	263.00	2.144.00			263.00	100.00%	2.144.00	
03.11.03.03	TEE PVC DS - CP 2"	pza	169.00	13.14	2.483.46	169.00	2.483.46			169.00	100.00%	2.483.46	
03.11.04	PIEZAS VARIAS												
03.11.04.01	COLEGADOR PARA UNA TUBERIA O 2" TIPO GOTTA O SIMILAR	pza	396.00	58.38	23.118.48	396.00	23.118.48			396.00	100.00%	23.118.48	
04.12	VAÑOS												
04.12.01	TRABAJOS PRELIMINARES												
04.12.01.01	EXCAVACION ORDINAL PARA REDES SANITARIAS H+ 0.60 M	m	8.970.53	6.99	60.607.42	8.610.74	60.189.07			8.610.74	95.31%	60.189.07	
04.12.01.02	REFRE Y REVELACION DE ZANJAS. T. NORMAL P. TUB. D= 6" - 6"	m	209.84	2.35	493.12	209.84	493.12			209.84	100.00%	493.12	
04.12.01.03	REFRE Y REVELACION DE ZANJAS. T. NORMAL P. TUB. D= 4" - 4"	m	2.973.81	2.18	5.316.91	2.973.81	5.316.91			2.973.81	100.00%	5.316.91	
04.12.01.04	REFRE Y REVELACION DE ZANJAS. T. NORMAL P. TUB. D= 1 1/2" - 3"	m	8.670.59	4.66	46.404.95	8.670.59	46.404.95			8.670.59	100.00%	46.404.95	
04.12.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL, CANGASADOR 135 ANCHURAS 6 VAL D= 8 MM	m3	11.271.77	31.51	355.173.47	11.143.63	351.142.08			11.271.77	100.00%	355.173.47	
04.12.02	PIEZAS VARIAS												
04.12.02.01	CONTENEDOR DE FOLLETEO DE AZUL PARA RESIDUOS SOLIDOS	und	22.00	830.30	18.265.60								
04.12.02.02	COLEGADOR MULTIPLE PARA 2 TUBERIAS	pza	4.00	528.21	2.112.84	4.00	2.112.84			4.00	100.00%	2.112.84	
04.12.02.03	COLEGADOR MULTIPLE PARA 3 TUBERIAS	pza	288.00	555.90	168.739.20	288.00	168.739.20			288.00	100.00%	168.739.20	
04.12.02.04	COLEGADOR MULTIPLE PARA 4 TUBERIAS	pza	158.00	640.73	101.235.34	158.00	101.235.34			158.00	100.00%	101.235.34	
04.12.02.05	COLEGADOR MULTIPLE PARA 6 TUBERIAS	pza	31.00	659.82	20.351.42	31.00	20.351.42			31.00	100.00%	20.351.42	
GOBTO DIRECTO													
GOBTO DIRECTO													
GASTOS GENERALES													
UTILIDAD													
IMPORTEAL													
SOL													
TOTAL													



**CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
 SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

490

 <b>CONSORCIO SALUD LORETO</b>	Proyecto:	<b>VALORIZACION No40 JUNIO 2021</b>
	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	Revisión:

## **VALORIZACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS**



VALORIZACION N° 40 : INSTALACIONES ELECTRICAS

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL U-2 OSBAR GARAYAR GARCIA\*

LICUOTIS - MAYNAS - LORETO

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONSORCIO SALUD LORETO

31/08/2015

SI: 217,226,482.36

INSTALACIONES ELECTRICAS

8-Jun-21

OBRA UBICACION ENTIDAD CONTRATISTA MONTO DE PRESUPUESTO FECHA DE EMISION Y PAGINA No 04 FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION PARTIDA, METRADO, UNIDAD, CANTIDAD, P.V., CONTRACTUAL MONTO, ACUMLADO ANTERIOR METRADO MONTO, PRESENTE MES METRADO MONTO, ACUMLADO ACTUAL METRADO MONTO, METRADO %, MONTO %, SALDO %, MONTO.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES ELECTRICAS
Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BALUO DEL HOSPITAL N° 2 DEBARR GARAYAR GARCIA.

CONSORCIO REGIONAL DEL NOROCCIDENTE
GOBIERNO REGIONAL DEL NOROCCIDENTE
CONSORCIO SALUD LORETO
SI: 217.236.482.36
31082015
INSTALACIONES ELECTRICAS

UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MUNICIPIO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 04
FECHA DE CONTE

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, MONTO, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO %, MONTO. Rows include items like SALIDA DE FUERZA PARA LAVADOR ULTRASONICO, SALIDA DE FUERZA PARA ESTABILIZADOR, etc.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

VALORIZACION N° 40 : INSTALACIONES ELECTRICAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N°2 OEBAR GARAYAR GARCIA.

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI: 211.226.482.38
31/08/2015
INSTALACIONES ELECTRICAS
30-Jun-14

OBRA UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION PARTIDA, METRADO, CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO %, MONTO, METRADO %, MONTO, SALDO %, MONTO. Rows include various electrical installation items like cables, conduits, and labor.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

VALORACIÓN N° 40.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
Ejecución de 11,182,21 metros cuadrados de obra

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL "D. CÉSAR GARAYAR GARCÍA".  
QUITOS- MAYNAS- LORETO  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONSORCIO SALUD LORETO  
SI: 21.226.482.36  
31/09/2015  
FORMULA POLI NOMICA No. 04  
30-JUN-21

OBRA UBICACION  
ENTIDAD CONTRATISTA  
PUNTO CONTRATADO  
FECHA DE INICIO  
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION PARTIDA, METRADO, PUNTO, CONTRACTUAL, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO %, MONTO, METRADO %, MONTO, SALDO. Rows include items like TABLERO DE DISTRIBUCION - TDR-CA, TABLERO DE DISTRIBUCION - TDR-CP, etc.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
JEFE DE SUPERVISION  
CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES ELECTRICAS**  
 Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21  
**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL INI DEBAY GARAYAR GARCIA\***  
 UBICACION: DEBAY GARAYAR GARCIA  
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL LORETO  
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO  
 MONTO CONTRATADO: S/ 217.228.482,38  
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015  
 FORMULA FOLIO N° 04  
 FECHA DE CONTE: 30-Jun-21

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	METRABO		CONTRATUAL MONTO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES MES		ACUMULADO ACTUAL		MONTOS
		UNID	CANTIDAD		METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	
04.05.17	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P2	P24	1,00	23.415,72							23.415,72
04.05.18	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P3	P24	1,00	17.448,50							17.448,50
04.05.19	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P4	P24	1,00	5.061,29							5.061,29
04.05.20	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P5	P24	1,00	4.775,01							4.775,01
04.05.21	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P2	P24	1,00	8.227,38							8.227,38
04.05.22	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P3	P24	1,00	6.138,83							6.138,83
04.05.23	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P4	P24	1,00	5.715,04							5.715,04
04.05.24	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P5	P24	1,00	7.297,27							7.297,27
04.05.25	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P2	P24	1,00	7.859,85							7.859,85
04.05.26	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P3	P24	1,00	6.948,04							6.948,04
04.05.27	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P4	P24	1,00	5.715,04							5.715,04
04.05.28	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P5	P24	1,00	5.287,28							5.287,28
04.05.29	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P2	P24	1,00	11.484,05							11.484,05
04.05.30	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P3	P24	1,00	10.203,42							10.203,42
04.05.31	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P4	P24	1,00	6.651,74							6.651,74
04.05.32	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P5	P24	1,00	10.489,70							10.489,70
04.05.33	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P2	P24	1,00	4.627,31							4.627,31
04.05.34	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P3	P24	1,00	5.159,87							5.159,87
04.05.35	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P4	P24	1,00	4.465,27							4.465,27
04.05.36	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P5	P24	1,00	4.546,55							4.546,55
04.05.37	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P2	P24	1,00	6.001,34							6.001,34
04.05.38	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P3	P24	1,00	5.112,03							5.112,03
04.05.39	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P4	P24	1,00	6.651,74		0,95	7.507,85				7.507,85
04.05.40	TABLEADO DE DISTRIBUCION - TES.EM.P5	P24	1,00	7.859,85							7.859,85
04.05.41	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P1	P24	1,00	6.930,00							6.930,00
04.05.42	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P2	P24	1,00	6.930,00							6.930,00
04.05.43	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P3	P24	1,00	10.933,67							10.933,67
04.05.44	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P4	P24	1,00	13.039,67							13.039,67
04.05.45	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P5	P24	1,00	10.933,67							10.933,67
04.05.46	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P2	P24	1,00	6.183,64							6.183,64
04.05.47	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P3	P24	1,00	7.079,69							7.079,69
04.05.48	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P4	P24	1,00	6.183,64							6.183,64
04.05.49	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P5	P24	1,00	4.063,63							4.063,63
04.05.50	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P2	P24	1,00	5.946,81							5.946,81
04.05.51	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P3	P24	1,00	6.753,24							6.753,24
04.05.52	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P4	P24	1,00	5.178,32							5.178,32
04.05.53	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P5	P24	1,00	6.551,97							6.551,97
04.05.54	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P2	P24	1,00	4.853,67		0,85	4.125,62				4.125,62
04.05.55	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P3	P24	1,00	3.954,38							3.954,38
04.05.56	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P4	P24	1,00	3.189,01							3.189,01
04.05.57	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P5	P24	1,00	4.919,69							4.919,69
04.05.58	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P2	P24	1,00	10.932,73		0,65	8.346,74				8.346,74
04.05.59	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P3	P24	1,00	9.819,63		0,65	9.292,82				9.292,82
04.05.60	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P4	P24	1,00	4.323,16		0,55	4.107,00				4.107,00
04.05.61	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P5	P24	1,00	1.557,15							1.557,15
04.05.62	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P2	P24	1,00	3.940,03		0,95	4.918,20				4.918,20
04.05.63	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P3	P24	1,00	5.644,59							5.644,59
04.05.64	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P4	P24	1,00	5.201,12		0,95	4.941,06				4.941,06
04.05.65	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P5	P24	1,00	3.749,64							3.749,64
04.05.66	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P2	P24	1,00	5.704,42		0,95	5.419,20				5.419,20
04.05.67	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P3	P24	1,00	5.533,55							5.533,55
04.05.68	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P4	P24	1,00	4.710,01							4.710,01
04.05.69	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P5	P24	1,00	11.653,92							11.653,92
04.05.70	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P2	P24	1,00	2.008,61							2.008,61
04.05.71	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P3	P24	1,00	3.748,64							3.748,64
04.05.72	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P4	P24	1,00	13.144,91		0,95	11.773,17				11.773,17
04.05.73	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P5	P24	1,00	14.431,91							14.431,91
04.05.74	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P2	P24	1,00	11.731,17		0,85	3.187,19				3.187,19
04.05.75	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P3	P24	1,00	11.731,17		0,85	11.773,17				11.773,17
04.05.76	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P4	P24	1,00	11.731,17		0,85	3.187,19				3.187,19
04.05.77	TABLEADO DE FUERZA-TFN.P5	P24	1,00	11.731,17		0,85	11.773,17				11.773,17



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

485

**VALORIZACIÓN Nº 40 : INSTALACIONES ELÉCTRICAS**  
 Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21  
**\*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL H-2 OSEAR GARAYAR GARCÍA\***

OBRA :  
 ENTIDAD :  
 CONTRATISTA :  
 MONTO CONTRATADO :  
 FECHA DE PRESUPUESTO :  
 FORMULA POLINOMICA No. 04 :  
 FECHA DE CORTE

CÓDIGO PARTIDA	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	METRADO		CONTRATUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	PUL	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%
04.05.33	TABLERO DE FUERZA-TE-A21.3	pza	1.00	5,244.45	5,244.45	0.95	4,982.23	0.95	95.00%	4,982.23	0.05	5.00%	282.22
04.05.37	TABLERO DE FUERZA-TE-A22.1	pza	1.00	6,973.39	6,973.39	0.95	6,624.72	0.95	95.00%	6,624.72	0.05	5.00%	348.67
04.05.38	TABLERO DE FUERZA-TE-A22.3	pza	1.00	3,584.56	3,584.56	0.95	3,389.33	0.95	95.00%	3,389.33	0.05	5.00%	178.23
04.06.74	TABLERO DE FUERZA-TE-A23	pza	1.00	7,732.05	7,732.05	0.95	7,345.46	0.95	95.00%	7,345.46	0.05	5.00%	386.60
04.06.49	TABLERO DE FUERZA-TE-AF	pza	1.00	5,277.54	5,277.54	0.95	5,039.99	0.95	95.00%	5,039.99	0.05	5.00%	310.47
04.06.41	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN-TE-FR-2	pza	1.00	4,324.16	4,324.16	0.95	4,107.00	0.95	95.00%	4,107.00	0.05	5.00%	216.16
04.06.47	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN-TE-FR-2	pza	1.00	16,528.22	16,528.22	0.85	14,048.93	0.85	85.00%	14,048.93	0.15	15.00%	2,479.29
04.06.41	TABLERO DE FUERZA-TE-BC-1	pza	1.00	7,060.19	7,060.19	0.95	6,707.18	0.95	95.00%	6,707.18	0.05	5.00%	353.01
04.06.45	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-EW-SP-2	pza	1.00	5,604.50	5,604.50						0.05	5.00%	560.45
04.06.46	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-SP-4C-1	pza	1.00	3,531.54	3,531.54					0.05	5.00%	353.15	
04.06.41	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	5,629.64	5,629.64					0.05	5.00%	562.96	
04.06.41	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,911.27	6,911.27					0.05	5.00%	691.12	
04.06.49	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,824.95	6,824.95					0.05	5.00%	682.49	
04.06.50	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,530.02	6,530.02					0.05	5.00%	653.00	
04.06.51	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,903.79	6,903.79					0.05	5.00%	690.37	
04.06.52	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	5,852.21	5,852.21					0.05	5.00%	585.22	
04.06.54	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,911.27	6,911.27					0.05	5.00%	691.12	
04.06.54	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,911.27	6,911.27					0.05	5.00%	691.12	
04.06.55	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,502.73	6,502.73					0.05	5.00%	650.27	
04.06.55	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,502.73	6,502.73					0.05	5.00%	650.27	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	5,592.97	5,592.97	0.85	5,578.92	0.85	85.00%	5,578.92	0.15	15.00%	894.45
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	3,730.75	3,730.75					0.15	15.00%	373.07	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	5,663.79	5,663.79					0.15	15.00%	566.37	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	5,377.69	5,377.69					0.15	15.00%	537.76	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,663.79	6,663.79					0.15	15.00%	666.37	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	5,663.79	5,663.79					0.15	15.00%	566.37	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,561.71	6,561.71					0.15	15.00%	656.17	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,329.15	6,329.15					0.15	15.00%	632.91	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	7,627.28	7,627.28					0.15	15.00%	762.72	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,659.79	6,659.79					0.15	15.00%	665.97	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	5,592.97	5,592.97					0.15	15.00%	559.29	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	4,721.63	4,721.63					0.15	15.00%	472.16	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	3,716.53	3,716.53					0.15	15.00%	371.65	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	3,745.59	3,745.59					0.15	15.00%	374.56	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	3,731.34	3,731.34					0.15	15.00%	373.13	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	7,572.65	7,572.65					0.15	15.00%	757.26	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	7,627.37	7,627.37					0.15	15.00%	762.73	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	7,631.84	7,631.84					0.15	15.00%	763.18	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	4,034.49	4,034.49					0.15	15.00%	403.44	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	4,716.68	4,716.68					0.15	15.00%	471.66	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	3,705.61	3,705.61					0.15	15.00%	370.56	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	8,537.97	8,537.97					0.15	15.00%	853.79	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	4,681.75	4,681.75					0.15	15.00%	468.17	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	4,716.68	4,716.68					0.15	15.00%	471.66	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	5,663.79	5,663.79					0.15	15.00%	566.37	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	3,814.20	3,814.20					0.15	15.00%	381.41	
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,912.34	6,912.34	0.85	5,875.49	0.85	85.00%	5,875.49	0.15	15.00%	1,036.85
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	6,562.77	6,562.77	0.85	5,578.35	0.85	85.00%	5,578.35	0.15	15.00%	984.42
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	4,730.25	4,730.25	0.85	4,020.72	0.85	85.00%	4,020.72	0.15	15.00%	709.54
04.06.57	TABLERO DISTRIBUCIÓN-TE-FA-1C-1	pza	1.00	4,716.78	4,716.78	0.85	4,009.26	0.85	85.00%	4,009.26	0.15	15.00%	707.52




CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
 INGENIERO SUPERVISOR  
 R.A.S. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISIÓN  
 CIP N° 41863



**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES ELECTRICAS**  
 Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21  
**\*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE BALUO DEL HOSPITAL II-2 DEBAR GARAYAR GARCIA\*.**  
 IGUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 C.I. 1489236  
 31/08/2015  
**INSTALACIONES ELECTRICAS**  
**30-Jun-21**

GIRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CONTRATISTA  
 MONTO CONTRATADO  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA POLINOMICA No. 64  
 FECHA DE CORTE


CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL MONTO	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD		METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	%
04.01.05.01	SOLICITURA CADAVERO TIPO 'X'	UND	22.00	2,776.18	22.00	2,776.18			22.00	#####	2,776.18	
04.01.05.01	SOLICITURA CADAVERO TIPO 'T'	UND	42.00	5,269.93	42.00	5,269.93			42.00	#####	5,269.93	
04.01.05.02	INSTALACION DE POZOS	UND	3.00	8,629.92	3.00	8,629.92			3.00	#####	8,629.92	
04.01.05.02	PAZOS A TIERRA PARA SISTEMAS AJLADOO.	UND	2.00	5,753.28	2.00	5,753.28			2.00	#####	5,753.28	
04.01.05.02	PAZOS A TIERRA PARA ALICATORIOS.	UND	2.00	5,753.28	2.00	5,753.28			2.00	#####	5,753.28	
04.01.05.03	PAZOS A TIERRA PARA MAGNES.	UND	2.00	5,753.28	2.00	5,753.28			2.00	#####	5,753.28	
04.01.05.04	PAZOS A TIERRA PARA ESTABILIZADO.	UND	2.00	5,753.28	2.00	5,753.28			2.00	#####	5,753.28	
04.01.05.05	PAZOS A TIERRA PARA COMUNICACIONES.	UND	1.00	2,876.64	1.00	2,876.64			1.00	#####	2,876.64	
04.01.05.05	PAZOS A TIERRA PARA ALIENACIONES.	UND	1.00	2,876.64	1.00	2,876.64			1.00	#####	2,876.64	
04.01.05.07	PAZOS A TIERRA PARA BAJA TENSION	UND	2.00	5,753.28	2.00	5,753.28			2.00	#####	5,753.28	
04.01.05.05	PAZOS A TIERRA PARA MEDIA TENSION	UND	2.00	5,753.28	2.00	5,753.28			2.00	#####	5,753.28	
04.01.05.05	PAZOS A TIERRA PARA ALTO TENSION	UND	2.00	5,753.28	2.00	5,753.28			2.00	#####	5,753.28	
04.01.05.09	PAZOS A TIERRA PARA PARARAYOS	UND	6.00	17,253.84	6.00	17,253.84			6.00	#####	17,253.84	
04.01.07.01	BLOQUE DE CONCRETO P/LOSEROS ELECTRICAS (1.30 x 1.30 x 1.00 M)	UND	8.00	11,346.00	8.00	11,346.00			8.00	#####	11,346.00	
04.01.07.02	POSTE DE ALUMINIO 160 m C/LI LAMP. DE VAPOR DE SODIO INTI (MOD. CD-40) PHILIPS O SIMILAR)	UND	55.00	59,200.35								59,200.35
04.01.07.03	ACHO PARA MEMOR.	PZA	1.00	1,522.54								1,522.54
04.01.07.04	EMPALME A REDES EXTERNAS	UND	1.00	1,522.54								1,522.54
04.01.07.05	DUCTO DE CONCRETO DE 4 MAS	UND	1.00	8,763.12								8,763.12
04.01.07.06	BANCO COBRE/ALUMINIO/ENXOVA	UND	205.60	23,110.28	205.60	23,110.28			205.60	#####	23,110.28	
04.01.07.07	UPS 160VA-33-N 300-300/40 HZ	PZA	1.00	59,971.63								59,971.63
04.01.07.08	TRANSFORMADOR DE ALIMENTADO 200KVA	PZA	1.00	25,653.57								25,653.57
04.01.07.09	TRANSFORMADOR DE ALIMENTADO 200KVA	PZA	1.00	51,419.44								51,419.44
04.01.07.11	UPS 100VA-33-113-300/300/40 HZ	PZA	1.00	22,333.08								22,333.08
04.01.07.12	UPS 30VA 110-230V 10 HZ	PZA	1.00	111,932.25								111,932.25
04.01.07.13	UPS 30VA 110-230V 10 HZ	PZA	3.00	37,976.07								37,976.07
04.01.07.13	UPS 30VA 110-230V 10 HZ	PZA	5.00	9,637.32								9,637.32
04.01.07.13	UPS 30VA 110-230V 10 HZ	PZA	4.00	5,692.05								5,692.05
04.10.01	SISTEMA ELECTRICAS	gpb	1.00	5,000.00								5,000.00
04.11.01	SISTEMA ELECTRICAS	gpb	1.00	5,000.00	0.63	4,275.00	0.15	725.00	1.00	#####	5,000.00	
04.11.01	SISTEMA ELECTRICAS	gpb	1.00	203,087.63								203,087.63
04.12.01	SUBESTACION ELECTRICAS	gpb	1.00	525,731.93	0.70	369,012.39			0.70	70.00%	369,012.39	
04.13.01	RED DE MANTENIMIENTO (DE CONEXIONARIA HASTA SUB ESTACION)	gpb	1.00	195,359.78	0.80	156,287.82			0.80	80.00%	156,287.82	
	COSTO DIRECTO			10,378,884.87		7,291,775.50		69,740.74			69,740.74	
	GASTOS GENERALES			1,845,498.39		1,845,498.39		10,384.60			10,384.60	
	UTILIDAD			3.00%	311,363.76		2,697.22				2,697.22	
	SUB-TOTAL			12,215,715.02		8,595,318.87		82,217.76		70.93%	8,678,538.62	
	I.G.V.			18.00%	2,202,432.26		3,547,236.69		14,759.20		1,562,136.05	
	TOTAL			14,418,147.28		10,143,837.73		97,016.96		10,240,854.67		4,197,497.88



**ONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
 IG: SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863



481

 <b>CONSORCIO SALUD LORETO</b>	Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	<b>VALORIZACION No40</b> <b>JUNIO 2021</b>
		Revisión:

## **VALORIZACIÓN DE INSTALACIONES MECANICAS**

VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

\*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 DEBAR GARAYAR GARCÍA\*

QUITOS - MAYNAS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI: 217.226.482.38
31/08/2015
INSTALACIONES MECANICAS
30-Jun-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 05
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, UNID CANTIDAD, M E T R A D O, P.U., CONTRACTUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR MONTO, PRESENTE MES MONTO, ACUMULADO ACTUAL MONTO, METRADO, SALDO MONTO. Rows include items like EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS, ASCENSORES Y MONTACARGAS, CAMARAS DE REFRIGERACION, etc.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
M.C. SATTURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

47b

**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES MECANICAS**

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".

UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO  
 MONTO CONTRATADO: S/. 21,226,492.36

FORMULA POLINOMICA No. 05  
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2019  
 FECHA DE CONTE: 30-Jun-21

OBRA: VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES MECANICAS  
 UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO  
 MONTO CONTRATADO: S/. 21,226,492.36  
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2019  
 FECHA DE CONTE: 30-Jun-21

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	METRADO		P.U.	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD		MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%
05.02.03.03	Unidad evaporadora tipo Fm Col de 3/8" x 1/2" de 651-750 CFM , en 220V / 1Ø / 60Hz	und	15.00	1,572.63	23,589.45	15.00	23,589.45							
05.02.03.07	Unidad evaporadora tipo Fm Col de 3/8" x 1/2" de 751-850 CFM , en 220V / 1Ø / 60Hz	und	7.00	1,716.03	12,012.21	7.00	12,012.21							
05.02.03.08	Unidad evaporadora tipo Fm Col de 3/8" x 1/2" de 851-1050 CFM , en 220V / 1Ø / 60Hz	und	4.00	1,769.14	7,076.56	4.00	7,076.56							
05.02.03.09	Unidad evaporadora tipo Fm Col de 3/8" x 1/2" de 1051-1200 CFM , en 220V / 1Ø / 60Hz	und	2.00	1,949.70	3,899.40	2.00	3,899.40							
05.02.03.10	Unidad evaporadora tipo Fm Col de 3/8" x 1/2" de 1201-1500 CFM , en 220V / 1Ø / 60Hz	und	1.00	2,146.24	2,146.24	1.00	2,146.24							
05.02.03.11	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - EQUIPOS PAQUETE	und	1.00	46,378.67	46,378.67	1.00	46,378.67							
05.02.03.01	EQUIPO EP-1.01	und	1.00	46,378.67	46,378.67	1.00	46,378.67							
05.02.03.02	EQUIPO EP-1.02	und	1.00	46,378.67	46,378.67	1.00	46,378.67							
05.02.03.03	EQUIPO EP-1.03	und	1.00	176,881.18	176,881.18	1.00	176,881.18							
05.02.03.04	EQUIPO EP-1.04	und	1.00	46,378.67	46,378.67	1.00	46,378.67							
05.02.03.05	EQUIPO EP-1.05	und	1.00	46,378.67	46,378.67	1.00	46,378.67							
05.02.03.06	EQUIPO EP-1.06	und	1.00	46,378.67	46,378.67	1.00	46,378.67							
05.02.03.07	EQUIPO EP-1.07	und	1.00	46,378.67	46,378.67	1.00	46,378.67							
05.02.03.08	EQUIPO EP-1.08	und	1.00	46,378.67	46,378.67	1.00	46,378.67							
05.02.03.09	EQUIPO EP-1.09	und	1.00	46,378.67	46,378.67	1.00	46,378.67							
05.02.03.10	EP-2 01/2 02/2 03/2 04/2 05/2 06	und	6.00	62,223.39	373,340.34	6.00	373,340.34							
05.02.03.11	EP-2 07/ 2.08/ 3.05/ 3.05	und	4.00	46,378.67	185,514.68	4.00	185,514.68							
05.02.03.12	EQUIPO EP-2.09	und	1.00	62,223.39	62,223.39	1.00	62,223.39							
05.02.03.13	EQUIPO EP-2.10	und	1.00	52,546.02	52,546.02	1.00	52,546.02							
05.02.03.14	EQUIPO EP-2.11/3.01/3.02	und	3.00	88,814.77	266,444.31	3.00	266,444.31							
05.02.03.15	EQUIPO EP-3.03	und	1.00	62,223.39	62,223.39	1.00	62,223.39							
05.02.03.16	EQUIPO EP-3.04	und	1.00	46,378.67	46,378.67	1.00	46,378.67							
05.02.03.17	EQUIPO EP-3.07/ 3.08/ 4.01/ 4.03/ 4.04/ 5.01/ 5.02	und	8.00	46,378.67	371,029.36	8.00	371,029.36							
05.02.03.18	EQUIPO EP-5.03	und	1.00	52,546.02	52,546.02	1.00	52,546.02							
05.02.04	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - EXPANSION DIRECTA	und	11.00	929.89	10,195.79	11.00	10,195.79							
05.02.04.01	EQUIPO UED-S-03/03.04/05.05/07/08/09/10/11/12	und	1.00	620.89	620.89	1.00	620.89							
05.02.04.02	EQUIPO UED-S-03/01	und	5.00	775.02	3,875.10	5.00	3,875.10							
05.02.04.03	EQUIPO UED-T/0.07/0.07/0.07/0.07/0.05	und	11.00	1,263.44	13,897.84	11.00	13,897.84							
05.02.04.04	EQUIPO UED-S-03/03.04/05.05/07/08/09/10/11/12	und	1.00	1,086.42	1,086.42	1.00	1,086.42							
05.02.04.05	EQUIPO UED-T/0.07/0.07/0.07/0.07/0.05	und	5.00	1,429.25	7,146.25	5.00	7,146.25							
05.02.05	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - EXPANSION PRECISION	und	2.00	95,684.70	191,369.40	2.00	191,369.40							
05.02.05.01	EQUIPO VEP-3.01/3.02	und	1.00	19,975.95	19,975.95	1.00	19,975.95							
05.02.05.02	EQUIPO VEP-3.01	und	5.00	1,635.61	8,178.55	5.00	8,178.55							
05.02.05.03	EQUIPO UE-3.03/03.03/05.05	und	1.00	1,768.68	1,768.68	1.00	1,768.68							
05.02.05.04	EQUIPO UE-3.01/3.02	und	2.00	2,161.50	4,323.00	2.00	4,323.00							
05.02.05.05	CONTROL REMOTO PARA EVAPORADOR TIPO CASSETTE	und	8.00	233.60	1,868.80	8.00	1,868.80							
05.02.05.06	VALVULA DE EQ.1	und	16.00	238.04	3,808.64	16.00	3,808.64							
05.02.05.07	CONECTOR TIPO "T" PARA EVAPORADORAS	und	7.00	342.15	2,395.05	7.00	2,395.05							
05.02.07	CAJAS DE VOLUMEN DE AIRE VARIABLE - VAV	und	68.00	2,343.81	226,399.09	68.00	226,399.09							
05.02.07.01	CAJAS VAV 1.03/1.08/1.10/1.12/1.25/2.02/2.09/2.28/2.28/2.50/5.09	und	42.00	2,462.71	104,273.62	42.00	104,273.62							
05.02.07.02	CAJAS VAV 1.01/1.04/1.10/1.11/1.21/1.25/2.02/2.02/2.28/2.30/2.31/2.33	und	16.00	2,462.71	39,723.36	16.00	39,723.36							
05.02.07.03	CAJAS VAV 1.05/1.15/1.15/1.18/1.20/1.22/1.02/1.02/1.05/1.05/2.05/3.00/3.00/4.16	und	17.00	2,462.71	42,206.07	17.00	42,206.07							
05.02.07.04	CAJAS VAV 1.06/1.06/2.00/3.16	und	3.00	2,172.57	7,717.71	3.00	7,717.71							
05.02.07.05	CAJAS VAV 1.12/1.27/1.28/2.03/2.12/2.13	und	6.00	2,343.81	15,262.85	6.00	15,262.85							



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

878

**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES MECANICAS**

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

**\*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA\*.**

IGUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 SI/ 217.295.482.36  
 31/08/2015  
**INSTALACIONES MECANICAS**  
 30-Jun-21

OBRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CONTRATISTA  
 MONTO CONTRATADO  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA POLITOMICA No. 05  
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.02.09	SISTEMA DE VENTILACION - PRECIPITADOR	UNID	1,00	60.123,38	60.123,38				1,00	60.123,38	1,00	100,00%	60.123,38
05.02.09.01	EQUIPO EC-1	UNID	2,00	4.276,38	8.552,76	2,00	8.552,76			2,00	100,00%	8.552,76	
05.02.09.02	EQUIPO EC-1021.05	UNID	3,00	12.823,14	12.823,14	3,00	12.823,14			3,00	100,00%	12.823,14	
05.02.09.03	EQUIPO EC-1021.06	UNID	1,00	5.818,45	5.818,45	1,00	5.818,45			1,00	100,00%	5.818,45	
05.02.09.04	EQUIPO EC-107	UNID	1,00	7.385,79	7.385,79	1,00	7.385,79			1,00	100,00%	7.385,79	
05.02.09.05	EQUIPO EC-108	UNID	1,00	4.697,01	4.697,01	1,00	4.697,01			1,00	100,00%	4.697,01	
05.02.09.06	EQUIPO EC-109	UNID	1,00	4.276,38	4.276,38	1,00	4.276,38			1,00	100,00%	4.276,38	
05.02.09.07	EQUIPO EC-110	UNID	1,00	4.276,38	4.276,38	1,00	4.276,38			1,00	100,00%	4.276,38	
05.02.09.08	EQUIPO EC-111	UNID	1,00	4.845,50	4.845,50	1,00	4.845,50			1,00	100,00%	4.845,50	
05.02.09.09	EQUIPO EC-201 af 2.05	UNID	6,00	4.107,35	24.644,10	6,00	24.644,10			6,00	100,00%	24.644,10	
05.02.09.10	EQUIPO EC-207	UNID	1,00	4.845,50	4.845,50	1,00	4.845,50			1,00	100,00%	4.845,50	
05.02.09.11	EQUIPO EC-209	UNID	1,00	4.276,38	4.276,38	1,00	4.276,38			1,00	100,00%	4.276,38	
05.02.09.12	EQUIPO EC-209	UNID	2,00	3.976,38	7.952,76	1,00	3.976,38			1,00	50,00%	3.976,38	
05.02.09.13	EQUIPO EC-2.102.11	UNID	1,00	4.227,81	4.227,81	1,00	4.227,81			1,00	100,00%	4.227,81	
05.02.09.14	EQUIPO EC-3.01	UNID	2,00	4.107,35	8.214,70	2,00	8.214,70			2,00	100,00%	8.214,70	
05.02.09.15	EQUIPO EC-3.02	UNID	1,00	7.764,40	7.764,40	1,00	7.764,40			1,00	100,00%	7.764,40	
05.02.09.16	EQUIPO EC-3.03.05	UNID	1,00	4.107,35	4.107,35	1,00	4.107,35			1,00	100,00%	4.107,35	
05.02.09.17	EQUIPO EC-3.04	UNID	1,00	3.696,85	3.696,85	1,00	3.696,85			1,00	100,00%	3.696,85	
05.02.09.18	EQUIPO EC-3.05	UNID	1,00	4.276,38	4.276,38	1,00	4.276,38			1,00	100,00%	4.276,38	
05.02.09.19	EQUIPO EC-3.08	UNID	1,00	4.160,49	4.160,49	1,00	4.160,49			1,00	100,00%	4.160,49	
05.02.09.20	EQUIPO EC-3.08	UNID	1,00	4.160,49	4.160,49	1,00	4.160,49			1,00	100,00%	4.160,49	
05.02.09.21	EQUIPO EC-3.09	UNID	1,00	4.107,35	4.107,35	1,00	4.107,35			1,00	100,00%	4.107,35	
05.02.09.22	EQUIPO EC-3.10	UNID	1,00	3.696,85	3.696,85	1,00	3.696,85			1,00	100,00%	3.696,85	
05.02.09.23	EQUIPO EC-3.11	UNID	5,00	24.227,50	121.137,50	5,00	121.137,50			5,00	100,00%	121.137,50	
05.02.09.24	EQUIPO EC-3.12	UNID	1,00	9.087,77	9.087,77	1,00	9.087,77			1,00	100,00%	9.087,77	
05.02.09.25	EQUIPO EC-3.13.01 R4.04	UNID	1,00	4.276,38	4.276,38	1,00	4.276,38			1,00	100,00%	4.276,38	
05.02.09.27	EQUIPO EC-5.03	UNID	1,00	7.385,79	7.385,79	1,00	7.385,79			1,00	100,00%	7.385,79	
05.02.09.29	EQUIPO EC-5.04	UNID	2,00	4.179,78	8.359,56	2,00	8.359,56			2,00	100,00%	8.359,56	
05.02.09.30	EQUIPO EC-5.05.05	UNID	1,00	4.276,38	4.276,38	1,00	4.276,38			1,00	100,00%	4.276,38	
05.02.09.31	EQUIPO EC-5.07	UNID	2,00	12.038,14	24.076,28	2,00	24.076,28			2,00	100,00%	24.076,28	
05.02.09.32	EQUIPO EC-7.01.01.02	UNID	1,00	4.276,38	4.276,38	1,00	4.276,38			1,00	100,00%	4.276,38	
05.02.09.33	EQUIPO EC-7.03	UNID	1,00	4.845,50	4.845,50	1,00	4.845,50			1,00	100,00%	4.845,50	
05.02.09.34	EQUIPO EC-7.04	UNID	1,00	5.695,54	5.695,54	1,00	5.695,54			1,00	100,00%	5.695,54	
05.02.09.35	EQUIPO EC-8.01 af 1.05	UNID	7,00	33.815,50	236.708,50	7,00	236.708,50			7,00	100,00%	236.708,50	
05.02.09.37	EQUIPO EC-8.01 af 1.04	UNID	4,00	18.241,51	72.966,04	4,00	72.966,04			4,00	100,00%	72.966,04	
05.02.09.38	EQUIPO EC-8.01 af 1.04	UNID	2,00	4.264,21	8.528,42	2,00	8.528,42			2,00	100,00%	8.528,42	
05.02.09.33	EQUIPO EC-8.01 af 1.02	UNID	2,00	4.607,06	9.214,12	2,00	9.214,12			2,00	100,00%	9.214,12	
05.02.09.40	EQUIPO EC-8.01 af 1.03	UNID	2,00	11.625,86	23.251,72	2,00	23.251,72			2,00	100,00%	23.251,72	
05.02.09.41	EQUIPO EC-8.01	UNID	1,00	5.395,82	5.395,82	1,00	5.395,82			1,00	100,00%	5.395,82	
05.02.09.42	EQUIPO EC-8.01	UNID	1,00	14.142,16	14.142,16	1,00	14.142,16			1,00	100,00%	14.142,16	
05.02.09.43	EQUIPO EC-8.01	UNID	1,00	7.385,79	7.385,79	1,00	7.385,79			1,00	100,00%	7.385,79	
05.02.09.44	EQUIPO EC-8.01	UNID	1,00	5.395,94	5.395,94	1,00	5.395,94			1,00	100,00%	5.395,94	
05.02.09.45	EQUIPO EC-8.01	UNID	1,00	13.140,25	13.140,25	1,00	13.140,25			1,00	100,00%	13.140,25	



ONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
 M.C. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES MECANICAS**

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

**\*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA\*.**

QUITOS - MAYNAS - LORETO  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONSORCIO SALUD LORETO  
SI/ 217.226.482.36

31/08/2015  
**INSTALACIONES MECANICAS**  
30-Jun-21

OBRA  
UBICACION  
ENTIDAD  
CONTRATISTA  
MONTO CONTRATADO  
FECHA DE PRESUPUESTO  
FORMULA POLINOMICA No. 05  
FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.02.09.45	EQUIPO I.C.C.03	und	1.00	7.385,79	7.385,79							1,00	7.385,79
05.02.09.47	EQUIPO EA-1.01.11.05	und	5.00	4.207,49	21.037,45	5,00	21.037,45			5,00	100,00%		
05.02.09.48	EQUIPO EA-1.03.11.06	und	3.00	1.720,32	5.160,96	3,00	5.160,96			3,00	100,00%		
05.02.09.49	EQUIPO IA-1.01.11.05	und	5.00	2.091,85	10.459,25	5,00	10.459,25			5,00	100,00%		
05.02.09.50	EQUIPO IA-1.06.11.08	und	3.00	1.530,49	4.591,47	3,00	4.591,47			3,00	100,00%		
05.02.10	ACCESORIOS												
05.02.10.01	Dispar Lateral del tipo modular de 4 escalones, modelo HGRD	und	6.00	34.346,15	206.076,90	6,00	206.076,90			6,00	100,00%		
05.02.10.02	Dispar de flujo laminar, modelo LFD	und	6.00	1.187,81	7.128,86	6,00	7.128,86			6,00	100,00%		
05.02.11	SERVICIO DE INSTALACION												
05.02.11.01	DEFUSORES	PG2	94.912,00	0,80	75.929,60								
05.02.11.02	REJILLA DE RETORNO DE ALUMINIO	PG2	67.132,00	0,65	43.635,80								
05.02.11.03	DUCTOS METALICOS, FABRICADOS DE PLANCHILLA DE FIERRO GALVANIZADO	kg	54.858,00	10,47	574.363,28	54.858,00	574.363,28			54.858,00	100,00%		
05.02.11.04	ASLAMIENTO ACUSTICO PARA DUCTOS	m2	9.860,47	47,49	473.972,52	9.830,47	471.598,12			9.830,47	99,50%		
05.02.11.05	PROTECCION EXTERIOR PARA PLANCHILLA GALVANIZADA	m2	1.471,82	17,20	25.315,30								
05.02.11.06	MANGAS FLEXIBLES	gls	1,00	11.160,11	11.160,11	0,60	6.696,07	0,10	1.116,01	0,70	70,00%		
05.02.11.07	INSTALACION DE CAJAS VAV	und	173,00	234,36	40.544,28	12,00	2.812,32			12,00	6,94%		
05.02.11.08	CAJA PORTA FILTRO 24 X 24"	und	26,00	784,41	20.344,66								
05.02.11.09	FILTRO CORRUGADO	und	26,00	37,10	954,06								
05.02.11.10	FILTRO HEPA	und	26,00	1.563,58	40.653,08								
05.02.11.11	SERVICIO DE INST. DE EQUIPOS TIPO PAQUETE	gls	1,00	253.736,18	253.736,18								
05.02.11.12	SERVICIO DE INST. DE EXPANSION DIRECTA	gls	1,00	30.628,69	30.628,69								
05.02.11.13	SERVICIO INST. DE EQUIPOS DE PRECISION	gls	1,00	9.580,73	9.580,73								
05.02.11.14	SERVICIO DE INST. DE MULTIV	gls	1,00	21.634,63	21.634,63								
05.02.11.15	UNION FLEXIBLE DE 8 PUG	und	4,00	575,23	2.300,92								
05.02.11.16	MANOMETRO	und	16,00	307,48	4.919,68								
05.02.11.17	VALVULA MARIPOSA DE EPUG	und	10,00	862,85	8.628,50								
05.02.11.18	FILTRO EN Y DE EPUG	und	2,00	1.385,79	2.771,58								
05.02.11.19	TANQUE DE EXPANSION GERRADO	und	1,00	13.171,29	13.171,29								
05.02.11.20	SEPARADOR DE AIRE CON FILTRO COLADOR	und	1,00	38.618,94	38.618,94								
05.02.11.21	TERMOCONTRO DE 10 A 40 C	und	4,00	302,18	1.208,72								
05.02.11.22	PURGADORES DE AIRE 1/2 X 3/4"	und	20,00	254,16	5.083,20								
05.02.11.23	VALVULA DUAL	und	1,00	665,75	665,75								
05.02.11.24	TRANSMISOR DE PRESSION DIFERENCIAL RANGO G - 100PSI	und	1,00	2.031,28	2.031,28								
05.02.11.25	AMORTIGUADORES ANTIVIBRATORIOS	und	32,00	1.307,34	41.834,88								
05.02.11.26	VALVULA MULTIPROPOSITO EPUG	und	6,00	5.621,58	33.729,48								
05.02.11.27	VALVULA DE SUCCION 6"x6"	und	3,00	4.445,40	13.336,20								
05.02.11.28	DEFUSOR DE SUCCION 6"x6"	und	3,00	3.877,10	11.631,30								
05.02.11.29	TERMOSTATO PARA FAN COIL DE 3 VEL	und	144,00	419,86	60.459,84								
05.02.11.30	VALVULAS DE 2 VIAS PARA FAN COIL CON ACTUADOR	und	144,00	1.988,73	286.397,12	144,00	274.857,12			144,00	100,00%		
05.02.11.31	CIRCUIT SETTER PARA FAN COIL	und	294,00	104,59	30.749,46	244,00	25.519,96			24,00	82,99%		
05.02.11.32	VALVULA DE 2 VIAS DE 1 1/2 CON ACTUADOR	und	144,00	592,21	85.309,24	100,00	58.221,00	2,00	1.104,42	102,00	70,83%		
05.02.11.33	VALVULA DE CORTE DE 1 1/2 PUG	und	21,00	2.300,95	48.319,95								
05.02.11.34	CIRCUIT SETTER DE 1 1/2 PUG	und	130,74	4.891,08	6.491,08								
05.02.11.35	FILTRO EN Y DE 1 1/2 PUG	und	21,00	747,16	15.690,78	18,00	13.449,24			18,00	85,71%		
05.02.11.36	TERMOSTATO MODULANTE	und	21,00	325,08	6.826,68								
05.02.11.37	SERVICIO INST. DE EQUIPOS DE AA DE AGUA HELADA	und	21,00	388,81	8.165,01								
05.02.12	SERVICIO DE INSTALACION DE VENTILACION GENERAL	gls	1,00	912.522,38	912.522,38	0,66	877.390,27			0,66	96,15%		



**CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
 .....  
 G. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

\*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CEBAR GARAYAR GARCIA\*

UBICACION IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONTRATISTA CONSORCIO SALUD LORETO  
 MONTO S/ 31,226,492.36  
 FECHA DE PRESUPUESTO 31/08/2019  
 FORMULA POLINOMICA No. 05  
 FECHA DE CORTE 30-Jun-21

INSTALACIONES MECANICAS

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.02.13.01	DUCTOS METALICOS: FABRICADOS DE PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO	Kg	43,588.00		10.47	455,336.36		448,743.89			728.03	1.67%	7,622.47
05.02.13.02	DIPUSIONES		16,180.00		0.80	12,944.00						100.00%	12,944.00
05.02.13.03	REJILLA DE RETORNO DE ALUMINIO	PG2	53,232.00		0.65	34,600.80					16,180.00	100.00%	34,600.80
05.02.13.04	FILTRO CORRUGADO	und	32.00		37.10	1,187.20					32.00	100.00%	1,187.20
05.02.13.05	FILTRO BOLSAS	und	32.00		202.94	6,494.08					32.00	100.00%	6,494.08
05.02.13.06	FILTRO HEPA	und	32.00		1,663.55	50,034.56					32.00	100.00%	50,034.56
05.02.13.07	CAJA FORTA FILTRO 24 X 24"	und	22.00		784.41	17,257.02					22.00	100.00%	17,257.02
05.02.13.08	CAJA FORTA FILTRO 48 X 48"	und	1.00		1,307.34	1,307.34					1.00	100.00%	1,307.34
05.02.13.09	VARIADOR DE FRECUENCIA DE 1.5HP	und	2.00		1,568.81	3,137.62					2.00	100.00%	3,137.62
05.02.13.10	VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA DANFOSS DE 0.5HP	und	1.00		2,876.16	2,876.16					1.00	100.00%	2,876.16
05.02.13.11	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL MARCA DMYWR	und	5.00		1,908.73	9,543.65					5.00	100.00%	9,543.65
05.02.13.12	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL MARCA DMYWR	und	6.00		1,098.17	6,589.02					6.00	100.00%	6,589.02
05.02.13.13	VARIAOR DE FRECUENCIA DE 1.0HP	und	1.00		1,568.81	1,568.81					1.00	100.00%	1,568.81
05.02.13.14	SERVICIO DE INST. DE VENTILACION	gdb	1.00		115,574.06	115,574.06		57,787.03	0.50	57,787.03	0.50	50.00%	57,787.03
05.02.13	SERVICIO DE INSTALACION DE COCINA												
05.02.13.01	DUCTOS METALICOS	Kg	2,410.33		10.47	25,236.16	2,210.33	23,142.12		2,210.33	91.70%	2,094.03	
05.02.13.02	CAMPANA EXTRACTORA 3.75 X 1.05 M	und	1.00		9,753.90	9,753.90					1.00	100.00%	9,753.90
05.02.13.03	CAMPANA EXTRACTORA 3.75 X 1.2 M	und	1.00		10,162.61	10,162.61					1.00	100.00%	10,162.61
05.02.13.04	CAMPANA EXTRACTORA 4.7 X 2.8 M	und	1.00		22,910.12	22,910.12					1.00	100.00%	22,910.12
05.02.13.05	CAMPANA EXTRACTORA 2.15 X 1.1 M	und	1.00		6,097.53	6,097.53					1.00	100.00%	6,097.53
05.02.13.06	FILTRO X GRASE TRACTOR	und	4.00		5,229.38	20,917.52					4.00	100.00%	20,917.52
05.02.13.07	SERVICIO DE INST. DE EQUIPOS DE EXTRACCION DE COCINA	gdb	1.00		14,927.76	14,927.76					1.00	100.00%	14,927.76
05.02.14	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE PRESURIZACION DE ESCALERAS												
05.02.14.01	REJILLAS DE SUMINISTRO	PG2	15,360.00		0.74	11,363.40					15,360.00	100.00%	11,363.40
05.02.14.02	DUCTOS METALICOS	Kg	1,400.64		10.47	14,654.70					1,400.64	100.00%	14,654.70
05.02.14.03	SENSOR DE HUMO	und	4.00		1,977.94	7,911.76					4.00	100.00%	7,911.76
05.02.14.04	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE DE 24V a 220V	und	4.00		52.29	209.16					4.00	100.00%	209.16
05.02.14.05	DANFER BAROMETRICO DE 25 X 25"	und	8.00		1,045.88	8,367.04					8.00	100.00%	8,367.04
05.02.14.06	TRANSMISOR DE PRESION DIFERENCIAL	und	4.00		1,088.17	4,352.68					4.00	100.00%	4,352.68
05.02.14.07	FILTRO DE MALLA DE ALUMINIO	und	4.00		869.00	3,556.00					4.00	100.00%	3,556.00
05.02.14.08	SERVICIO DE INST. DE EQUIPOS DE PRESURIZACION DE ESCALERAS	gdb	1.00		40,729.93	40,729.93					1.00	100.00%	40,729.93
05.02.14.09	INTERRUPTOR DE PRESION DIFERENCIAL	und	4.00		405.37	1,621.48					4.00	100.00%	1,621.48
05.02.15	VARIOS												
05.02.15.01	TRANSPORTE CAJE DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE PRESU	set	1.00		93,101.59	93,101.59	0.20	18,620.32		0.20	20.00%	80.00%	74,481.27
05.02.15.02	TRANSPORTE CAJE DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EXTRA	set	1.00		54,422.05	54,422.05	0.50	27,211.04		0.50	50.00%	50.00%	27,211.04
05.02.15.03	TRANSPORTE CAJE DESPLAZAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE A	set	1.00		77,702.97	77,702.97	0.80	62,162.38		0.80	80.00%	20.00%	15,540.59
05.02.16	PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE AIRE CONDICIONADO												
05.02.16.01	PRUEBAS Y BALANCEO DE UNIDADES PARA AGUA HELADA	gdb	1.00		13,758.41	13,758.41					1.00	100.00%	13,758.41
05.02.16.02	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS COMPACTOS (ROOF TOP)	gdb	1.00		13,758.41	13,758.41					1.00	100.00%	13,758.41
05.02.16.03	PRUEBAS Y BALANCEO DE EXPANSION DIRECTA	gdb	1.00		13,758.41	13,758.41					1.00	100.00%	13,758.41
05.02.16.04	PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE PRECION	gdb	1.00		13,758.41	13,758.41					1.00	100.00%	13,758.41
05.02.16.05	PRUEBAS Y BALANCEO VFE	gdb	1.00		13,758.41	13,758.41					1.00	100.00%	13,758.41
05.02.16.06	PRUEBAS Y BALANCEO DE CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE	gdb	1.00		13,758.41	13,758.41					1.00	100.00%	13,758.41
05.02.16.07	PRUEBAS Y BALANCEO RECIBIDOR ELECTROSTATICO	gdb	1.00		13,758.41	13,758.41					1.00	100.00%	13,758.41
05.02.16.08	PRUEBAS Y BALANCEO DE EQUIPOS EXTRACTORES Y VENTILADORES	gdb	1.00		13,758.41	13,758.41					1.00	100.00%	13,758.41
05.02.16.09	PRUEBAS Y BALANCEO EQUIPOS CHILLER	gdb	1.00		13,758.41	13,758.41					1.00	100.00%	13,758.41
05.02.16.10	PRUEBAS Y BALANCEO DEL SISTEMA DE PRESURIZACION	gdb	1.00		13,758.41	13,758.41					1.00	100.00%	13,758.41
05.03	INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES												



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR

S. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

476

VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES MECANICAS

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL N° 2 CESAR GARAYAR GARCÍA"

UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO
MONTO CONTRATADO: S/ 217.226.482,36
FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2019
FORMULA POLINOMICA No. 05
FECHA DE CORTE: 30-Jun-21

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, P.U., CONTRACTUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR METRADO MONTO, PRESENTES METRADO MONTO, ACUMULADO ACTUAL METRADO MONTO, METRADO %, SALDO %, MONTO. Rows include items like TRABAJOS PRELIMINARES, RELEVO COMPROBADO A MANO, etc.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
S. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES MECANICAS  
Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

\*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 DEBAR GARAYAR GARCIA\*  
UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO  
MONTO CONTRATADO: S/ 217,226,482.36  
FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015  
FORMULA POLINOMICA No. 05  
FECHA DE CORTE: 30-Jun-21

INSTALACIONES MECANICAS

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO (UNID, CANTIDAD), CONTRACTUAL (P.U., MONTO), ACUMULADO ANTERIOR (METRADO, MONTO), PRESENTE MES (METRADO, MONTO), ACUMULADO ACTUAL (METRADO, MONTO), SALDO (% METRADO, MONTO).



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
R.G. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
JEFE DE SUPERVISION  
CIP N° 41863



**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES MECANICAS**  
 Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

**\*MEJORAMIENTO DE LOS SERVIDIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA\*.**  
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 SI: 217,226,482.36  
 31/08/2015  
**INSTALACIONES MECANICAS**  
 30-Jun-21

OBRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CONTRATISTA  
 MONTO CONTRATADO  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA POLINOMICA No. 05  
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.03.03.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE VACIO	und	1.00	71,925.31	71,925.31	0.80	57,540.25			0.00	80.00%	0.30	20.00%
05.03.04.2	PIRUTA PARA TUBERIA COLOR BLANCO	g	3,035.80	10.19	30,934.80	2,987.35	30,441.20			2,987.35	99.40%	48.44	1.60%
05.03.04.1	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE VACIO	g	1.00	3,384.05	3,384.05	0.60	2,707.24			0.00	80.00%	0.20	20.00%
05.03.04	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL												
05.03.04.01	SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 1/2"	p/p	34.00	287.89	9,788.26	18.00	4,605.24			16.00	47.05%	18.00	52.94%
05.03.04.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	379.10	102.83	38,994.23	362.63	37,306.29			362.63	95.37%	16.41	4.33%
05.03.04.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	123.00	126.48	15,603.04	105.75	13,715.34			106.75	86.79%	16.25	13.21%
05.03.04.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	71.20	147.30	10,487.26	69.00	10,163.70			93.00	96.91%	2.20	3.09%
05.03.04.05	TUBERIA DE COBRE TIPO K 2"	m	95.40	259.88	24,792.25	22.44	5,831.71			22.44	23.52%	72.96	76.48%
05.03.04.06	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	p/p	161.00	6.25	1,006.25	157.00	981.25	4.00	25.00	161.00	100.00%	1,006.25	100.00%
05.03.04.07	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	p/p	24.00	20.64	495.36	21.00	192.24	8.36	170.80	24.00	100.00%	200.64	100.00%
05.03.04.08	CODO DE COBRE 1" X 90°	p/p	14.00	42.20	590.80	13.00	546.60	1.00	42.20	14.00	100.00%	590.80	100.00%
05.03.04.09	CODO DE COBRE 2" X 90°	p/p	12.00	51.13	613.56	10.00	511.30			10.00	83.33%	2.00	16.67%
05.03.04.10	TEE DE COBRE 1/2"	p/p	27.00	25.32	683.04	26.50	676.98	0.50	12.69	27.00	100.00%	683.04	100.00%
05.03.04.11	TEE DE COBRE 3/4"	p/p	6.00	37.51	225.06	5.50	205.31	0.50	21.66	6.00	100.00%	225.06	100.00%
05.03.04.12	TEE DE COBRE 1"	p/p	6.00	43.91	263.46	5.50	241.51	0.50	21.66	6.00	100.00%	263.46	100.00%
05.03.04.13	TEE DE COBRE 2"	p/p	1.00	59.01	59.01	1.00	59.01			1.00	100.00%	59.01	100.00%
05.03.04.14	UNION SIMPLE DE COBRE 1/2"	p/p	74.00	21.41	1,584.34	72.00	1,541.52			72.00	97.30%	2.00	2.70%
05.03.04.15	UNION SIMPLE DE COBRE 3/4"	p/p	25.00	22.59	564.75	24.50	553.46			24.50	98.00%	0.50	2.00%
05.03.04.16	UNION SIMPLE DE COBRE 1"	p/p	15.00	22.44	336.60	14.50	325.38			14.50	96.67%	0.50	3.33%
05.03.04.17	UNION SIMPLE DE COBRE 2"	p/p	19.00	40.04	760.76	11.00	440.44			11.00	57.89%	8.00	42.11%
05.03.04.18	REDUCCION DE COBRE 1/2" X 3/8"	p/p	37.00	27.07	1,001.59	5.00	135.35			5.00	13.51%	32.00	86.49%
05.03.04.19	REDUCCION DE COBRE 3/4" X 1/2"	p/p	8.00	21.79	196.11	8.00	174.32			8.00	86.89%	174.32	100.00%
05.03.04.20	REDUCCION DE COBRE 1" X 1/2"	p/p	3.00	22.21	66.63	2.50	55.53			2.50	83.34%	0.50	16.67%
05.03.04.21	REDUCCION DE COBRE 2" X 1/2"	p/p	1.00	33.26	33.26	1.00	33.26			1.00	100.00%	33.26	100.00%
05.03.04.22	REDUCCION DE COBRE 2" X 1"	p/p	1.00	38.07	38.07	1.00	38.07			1.00	100.00%	38.07	100.00%
05.03.04.23	VALVULA ESFERICA DE BORGICE DE 3 CUERPOS DE 1/2"	p/p	2.00	60.73	121.46	1.50	115.39			1.50	75.01%	0.50	25.01%
05.03.04.24	VALVULA ESFERICA DE BORGICE DE 3 CUERPOS DE 3/4"	p/p	2.00	88.47	176.94	1.50	115.39			1.50	75.01%	0.50	25.01%
05.03.04.25	VALVULA ESFERICA DE BORGICE DE 3 CUERPOS DE 2"	p/p	1.00	160.71	160.71	0.90	144.64			0.90	90.00%	0.10	10.00%
05.03.04.26	SALIDA PARA ALARMA ADUOSIVUAL DE OX VAC ACM ACTION	p/p	1.00	85.98	85.98	0.90	77.38			0.90	90.00%	0.10	10.00%
05.03.04.27	ALARMA ADUOSIVUAL PARA OX VAC ACM ACTION	p/p	1.00	14,774.99	14,774.99	0.90	13,297.49			0.90	90.00%	0.10	10.00%
05.03.04.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	und	1.00	278,137.22	278,137.22	0.85	236,416.64			0.85	85.00%	0.15	15.00%
05.03.04.29	PIRUTA PARA TUBERIA COLOR NEGRO	und	3,704.50	10.19	37,748.86	3,599.08	36,674.63			3,599.08	97.15%	105.42	2.85%
05.03.04.30	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL	g	1.00	3,384.05	3,384.05	0.70	2,368.84			0.70	70.00%	0.30	30.00%
05.03.05	SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL												
05.03.05.01	SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL 1/2"	p/p	3.00	287.89	863.67								
05.03.05.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	216.30	102.65	22,248.62	198.92	20,400.91			198.92	91.95%	17.38	8.04%
05.03.05.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	8.00	1,027.84	8,222.72	7.00	8,999.39			7.00	87.50%	1.00	12.50%
05.03.05.04	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	58.10	147.30	8,553.53	85.73	12,628.03			85.73	89.21%	10.37	10.78%
05.03.05.05	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	p/p	69.00	336.62	23,275.58	62.50	22,888.75			62.50	90.44%	6.50	9.56%
05.03.05.06	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	p/p	18.00	40.20	723.60	18.00	759.60			18.00	100.00%	759.60	100.00%
05.03.05.07	TEE DE COBRE 1/2"	p/p	9.00	45.83	412.74	8.00	363.88			8.00	88.89%	1.00	11.11%
05.03.05.08	TEE DE COBRE 3/4"	p/p	1.00	37.51	37.51	0.50	18.76			0.50	50.01%	0.50	50.01%
05.03.05.09	TEE DE COBRE 1"	p/p	2.00	43.91	87.82	43.91	87.82			43.91	100.00%	43.91	100.00%
05.03.05.10	UNION SIMPLE DE COBRE 1/2"	p/p	42.00	21.41	899.22	41.00	877.81			41.00	97.62%	1.00	2.38%
05.03.05.11	UNION SIMPLE DE COBRE 3/4"	p/p	3.00	22.59	67.77	2.00	45.18			2.00	66.67%	1.00	33.33%
05.03.05.12	UNION SIMPLE DE COBRE 1"	p/p	23.00	22.44	516.12	22.00	493.68			22.00	95.65%	1.00	4.35%



**CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
 ROLANDO SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES MECANICAS**

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

**\*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 DEBAR GARAYAR GARCIA\*.**

IGUITOS - MAYNAS - LORETO  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONSORCIO SALUD LORETO  
SI: 217,226,482.36  
31/08/2015

**INSTALACIONES MECANICAS**  
30-Jun-21

OBRA  
UBICACION  
ENTIDAD  
CONTRATISTA  
MONTO CONTRATADO  
FECHA DE PRESUPUESTO  
FORMULA POLINOMICA No. 05  
FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.03.05.13	REDUCCION DE COBRE 1/2" X 3/8"	p28	6.00	27.07	162.42							6.00	162.42
05.03.05.14	REDUCCION DE COBRE 3/4" X 1/2"	p28	2.00	21.79	43.58	1.00	21.79				1.00	21.79	50.00%
05.03.05.15	REDUCCION DE COBRE 1" X 1/2"	p28	2.00	22.21	44.42	1.00	22.21				1.00	22.21	50.00%
05.03.05.16	REDUCCION DE COBRE 1" X 3/4"	p28	1.00	24.31	24.31	0.50	12.16				0.50	12.16	50.00%
05.03.05.17	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3 CUERPOS DE 1/2"	p28	6.00	60.73	364.38	5.00	303.65				5.00	303.65	50.00%
05.03.05.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL	unid	1.00	102.219.63	102.219.63	0.60	61.331.78				0.60	61.331.78	60.00%
05.03.05.19	PIRUFITURA PARA TUBERIA COLOR MARRON	m	320.40	10.19	3,264.83	292.43	2,979.76				292.43	2,979.76	91.27%
05.03.05.20	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL	gpb	1.00	3,984.05	3,984.05	0.70	2,368.84				0.70	2,368.84	70.00%
05.03.05.21	SISTEMA DE OXIDO NITROSO	gpb	3.00	287.89	863.67								
05.03.05.01	SALIDA DE OXIDO NITROSO 1/2"	m	149.70	102.66	15,398.14	142.39	14,646.24				142.39	14,646.24	95.12%
05.03.05.02	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2"	m	102.60	147.30	15,112.98	93.12	13,716.58				93.12	13,716.58	90.76%
05.03.05.03	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1"	m	38.00	39.62	1,505.56	37.00	1,354.94				37.00	1,354.94	97.37%
05.03.05.04	CODO DE COBRE 1/2" X 90°	p28	8.00	42.20	337.60	17.00	717.40				17.00	717.40	94.44%
05.03.05.05	CODO DE COBRE 1" X 90°	p28	6.00	45.85	275.10	5.00	229.30				5.00	229.30	83.33%
05.03.05.06	TEE DE COBRE 1/2"	p28	27.00	21.41	578.07	26.00	559.65				26.00	559.65	96.30%
05.03.05.07	TEE DE COBRE 1"	p28	2.00	22.44	44.88	19.00	426.36				19.00	426.36	95.00%
05.03.05.08	REDUCCION DE COBRE 1/2" X 3/8"	p28	2.00	22.21	44.42	1.00	22.21				1.00	22.21	50.00%
05.03.05.09	REDUCCION DE COBRE 1/2" X 1/2"	p28	2.00	22.21	44.42	1.00	22.21				1.00	22.21	50.00%
05.03.05.10	REDUCCION DE COBRE 1/2" X 3/4"	p28	1.00	24.31	24.31	0.60	12.16				0.60	12.16	60.00%
05.03.05.11	REDUCCION DE COBRE 1" X 1/2"	p28	1.00	24.31	24.31	0.60	12.16				0.60	12.16	60.00%
05.03.05.12	REDUCCION DE COBRE 1" X 3/4"	p28	1.00	24.31	24.31	0.60	12.16				0.60	12.16	60.00%
05.03.05.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIPULADOR DE OXIDO NITROSO	unid	1.00	31,596.94	31,596.94	0.80	18,958.16				0.80	18,958.16	25.00%
05.03.05.14	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE OXIDO NITROSO	gpb	252.30	10.19	2,570.94	210.76	2,147.64				210.76	2,147.64	83.54%
05.03.05.15	EVACUACION DE GASES	gpb	1.00	3,094.76	3,094.76	0.70	2,169.33				0.70	2,169.33	70.00%
05.03.05.16	SALIDA PARA EVACUACION DE GASES 3/4"	p10	3.00	290.91	872.73								
05.03.05.17	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4"	m	6.00	128.48	770.88								
05.03.05.18	CODO DE COBRE 3/4" X 90°	p28	3.00	8.35	25.05								
05.03.05.19	REDUCCION DE COBRE 3/4" X 3/8"	p28	3.00	22.82	68.46								
05.03.05.20	COLGADOR PARA TUBERIA	p28	19.00	21.20	402.80	18.00	381.60				18.00	381.60	94.74%
05.03.05.21	COLGADOR PARA TUBERIAS	p28	704.00	32.13	22,619.52	701.00	22,523.13				701.00	22,523.13	99.57%
05.03.05.22	COLGADOR PARA TUBERIAS	p28	114.00	43.81	5,005.74	112.00	4,917.92				112.00	4,917.92	98.25%
05.03.05.23	COLGADOR PARA TUBERIAS	p28	75.00	52.95	3,972.00	74.00	3,919.04				74.00	3,919.04	98.67%
05.03.05.24	CAJAS DE VALVULAS PARA OXIGENO 1/2" Y VACIO 1"	unid	14.00	4,063.38	56,887.32	13.80	56,074.64				13.80	56,074.64	98.57%
05.03.05.25	CAJAS DE VALVULAS PARA OXIGENO 1/2" Y VACIO 3/4"	unid	3.00	4,008.19	12,024.57	2.80	11,222.93				2.80	11,222.93	93.33%
05.03.05.26	CAJAS DE VALVULAS PARA OXIGENO 3/4" Y VACIO 1"	unid	8.00	4,009.57	32,077.76	7.80	31,509.57				7.80	31,509.57	97.50%
05.03.05.27	CAJAS DE VALVULAS PARA OXIGENO 1/2" VACIO 1 Y AIRE MED. 1/2"	unid	2.00	5,622.50	11,245.00	1.80	10,120.50				1.80	10,120.50	90.00%
05.03.05.28	CAJAS DE VALVULAS PARA OXIGENO 3/4" VACIO 1 Y AIRE MED. 3/4"	unid	2.00	5,674.24	11,348.48	1.80	10,213.63				1.80	10,213.63	90.00%
05.03.05.29	CAJAS DE VALVULAS PARA OXIGENO 1/2" VACIO 3/4 Y AIRE MED. 1/2"	unid	3.00	15,607.13	46,821.39	2.80	43,699.65				2.80	43,699.65	93.33%
05.03.05.30	TABLEROS DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO	p28	6.00	542.61	3,255.66	5.60	3,038.62				5.60	3,038.62	93.33%
05.03.05.31	TABLEROS DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO	p28	3.00	633.44	1,915.32	2.60	1,659.84				2.60	1,659.84	86.67%
05.03.05.32	TABLEROS DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO	p28	2.00	734.44	1,468.88	1.80	1,276.88				1.80	1,276.88	90.00%
05.03.05.33	TABLEROS DE CONTROL DE GASES MEDICINALES PARA SISTEMAS DE OXIGENO	p28	2.00	734.44	1,468.88	1.80	1,276.88				1.80	1,276.88	90.00%
05.03.05.34	BUZON DE CONCRETO	unid	3.00	2,596.28	7,788.84								
05.03.05.35	TUBERIA FLEXIBLE EN JUNTA DE DILATACION DE 1/2"	unid	4.00	169.56	678.24	3.00	508.68				3.00	508.68	75.00%
05.03.05.36	TUBERIA FLEXIBLE EN JUNTA DE DILATACION DE 3/4"	unid	2.00	292.93	585.86	1.05	297.08				1.05	297.08	52.50%
05.03.05.37	TUBERIA FLEXIBLE EN JUNTA DE DILATACION DE 1"	unid	2.00	292.93	585.86	1.05	297.08				1.05	297.08	52.50%
05.03.05.38	TUBERIA FLEXIBLE EN JUNTA DE DILATACION DE 1"	unid	6.00	441.78	2,650.68	5.05	2,230.99				5.05	2,230.99	84.17%



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
 SAFURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES MECANICAS**

Período del 16 Ene al 30-Jun-21

**\*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 OEBAR GARAYAR GARCIA\***

IGUITOS - MAYNAS - LORETO  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONSORCIO SALUD LORETO  
SI. 217.226.482.36

**INSTALACIONES MECANICAS**

30-Jun-21

OBRA  
UBICACION  
ENTIDAD  
CONTRATISTA  
MONTO CONTRATADO  
FECHA DE PRESUPUESTO  
FORMULA POLINOMICA No. 05  
FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO UNID	P.U.	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
				MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO
05.03.01.19	TUBERIA FLEXIBLE EN JUNTA DE DILATACION DE 1"1/4"	8,00	589,22	4.713,76	7,05	4.154,00	7,05	4.154,00	7,05	88,12%	4.154,00	0,95	559,76
05.04.01	SISTEMA DE GAS LIQUADO DE PETROLEO - GLP												
05.04.01	ALIMENTADOR DE GAS / CORREDORES	2,00	92.265,93	184.531,86	1,90	175.305,27	1,90	175.305,27	1,90	95,00%	175.305,27	0,10	9.226,59
05.04.01.01	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GAS LIQUADO	20,80	240,48	5.001,98								20,80	5.001,98
05.04.01.02	TUBERIA DE COBRE TIPO L2 1/2"	37,44	221,94	8.309,43								37,44	8.309,43
05.04.01.03	TUBERIA DE COBRE TIPO L1 1/4"	126,90	223,03	28.302,51								126,90	28.302,51
05.04.01.04	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1"	71,76	213,04	15.287,75								71,76	15.287,75
05.04.01.05	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4"	210,10	204,70	43.026,38								210,10	43.026,38
05.04.01.06	TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2"	2,00	3.502,53	7.005,06								2,00	7.005,06
05.04.01.07	VALVULA REDUCTORA DE PRESION TERA ETAPA	8,00	2.611,47	20.891,76								8,00	20.891,76
05.04.01.08	VALVULA REDUCTORA DE PRESION 2DA ETAPA	2,00	282,05	564,12								2,00	564,12
05.04.01.09	VALVULA BOLA 2 1/2"	1,00	180,39	180,39								1,00	180,39
05.04.01.10	VALVULA BOLA 1 1/4"	1,00	80,59	80,59								1,00	80,59
05.04.01.11	VALVULA BOLA 3/4"	8,00	47,91	383,28								8,00	383,28
05.04.01.12	VALVULA BOLA 1/2"	6,00	38,67	232,02								6,00	232,02
05.04.01.13	VALVULA BOLA 3/4"	4,00	245,87	983,48								4,00	983,48
05.04.01.14	SALIDA DE GAS LIQUADO DE PETROLEO 1/2"	4,00	245,87	983,48								4,00	983,48
05.04.01.15	SALIDA DE GAS LIQUADO DE PETROLEO 3/4"	2,00	261,79	523,58								2,00	523,58
05.04.01.16	SALIDA DE GAS LIQUADO DE PETROLEO 1"	2,00	261,79	523,58								2,00	523,58
05.04.01.17	CODO DE COBRE 3/4" X 1/2"	2,00	60,21	120,42								2,00	120,42
05.04.01.18	CODO DE COBRE 1" X 1/2"	3,00	8,36	25,08								3,00	25,08
05.04.01.19	CODO DE COBRE 1" X 1/4"	13,00	17,58	228,54								13,00	228,54
05.04.01.20	CODO DE COBRE 1/2" X 1/2"	13,00	6,25	81,25								13,00	81,25
05.04.01.21	CODO DE COBRE 1/2" X 1/4"	5,00	18,72	93,60								5,00	93,60
05.04.01.22	CODO DE COBRE 1/4" X 1/2"	1,00	83,55	83,55								1,00	83,55
05.04.01.23	TEE DE COBRE 1/2"	1,00	35,21	35,21								1,00	35,21
05.04.01.24	TEE DE COBRE 3/4"	1,00	41,61	41,61								1,00	41,61
05.04.01.25	TEE DE COBRE 1"	2,00	25,32	50,64								2,00	50,64
05.04.01.26	TEE DE COBRE 1 1/4" X 1/2"	1,00	44,78	44,78								1,00	44,78
05.04.01.27	REDUCCION DE COBRE 1" - 3/4"	1,00	26,93	26,93								1,00	26,93
05.04.01.28	MANOMETRO	1,00	285,50	285,50								1,00	285,50
05.04.01.29	VALVULA DE REFERENCIA 1/2"	4,00	60,70	242,80								4,00	242,80
05.04.01.30	VALVULA DE REFERENCIA 3/4"	4,00	69,13	276,52								4,00	276,52
05.04.01.31	PRUEBA PARA TUBERIA COLOR AMARILLO	195,10	10,19	1.988,07								195,10	1.988,07
05.04.01.32	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE GAS LIQUADO DE PETROLEO	1,00	2.417,18	2.417,18								1,00	2.417,18
05.04.02	VARIOS												
05.04.02.01	COLGADOR PARA TUBERIA ADOZADA EN TECHO	39,00	25,30	986,70								39,00	986,70
05.04.02.02	ABRIGADERA PARA 1 TUBERIAS	92,00	57,41	5.281,72								92,00	5.281,72
05.04.02.03	TUBERIA FLEXIBLE EN JUNTA DE DILATACION DE 1/2"	2,00	169,56	339,12								2,00	339,12
05.04.02.04	CAHALETA DE CONCRETO CON IMPERMEAB. PARA GLP ALTO=0,35M	7,20	145,53	1.047,82								7,20	1.047,82
05.04.02.05	CAHALETA DE CONCRETO CON IMPERMEAB. PARA GLP ALTO=0,60M	16,20	288,60	4.675,32								16,20	4.675,32
05.04.02.06	CAJA DE REG. CONGR. - 24" X 24" TAPA CONCRETO	6,00	281,24	1.687,44								6,00	1.687,44
05.04.02.07	DUOTO DE CONCRETO DE 2 VÍAS	16,50	57,62	950,73								16,50	950,73
05.04.02.08	CAJA REGULADOR DE PRESION PARA GLP	2,00	38,14	76,28								2,00	76,28
05.05	SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO												
05.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES												
05.05.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO. H=0,35 M. A1	13,77	8,23	113,33								13,77	113,33
05.05.01.02	EXCAVACION MANUAL PARA SISTEMA DE PETROLEO Y RETORNO. H=0,60 M. A1	9,21	9,32	85,84								9,21	85,84
05.05.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL. CARGADOR 135 VOLQUETE 5 W. A1	8,10	87,23	706,56								8,10	706,56



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
JEFE DE SUPERVISION  
CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES MECANICAS**

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

**\*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA\*.**

IGUITOS - MAYNAS - LORETO  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONSORCIO SALUD LORETO

S/. 217,226,482.36

31/08/2015

**INSTALACIONES MECANICAS**


30-Jun-21

OBRA  
UBICACION  
ENTIDAD  
CONTRATISTA  
MONTO CONTRATADO  
FECHA DE PRESUPUESTO  
FORMULA POLINOMICA No. 05  
FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.05.02	SISTEMA DE PETROLEO												
05.05.02.01	SALIDA DE PETROLEO 1 1/4"	P/D	2,00	446,31	892,62							2,00	100,00%
05.05.02.02	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/4" - SUCCION	m	26,90	32,55	875,60							26,90	100,00%
05.05.02.03	TUBERIA SCH - 40 DE 3/4" - RETORNO	m	39,00	27,31	1,065,09							39,00	100,00%
05.05.02.04	TUBERIA SCH - 40 DE 4" - VENTILACION	m	5,15	68,33	351,90							5,15	100,00%
05.05.02.05	CODO SCH - 40 1 1/4" x 509 - RANURADO	P29	8,00	68,54	548,32							8,00	100,00%
05.05.02.06	CODO SCH - 40 4" x 509 - RANURADO	P29	2,00	148,61	297,22							2,00	100,00%
05.05.02.07	TEE SCH - 40 1 1/4" - RANURADO	P29	4,00	102,42	409,68							4,00	100,00%
05.05.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE DE PETROLEO DES. CAP. 2500 GUS	UND	1,00	62,951,79	62,951,79	0,80	50,361,43	0,80	60,00%	0,80	50,361,43	0,20	20,00%
05.05.02.09	TANQUE DIARIO DE PETROLEO 250 G.L N 5	UND	1,00	13,114,01	13,114,01	0,80	10,491,21	0,80	80,00%	0,80	10,491,21	0,20	20,00%
05.05.02.10	ELECTROBOMBAS DE PETROLEO 0.5HP	UND	2,00	18,001,38	36,002,72							2,00	100,00%
05.05.02.11	ELECTROBOOMBAS DE PETROLEO 0.25HP	UND	1,00	18,001,38	18,001,38							1,00	100,00%
05.05.02.12	PINTURA PARA TUBERIA COLOR MARRON	m	82,55	10,19	841,18							82,55	100,00%
05.05.02.13	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE PETROLEO	q/b	1,00	4,350,92	4,350,92							1,00	100,00%
05.05.03	SISTEMA DE RETORNO DE PETROLEO												
05.05.03.01	SALIDA DE RETORNO DE PETROLEO 3/4"	P/D	2,00	436,43	872,85							2,00	100,00%
05.05.03.02	TUBERIA SCH - 40 DE 1 1/2" - ROCIADORES	m	43,14	34,10	1,474,95							43,14	100,00%
05.05.03.03	CODO SCH - 40 1 1/2" x 509 - RANURADO	P29	7,00	86,38	604,65							7,00	100,00%
05.05.03.04	TEE SCH - 40 1 1/2" - RANURADO	P29	3,00	115,38	346,14							3,00	100,00%
05.05.03.05	PHTURA PARA TUBERIA COLOR MARRON	m	43,14	10,19	439,60							43,14	100,00%
05.05.03.06	PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE RETORNO DE PETROLEO	q/b	1,00	4,350,92	4,350,92							1,00	100,00%
05.05.04	VALVULAS												
05.05.04.01	VALVULA BOIA 1 1/4"	P28	6,00	185,69	1,115,34							6,00	100,00%
05.05.04.02	VALVULA BOIA 1 1/2"	P28	1,00	232,69	232,69							1,00	100,00%
05.05.04.03	VALVULA DE ALIVIO 1 1/2"	P28	2,00	270,95	541,90							2,00	100,00%
05.05.04.04	VALVULA DE RETENCION 1 1/4"	P28	2,00	161,25	322,50							2,00	100,00%
05.05.04.05	VALVULA ANTIRETORNO	UND	1,00	9,658,84	9,658,84							1,00	100,00%
05.05.04.06	FILTRO TIPO "Y" DE 1 1/4"	P28	2,00	172,20	344,40							2,00	100,00%
05.05.04.07	FILTRO TIPO "Y" DE 1 1/2"	P28	1,00	182,84	182,84							1,00	100,00%
05.05.04.08	MARQUETRO (DISEÑO)	P28	4,00	250,34	1,001,36							4,00	100,00%
05.05.04.09	SOPORTE METALICO PARA TUBERIAS EN PISO	P28	9,00	26,93	242,37							9,00	100,00%
05.05.04.10	ABRIGADERA PARA 2 TUBERIAS	P28	4,00	33,17	132,68							4,00	100,00%
05.05.04.11	WCBR DE PETROLEO	P28	3,00	45,84	137,52							3,00	100,00%
05.05.04.12	CAMBITILLA DE SUCCION	UND	1,00	87,05	87,05							1,00	100,00%
05.05.04.13	BOZON DE CONCRETO CON INFERMEAB. PARA PETROLEO. ALTO=0.35M. AN	m	19,20	145,53	2,794,18							19,20	100,00%
05.05.04.14	BOZON DE CONCRETO PARA TUBERIA	UND	7,00	6,59	46,06							7,00	100,00%
05.05.04.15	BOZON DE CONCRETO.P. CONEXIONES MECANICAS ( 1,00 x 1,00 x 1,00 M )	UND	2,00	1,279,78	2,559,55							2,00	100,00%
05.05.04.16	TRANS.P. ELIZABE DE TANQUES	ton	1,00	351,93	351,93							1,00	100,00%
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>16,058,863,69</b>		<b>10,640,224,83</b>		<b>165,189,40</b>		<b>10,796,414,21</b>		<b>5,273,449,61</b>
	GASTOS GENERALES				2,392,894,60		1,584,390,37		23,257,50		1,607,647,65		785,245,82
	UTILIDAD				482,095,91		319,206,74		4,685,63		323,892,43		158,903,46
	<b>SUB-TOTAL</b>				<b>18,944,854,26</b>		<b>12,543,821,94</b>		<b>184,132,56</b>		<b>12,727,954,50</b>		<b>6,216,936,92</b>
	IG.V.				3,410,073,77		2,257,687,95		33,143,85		2,291,031,81		1,119,041,99
	<b>TOTAL</b>				<b>22,354,928,03</b>		<b>14,801,709,89</b>		<b>217,276,44</b>		<b>15,018,986,31</b>		<b>7,335,941,91</b>



**SORSO SUPERVISOR GARAYAR**  
 SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

 <b>CONSORCIO SALUD LORETO</b>	Proyecto:	<b>VALORIZACION No40 JUNIO 2021</b>
	“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO”	Revisión:

**VALORIZACIÓN DE  
INSTALACIONES DE  
COMUNICACIONES**

**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-Z CESAR GARAYAR GARCIA",  
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 SI. 217.226.482.36  
 31/08/2015

**INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**  
**30-Jun-21**

OBRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CONTRATISTA  
 MONTO CONTRATADO  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA POLINOMICA No. 06  
 FECHA DE CORTE

CODIGO SE PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		P.U.	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD		MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%
55.01.01	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	m	11.00	20.21	222.31	11.00	222.31							
55.01.02	CANALIZACIONES Y DUCTOS	m	11.00	59.35	641.65	11.00	641.65							
55.01.03	RELECHO COMPACTADO A MANO, CON MATERIAL DE PRESTAMO	m	11.00	38	414.34	11.00	414.34							
55.01.04	DUCTO 1" RIGIDO DE TERMOPLASTICO LIBRE DE HALOGENO HT	m	4.001	5.44	23.841.34	4.270.10	23.226.34				130.80	23.226.34	2.97%	712.10
55.01.05	DUCTO 1" RIGIDO DE TERMOPLASTICO LIBRE DE HALOGENO HT	unp	3.00	1.122.30	3.353.65	1.60	2.659.89				6.50	2.659.89	16.97%	561.16
55.01.06	BIZONETA CON TAPA METALICA (100x100x150mm)	unp	14.00	768.68	10.764.32	11.00	8.457.89				3.00	8.457.89	21.43%	2.306.04
55.01.07	DUCTO DE CONCRETO DE 2 VIVAS	m	29.00	52.87	1.533.23	25.00	1.371.62				4.00	1.533.23	19.2%	118.61
55.01.08	DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIVAS	m	13.00	111.85	1.454.18	12.00	1.342.32				1.00	1.454.18	6.83%	118.61
55.01.09	BANDEJA TIPO MALLA DE ACERO CABLEADO HORIZONTAL	m	1.094.00	33.58	37.174.12	1.016.00	34.591.64				78.00	34.591.64	74.58%	3.060.20
55.01.10	CAJA METALICA DE FIERRO GALVANIZADO CON TAPA GANG	m	921.00	23.33	21.485.53	921.00	21.485.53							
55.01.11	CAJA DE PASE METALICA DE FIERRO GALVANIZADA	m	1.460.00	21.88	34.981.60	1.460.00	34.981.60							
55.01.12	FIRE STOPPING	unp	10.00	214.88	2.148.80	3.00	644.64				7.00	2.148.80	70.00%	1.504.16
55.01.13	CURVA DE 90° PARA INTERIORES	unp	58.00	41.70	2.418.60	58.00	2.418.60							
55.01.14	CURVA DE 45° PARA INTERIORES	unp	57.00	78.08	4.450.56	47.00	3.693.76				10.00	4.450.56	17.54%	760.80
55.01.15	BANDEJA TIPO **	unp	3.00	78.08	234.24	3.00	234.24							
55.01.16	TUBERIA PERIFONEO CONDUIT EMT 1"	m	594.00	15.44	9.171.36	594.00	9.171.36							
55.01.17	TUBERIA LLAMADA DE ENFERMERA CONDUIT EMT 1"	m	1.890.00	15.44	29.181.60	1.890.00	29.181.60							
55.01.18	SALIDA MODULO DE ESTACION LLAMADO ENFERMERA CENTRAL	m	14.00	85.14	1.191.96	11.00	936.54							
55.01.19	SALIDA PULSADOR DE EMERGENCIA EN CAVA	m	218.00	85.14	18.559.52	208.00	17.709.12			10.00	851.40	255.42		
55.01.20	SALIDA PULSADOR DE EMERGENCIA EN CAVA	m	101.00	85.14	8.599.14	98.00	8.343.72			3.00	255.42			
55.01.21	SALIDA PULSADOR MANUAL DE BAÑO	m	84.00	85.14	7.151.76	82.00	6.981.48			2.00	170.28			
55.01.22	SALIDA PULSADOR DE PIE QUIROFANO	m	4.00	85.14	340.56	3.50	297.99			0.50	42.57			
55.01.23	SALIDA DOBLE DE DATA	m	340.00	85.14	28.947.60	340.00	28.947.60							
55.01.24	SALIDA SIMPLE DE DATA	m	1.300.00	85.14	111.182.84	1.300.00	111.182.84							
55.01.25	SALIDA SIMPLE DE CONTROL DE ACCESO	m	11.00	85.14	936.54	11.00	936.54							
55.01.26	SALIDA DE MARCADOR BIOMETRICO	m	4.00	85.14	340.56	4.00	340.56							
55.01.27	SALIDA SIMPLE IP-TV	m	179.00	85.14	15.240.06	179.00	15.240.06							
55.01.28	SALIDA PARA PUERTO CENTRAL DE VIDEO VIGILANCIA	m	2.00	85.14	170.28	2.00	170.28							
55.01.29	SALIDA SIMPLE CCTV	m	130.00	85.14	11.069.20	130.00	11.069.20							
55.01.30	SALIDA PARA TELEFONO PUBLICO	m	6.00	85.14	510.84	6.00	510.84							
55.01.31	SALIDA PARA CAJA DE DISTRIBUCION OPTICA	m	24.00	85.14	2.043.36	24.00	2.043.36							
55.01.32	SALIDA PARA CAJA DE DISTRIBUCION OPTICA	m	612.00	85.14	52.105.68	612.00	52.105.68							
55.01.33	SALIDA PARA CAJAS DE DISTRIBUCION OPTICA	m	150.00	85.14	12.771.00	150.00	12.771.00							
55.01.34	SALIDA PARA CAJAS DE DISTRIBUCION OPTICA	m	248.00	85.14	21.114.72	248.00	21.114.72							
55.01.35	SALIDA PARA CAJAS DE DISTRIBUCION OPTICA	m	9.00	85.14	766.26	9.00	766.26							
55.01.36	SALIDA PARA CAJAS DE DISTRIBUCION OPTICA	m	39.00	85.14	3.320.46	39.00	3.320.46							
55.01.37	SALIDA PARA CAJAS DE DISTRIBUCION OPTICA	m	1.00	85.14	85.14	1.00	85.14							
55.01.38	SALIDA PARA CAJAS DE DISTRIBUCION OPTICA	m	695.00	85.14	76.200.30	695.00	76.200.30							
55.01.39	SALIDA PARA CAJAS DE DISTRIBUCION OPTICA	m	223.00	85.14	19.411.92	227.00	19.326.78							
55.01.40	SALIDA DETECTOR DE HUMID EN TECHO	m	4.00	85.14	340.56	1.00	85.14			2.00	170.28			
55.01.41	SALIDA DETECTOR DE HUMID EN TECHO	m	38.00	85.14	3.235.32	37.00	3.150.18							
55.01.42	SALIDA DETECTOR OPTICO TERMICO	m	52.00	85.14	4.427.28	51.00	4.342.14							
55.01.43	SALIDA SENSOR DE ANIEGO	m	37.00	85.14	3.150.18	35.00	2.979.90							
55.01.44	SALIDA PARA DETECTOR DE LLAMAS	m	2.00	85.14	170.28	2.00	170.28							



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Período del 16 Ene al 30-Jun-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA,
IQUITOS - MAYNÁS - LORETO
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CONSORCIO SALUD LORETO
SI/ 217.226.482.36
31/08/2015
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
30-Jun-21

OBRA
UBICACION
ENTIDAD
CONTRATISTA
MONTO CONTRATADO
FECHA DE PRESUPUESTO
FORMULA POLINOMICA No. 06
FECHA DE CORTE

Table with columns: CODIGO PARTIDA, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO UNO CANTIDAD, CONTRACTUAL MONTO, ACUMULADO ANTERIOR MONTO, PRESENTE MES MONTO, ACUMULADO ACTUAL MONTO, SALDO MONTO. Rows include items like SALIDA PARA CAMPANA, SALIDA PULSADOR BLOQUEO DE EXTINCION, etc.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR
SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**

Periódico del 16 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".  
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 SI. 217.226.482.38  
 31/09/2015

**INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**

30-Jun-21

OBRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CONTRATISTA  
 MONTO CONTRATADO  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA POLINOMICA No. 06  
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID.	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
50.03.15	CABLE RCA A RCA 3X3	und	179.00	17.80	31.865.20							179.00	100.00%
50.03.16	CABLE VGA A VGA	und	179.00	22.10	3.955.90							179.00	100.00%
50.03.17	CAJA IP65	und	30.00	25.71	771.30							30.00	100.00%
50.03.18	FACERLATE SALIDA DOBLE DE DATA	und	340.00	5.01	1.703.40	280.00	1.402.60			260.00	82.35%	1.402.60	100.00%
50.03.19	FACERLATE SALIDA SIMPLE DE DATA	und	1.305.00	5.01	6.543.05	763.60	3.925.84			763.60	60.00%	3.925.84	100.00%
50.03.20	SPO SPLITTER TV	und	52.00	8.12	422.24							52.00	100.00%
50.03.21	PLACA PARA ADAPTADORES OPTICOS	und	380.00	85.03	32.691.40							380.00	100.00%
50.03.22	KIT BRIDEJA DE EMPALME 8F	und	140.00	503.15	70.441.00	119.00	59.874.85			119.00	85.00%	59.874.85	100.00%
50.03.23	PLACA DE METAL PARA SALIDAS DE CABLES	und	179.00	43.32	7.754.28							179.00	100.00%
50.03.24	JACK METALICO DE ALUMINIO ANCIADO DE 1 HUECO	und	179.00	44.71	8.003.09							179.00	100.00%
50.03.25	JACK METALICO 8.5mm PARA AUDIO ESTEREO	und	24.00	44.71	1.073.04	24.00	1.073.04			24.00	100.00%	1.073.04	100.00%
50.03.26	JACK METALICO 6.5mm PARA AUDIO MONO	und	179.00	2.81	502.59							179.00	100.00%
50.03.27	FACERLATE PARA JACK RJ-11	und	6.00	5.01	30.05							6.00	100.00%
50.03.28	JACK RJ-11	und	6.00	1.71	10.26							6.00	100.00%
50.03.30	INSTALACION DE CABLEADO DE FIBRA Y ACCESORIOS	gb	1.00	128.675.18	128.675.18	0.55	71.049.69	0.15	19.301.23	0.70	70.22%	90.351.28	23.76%
64.04	ELEMENTOS DE INTERCONEXION	und	31.00	1.231.84	38.187.04							31.00	100.00%
64.04.01	DISTRIBUIDOR INTERNO MODULAR (ODF)	und	144.00	331.55	47.602.24							144.00	100.00%
64.04.03	INSTALACION DE ELEMENTOS DE INTERCONEXION Y ACCESORIOS	gb	1.00	29.130.63	29.130.63							1.00	100.00%
64.05	ELEMENTOS AUXILIARES	und	14.00	1.642.25	22.591.50							14.00	100.00%
64.05.01	GABINETE DE SERVIDORES DE 42 U	und	23.00	228.39	6.394.92							23.00	100.00%
64.05.02	ORGANIZADORES VERTICALES	und	14.00	144.25	2.019.50	4.00	577.00			4.00	28.57%	577.00	100.00%
64.05.03	ORGANIZADORES HORIZONTALES	und	28.00	1.400.70	39.219.60							28.00	100.00%
64.05.04	FUO VERTICAL DE 24 TOMAS	und	2.00	72.714.31	145.428.62							2.00	100.00%
64.05.05	GABINETE DE PISO DE 24 U PARA DISTRIBUCION	und	2.00	1.103.75	2.207.50							2.00	100.00%
64.05.06	ORGANIZADORES VERTICALES	und	4.00	550.55	2.202.24							4.00	100.00%
64.05.07	ORGANIZADORES HORIZONTALES	und	2.00	144.25	288.50							2.00	100.00%
64.05.08	FUO VERTICAL DE 8 TOMAS	und	4.00	1.081.00	4.324.00							4.00	100.00%
64.05.09	UFS DE 19 KVA	und	8.00	14.543.34	116.346.72							8.00	100.00%
64.05.10	GABINETE DE PARED DE 19 U	und	3.00	692.81	2.978.43							3.00	100.00%
64.05.11	ORGANIZADORES HORIZONTALES	und	3.00	144.25	432.75							3.00	100.00%
64.05.12	FUO HORIZONTAL DE 8 TOMAS	und	3.00	948.71	2.846.13							3.00	100.00%
64.05.13	UFS DE 12 KVA	und	3.00	655.20	2.058.60							3.00	100.00%
64.05.14	SWITCH NMI PARA DATACENTER	und	1.00	10.250.92	10.250.92							1.00	100.00%
64.05.15	ENTREPANOS (BANDEJAS) PARA GABINETE	und	37.00	164.78	6.098.66							37.00	100.00%
64.05.16	FELO TECNICO PARA DATACENTER	und	1.00	42.293.15	42.293.15							1.00	100.00%
64.05.17	AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION PARA DATACENTER	gb	1.00	84.598.31	84.598.31	0.50	21.149.58			0.50	50.00%	21.149.58	100.00%
64.05.18	INSTALACION DE ELEMENTOS AUXILIARES	gb	1.00	218.146.37	218.146.37							1.00	100.00%
64.05.19	SISTEMA DE TELEFONIA IP	und	2.00	173.849.91	347.699.82							2.00	100.00%
64.05.20	CENTRAL TELEFONICA	und	1.00	37.717.07	37.717.07							1.00	100.00%
64.05.21	GATEWAY	und	2.00	5.883.60	11.767.20							2.00	100.00%
64.05.22	TELEFONO IP TIPO I RECUTIVOS	und	1.00	693.02	6.930.20							1.00	100.00%
64.05.23	TELEFONO IP TIPO II USO GENERAL	und	220.00	413.13	90.898.60							220.00	100.00%
64.05.24	TELEFONO IP DE OPERADORA	und	3.00	1.591.78	4.775.34							3.00	100.00%
64.05.25	TELEFONO MALABRICO	und	10.00	1.473.91	14.739.10							10.00	100.00%
64.05.26	INSTALACION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO ESPECIALIZADO	gb	1.00	125.043.02	125.043.02							1.00	100.00%
64.05.27	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gb	1.00	131.243.69	131.243.69							1.00	100.00%
64.05.28	SISTEMA DE LLAMADO DE EMERGENCIAS	und	1.00	131.243.69	131.243.69							1.00	100.00%
64.05.29	MODULO DE ESTACION LLAMADO ENFERMERA 'CENTRAL'	und	1.00	27.617.64	27.617.64							1.00	100.00%



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863



**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**

Periodo del 18 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".  
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO

31/09/2015  
 SL: 217.226.482.38

**INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**  
**30-Jun-21**

OBRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CONTRATISTA  
 MONTO CONTRATADO  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA POLINOMICA No. 06  
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UND	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
04.07.02	ESTACION DE PRESENCIA DE ENFERMERA HABITACIONES	und	108.00	384.63	42.633.28								
04.07.03	PULSADOR MANUAL DE DADO	und	84.00	103.21	8.659.64								
04.07.04	PULSADOR MANUAL DE DUCHA	und	84.00	308.42	25.697.28								
04.07.05	PULSADOR DE LAMADRO DE EMERGENCIA	und	108.00	308.42	33.309.36								
04.07.06	PULSADOR DE PIE PARA LAMADRO DE QUIROFANOS	und	4.00	924.04	3.696.16								
04.07.07	LAMPARA DE SEÑALIZACION DE INSTALACION	und	101.00	177.00	17.877.00								
04.07.08	MODULO CANCELADOR DE LLAMADA ENFERMERA	und	108.00	328.94	35.625.52								
04.07.09	SERVIDOR PARA GESTION LLAMADA ENFERMERA	glo	1.00	24.625.33	24.625.33								
04.07.10	INSTALACION DE EQUIPO PARA SISTEMA LLAMADA DE ENFERMERA	glo	1.00	134.650.65	134.650.65								
04.07.11	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	glo	1.00	79.930.97	79.930.97	0.07	9.439.55		9.439.55	0.07	7.00%	9.439.55	125.411.11
04.07.12	SISTEMA DE MONITOR AMBIENTAL Y PERIFONEO	und	1.00	5.433.01	5.433.01								
04.07.13	CENTRAL DE CONTROL	und	1.00	622.12	13.954.52								
04.07.14	CONTROL DE FONIDO	und	21.00	822.12	17.264.52								
04.07.15	AMPLIFICADOR DE SISTEMA DE AUDIO	und	5.00	24.616.45	123.097.25								
04.07.16	AMPLIFICADOR DE AUDIO	und	198.00	117.85	23.334.30								
04.07.17	ALTAZONES DE AUDIOTONO	und	4.00	507.74	2.030.96								
04.07.18	ALTAZONES DE AUDIO	und	21.00	610.34	12.817.14								
04.07.19	ALTAZONES DE AUDIO	und	21.00	617.63	12.975.48								
04.07.20	CABLE DE VOLUEN	m	3.080.00	2.77	8.531.60	3.080.00	8.531.60			3.080.00	100.00%	8.531.60	16.411.21
04.07.21	GATEWAY DE VOZ	und	1.00	16.411.21	16.411.21	0.28	23.280.55		0.10	8.465.80	0.38	37.50%	31.746.75
04.07.22	INSTALACION DE EQUIPAMIENTO SISTEMA SONIDO AMBIENTAL Y PERIFONEO	glo	1.00	84.655.00	84.655.00								
04.07.23	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	glo	1.00	85.840.00	85.840.00								
04.07.24	SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS	und	1.00	1.591.11	1.591.11								
04.07.25	RELOJ PATRON	und	248.00	348.45	86.633.60								
04.07.26	RELOJES SECUNDARIOS DE UHA ESFERA	und	1.00	844.96	844.96								
04.07.27	RELOJES CROMOMETROS	und	4.00	871.44	3.485.76								
04.07.28	DISPOSITIVOS BIOMETRICOS DE CONTROL DE ASISTENCIA	und	1.00	31.761.08	31.761.08								
04.07.29	INSTALACION DE EQUIP. SISTEMA DE RELOJES SINCRONIZADOS	glo	1.00	37.638.54	37.638.54								
04.07.30	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	glo	1.00	37.638.54	37.638.54								
04.10	SISTEMA DE TELEVISION	und	117.00	718.83	84.103.11								
04.10.01	MONITOR LED 32" SMART TV PARED	und	62.00	18.633	1.159.96								
04.10.02	MONITOR LED 32" SMART TV TECHO	und	2.00	118.63	237.26								
04.10.03	MONITOR LED 47" FULL HD	und	1.00	2.242.63	2.242.63								
04.10.04	TELEVISOR LED SMART TV DE 20" APPROX INCL. RACK	und	10.00	1.059.31	10.593.10								
04.10.05	TELEVISOR LED SMART TV DE 32" APPROX INCL. RACK	und	10.00	1.698.91	16.989.10								
04.10.06	TELEVISOR LED SMART TV DE 42" APPROX INCL. RACK	und	10.00	3.025.91	30.259.10								
04.10.07	TELEVISOR LED SMART TV DE 59" APPROX INCL. RACK	und	2.00	3.724.00	7.248.00								
04.10.08	REPRODUCTOR DE VIDEO	und	1.00	308.42	308.42								
04.10.09	AMPLIFICADOR CATV DE RF TIPO MDU	und	1.00	1.539.66	1.539.66	1.00	1.539.66			1.00	100.00%	1.539.66	308.42
04.10.10	TRANSMISOR DE VIDEO 1550nm	und	1.00	17.639.63	17.639.63								
04.10.11	AMPLIFICADOR OPTICO 1550nm	und	1.00	30.781.52	30.781.52								
04.10.12	ONT DE 4 PUERTOS 2 GE PSE CON PUERTO RF TIPO F	und	58.00	1.371.77	79.562.63	58.00	79.562.63			58.00	100.00%	79.562.63	164.098.61
04.10.13	ONT DE 1 PUERTO 2 GE PSE CON PUERTO RF TIPO F	und	477.00	846.48	403.770.96	283.14	233.672.35			283.14	59.35%	233.672.35	32.416.85
04.10.14	ONT DE 1 PUERTO 2 GE PSE CON PUERTO RF TIPO F	und	131.00	277.65	36.375.65	4.25	1.178.79			4.25	3.51%	1.178.79	1.920.28
04.10.15	UPB 2-0-500 VA	und	615.00	312.24	192.027.60	608.85	180.107.32		0.05	15.350.22	0.05	5.00%	291.654.11
04.10.16	INSTALACION SISTEMA DE TELEVISION	glo	1.00	315.775.68	315.775.68								
04.10.17	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	glo	1.00	315.775.68	315.775.68								
04.11	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	und	2.00	52.127.96	104.255.92	2.00	104.255.92			2.00	100.00%	104.255.92	315.775.68
04.11.01	NVR	und	2.00	6.645.78	13.291.56	2.00	13.291.56			2.00	100.00%	13.291.56	315.775.68
04.11.02	ESTACION DE MONITOREO	und	5.00	1.519.49	7.597.45	3.00	4.558.47			3.00	60.00%	4.558.47	315.775.68
04.11.03	CAMARA IP MOVIL DOBRO PARA EXTERIORES	und	16.00	2.889.09	33.425.44	16.00	33.425.44			16.00	100.00%	33.425.44	315.775.68
04.11.04	CAMARA IP FUA PARA EXTERIORES	und											



**SORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
 S. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**  
Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA".  
IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONSORCIO SALUD LORETO  
SI: 217.226.482.36  
31/08/2015

**INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**  
30-Jun-21

OBRA  
UBICACION  
ENTIDAD  
CONTRATISTA  
MONTO CONTRATADO  
FECHA DE PRESUPUESTO  
FORMULA POLITOMICA No. 06  
FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.11.01	CAMARA IP PLUS PARA INTERORES	und	72.00	655.11	47,887.92	64.00	42,597.04			64.00	42,597.04	8.00	42,597.04
05.11.04	CAMARA IP CONVENCIONAL	und	46.00	750.59	34,525.26	46.00	34,525.26			46.00	34,525.26	6.00	34,525.26
05.11.07	CAMARA IP CONVENCIONAL EXTERNA DOHO	und	6.00	3,937.70	23,926.20	6.00	23,926.20			6.00	23,926.20	8.00	23,926.20
05.11.08	MONITOR LED HD DE 42"	und	8.00	6,185.21	49,481.63							8.00	49,481.63
05.11.09	SOFTWARE Y LICENCIAS	und	146.00	255.66	37,786.36							146.00	37,786.36
05.11.10	INSTALACION SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	und	1.00	102,315.54	102,315.54							1.00	102,315.54
05.11.11	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	pb	1.00	142,072.43	142,072.43							1.00	142,072.43
05.12.01	PULSADOR DE SALIDA	und	11.00	837.82	10,268.02							11.00	10,268.02
05.12.02	CONTACTO ELECTROMAGNETICO	und	1.00	1,328.94	14,618.34							1.00	14,618.34
05.12.03	PANEL DE CONTROL	und	1.00	20,652.69	206,526.89							1.00	206,526.89
05.12.04	INTERFACE DE PUERTAS Y LECTORAS DE TARJETAS	und	11.00	3,172.37	34,896.07							11.00	34,896.07
05.12.05	LECTOR DE TARJETAS	und	11.00	8,672.63	75,973.37							11.00	75,973.37
05.12.06	TABLETEO DE ENERGIA	und	1.00	5,216.43	46,948.23							1.00	46,948.23
05.12.07	INSTALACION SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	pb	1.00	37,617.11	376,171.11							1.00	376,171.11
05.12.08	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	pb	1.00	38,631.69	386,316.90							1.00	386,316.90
05.13.01	TELEFONO PARA TELECONFERENCIA	und	1.00	2,911.63	29,116.33							1.00	29,116.33
05.13.02	EQUIPO DE VIDEO CONFERENCIA	und	1.00	87,353.03	873,530.33							1.00	873,530.33
05.13.03	MONITOR LED HD 42"	und	1.00	2,242.63	22,426.33							1.00	22,426.33
05.13.04	INSTALACION SISTEMA DE TELEPRESENCIA	pb	1.00	32,672.11	326,721.11							1.00	326,721.11
05.13.05	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	pb	1.00	33,625.61	336,256.61							1.00	336,256.61
05.14.01	SISTEMA DE COMUNICACION POR RADIO VHF/E	und	2.00	5,542.32	11,084.64							2.00	11,084.64
05.14.02	ANTENA VHF	und	1.00	1,351.31	13,513.11							1.00	13,513.11
05.14.03	TORRE VENTADA DE JOMTS	und	1.00	3,368.34	33,683.34							1.00	33,683.34
05.14.04	ESTACION DE RADIO HF	und	1.00	2,741.91	27,419.91							1.00	27,419.91
05.14.05	ANTENA HF	und	1.00	1,021.13	10,211.33							1.00	10,211.33
05.14.06	TORRE VENTADA DE JOMTS	und	1.00	3,368.34	33,683.34							1.00	33,683.34
05.14.07	RADIOS POR TALETES	und	20.00	2,235.78	44,715.58							20.00	44,715.58
05.14.08	INSTALACION SISTEMA DE COMUNICACION POR RADIO VHF/HF	pb	1.00	23,979.80	239,798.80							1.00	239,798.80
05.14.09	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	pb	1.00	33,297.79	332,977.79							1.00	332,977.79
05.15.01	PANEL DE ALARMAS CONTRA INCENDIO	und	1.00	3,652.59	36,525.89							1.00	36,525.89
05.15.02	DETECTOR DE HUMO	und	895.00	198.59	169,146.05	895.00	169,146.05			895.00	100.00%	169,146.05	
05.15.03	DETECTOR DE TEMPERATURA	und	38.00	155.20	7,075.60	38.00	7,075.60			38.00	100.00%	7,075.60	
05.15.04	DETECTOR DE LLAMA	und	1.00	815.13	8,151.33							1.00	8,151.33
05.15.05	SENSOR DE ANIEGO	und	52.00	1,392.55	72,433.40	52.00	72,433.40			52.00	100.00%	72,433.40	
05.15.06	ESTACION MANUAL DE ACTIVACION DE ALARMA	und	38.00	318.89	12,116.69	38.00	12,116.69			38.00	100.00%	12,116.69	
05.15.07	PARLANTE CON SIRENA ESTROBO/COPIA	und	39.00	253.78	10,131.42	39.00	10,131.42			39.00	100.00%	10,131.42	
05.15.08	MODULOS TELEFONOS DE EMBOROS DIGITALES INTELIGENTES	und	1.00	33,164.78	33,164.78	1.00	33,164.78			1.00	100.00%	33,164.78	
05.15.09	MODULO DE PRESERVACION DE ESCALERAS	und	14.00	296.81	4,155.34							14.00	4,155.34
05.15.10	MODULO DE CONTROL DE RELAY PARA CONTROL Y DERACTIVACION DE ASCENSOS	und	11.00	296.81	3,264.91	11.00	3,264.91			11.00	100.00%	3,264.91	
05.15.11	MODULOS ABLADORES DIGITALES INTELIGENTES	und	14.00	155.74	2,600.36	14.00	2,600.36			14.00	100.00%	2,600.36	
05.15.12	MODULO PARA MONITOREO DE VALVULAS Y FLUJO DE AGUA	und	17.00	370.65	6,304.45	17.00	6,304.45			17.00	100.00%	6,304.45	
05.15.13	EXTINTOR CON AGENTE LIMPIO EN CUARTO DE TELECOMUNICACIONES	und	1.00	679.82	6,798.22	1.00	6,798.22			1.00	100.00%	6,798.22	
05.15.14	SISTEMA AUTOMATICO DE EXTINCION POR AGENTE LIMPIO EN DATA CENTER	und	1.00	123,235.64	1,232,356.44	1.00	1,232,356.44			1.00	100.00%	1,232,356.44	
05.15.15	DETECTOR DE HUMO PARA TECHO	und	223.00	168.69	37,617.11	223.00	37,617.11			223.00	100.00%	37,617.11	
05.15.16	DETECTOR OPTICO TERMICO	und	4.00	383.42	1,593.68	4.00	1,593.68			4.00	100.00%	1,593.68	
05.15.17	ROCEADOR	und	6.00	370.65	2,225.10	6.00	2,225.10			6.00	100.00%	2,225.10	
05.15.18	TELEFONO LLAMADA DE BOMBIEROS	und	24.00	609.50	14,604.00	24.00	14,604.00			24.00	100.00%	14,604.00	
05.15.19	PULSADOR MANUAL DE EMERGENCIA	und	38.00	296.81	11,278.78	38.00	11,278.78			38.00	100.00%	11,278.78	



**CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
ING. SATURNINO RAUL MELGAR PANTAN  
JEFE DE SUPERVISION  
CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA".  
 QUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 SI: 2117226-482.38  
 3108/2015

**INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**  
 30-Jun-21

OBRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CONTRAHELISTA  
 MONTO CONTRATADO  
 FORMA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA POLINOMICA No. 06  
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNO	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.12.00	CAMPANA	und	1.00	152.73	152.73							1.00	152.73
05.12.01	PANEL CONTROL EXTINCION	und	1.00	9.626.81	9.626.81							1.00	9,626.81
05.12.02	INSTALACION SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS	gp	1.00	27,350.42	27,350.42							1.00	27,350.42
05.12.03	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gp	1.00	28,131.19	28,131.19			0.50	13,675.21	0.50	13,675.21	50.00%	13,675.21
05.16	SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO	gp	1.00	28,131.19	28,131.19							1.00	28,131.19
05.16.01	CHASIS DE SERVIDOR TIPO BLADE	und	2.00	17,374.81	34,749.62							2.00	34,749.62
05.16.02	ERVIDOR TIPO BLADE	und	7.00	17,421.04	121,947.28							7.00	121,947.28
05.16.03	SWITCH DE DISTRIBUCION PARA ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES	und	2.00	55,127.29	110,254.58							2.00	110,254.58
05.16.04	LOCACION DE GESTION Y ANALISIS DE TRAFICO	und	1.00	9,552.52	9,552.52							1.00	9,552.52
05.16.05	INSTALACION SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO	gp	1.00	90,893.39	90,893.39							1.00	90,893.39
05.16.06	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gp	1.00	93,450.35	93,450.35							1.00	93,450.35
05.17	LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO	gp	1.00	60,956.91	60,956.91							1.00	60,956.91
05.17.01	LICENCIAMIENTO USER'S CALS MACRO OF WINDOW'S SERVER 2016 CON SOPORTE	gp	1.00	110,132.91	110,132.91							1.00	110,132.91
05.17.02	LICENCIAMIENTO WINDOWS SERVER 2016 CON SOPORTE 3 AÑOS	gp	1.00	6,912.20	6,912.20							1.00	6,912.20
05.17.03	LICENCIAMIENTO SQL SERVER 2016 CON SOPORTE 3 AÑOS	gp	1.00	129,203.51	129,203.51							1.00	129,203.51
05.17.04	LICENCIAMIENTO VMWARE CON SOPORTE 3 AÑOS	gp	1.00	62,857.37	62,857.37							1.00	62,857.37
05.17.05	INSTALACION LICENCIAMIENTO PARA SISTEMA DE PROCESAMIENTO CENTRALIZADO	gp	1.00	174,031.76	174,031.76			2.00	174,031.76	2.00	174,031.76	100.00%	174,031.76
05.18	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO	und	2.00	87,015.88	174,031.76							2.00	174,031.76
05.18.01	ALMACENAMIENTO DE INFORMACION SAN	und	1.00	34,242.87	34,242.87							1.00	34,242.87
05.18.02	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	und	1.00	132,144.70	132,144.70							1.00	132,144.70
05.18.03	INSTALACION SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO	gp	1.00	183,023.19	183,023.19							1.00	183,023.19
05.18.04	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gp	1.00	183,023.19	183,023.19							1.00	183,023.19
05.19	CONEXIVIDAD INFORMATICA FISICA E INALAMBICA	und	2.00	250,885.17	500,970.34							2.00	500,970.34
05.19.01	SWITCH PRINCIPAL (CORE)	und	1.00	38,229.05	38,229.05			0.59	37,846.76	0.59	37,846.76	0.01	38,229.05
05.19.02	OLT (TERMINAL OPTICO DE LINEA)	und	2.00	5,529.51	11,059.02							2.00	11,059.02
05.19.03	CUADRO DE FUERZA DC CON BANCO DE BATERIAS PARA CHASIS OLT	und	1.00	15,924.20	15,924.20							1.00	15,924.20
05.19.04	SOFTWARE GESTOR SISTEMA GPON	und	1.00	2,689.09	2,689.09							1.00	2,689.09
05.19.05	SERVIDOR GESTOR SISTEMA GPON	und	1.00	8,369.76	8,369.76			48.00	8,369.76	48.00	8,369.76	2.00	8,369.76
05.19.06	TRANSCEIVER OPTICO SFP GPON	und	30.00	174.37	5,231.10							30.00	5,231.10
05.19.07	WDM FILTRO MODULAR	und	50.00	1,122.18	56,109.00							50.00	56,109.00
05.19.08	CHASIS PARA WDM FILTRO MODULAR	und	2.00	505.11	1,010.22							2.00	1,010.22
05.19.09	SPLITTER OPTICO 1:32 MODULAR 1P	und	25.00	6,332.55	158,313.75							25.00	158,313.75
05.19.10	BANDEJA DE DISTRIBUCION INTERNA OPTICA	und	40.00	985.05	39,402.00							40.00	39,402.00
05.19.11	SPLITTER OPTICO 1:4	und	7.00	1,422.33	9,956.31							7.00	9,956.31
05.19.12	CHASIS PARA SPLITTER OPTICO 1:4	und	1.00	506.11	506.11							1.00	506.11
05.19.13	CAJA DE DISTRIBUCION OPTICA INTERNA (CDOI)	und	73.00	87.49	6,389.77							73.00	6,389.77
05.19.14	ROSETA OPTICA	und	612.00	57.44	35,153.28							612.00	35,153.28
05.19.15	ACCESS POINT	und	31.00	1,305.60	40,473.60			605.88	34,801.75	605.88	34,801.75	6.12	35,153.28
05.19.16	PORTAL	und	2.00	65,974.59	131,949.18							2.00	131,949.18
05.19.17	CONTROL DE ACCESO INALAMBICO	und	1.00	49,439.23	49,439.23							1.00	49,439.23
05.19.18	INSTALACION CONEXIVIDAD INFORMATICA FISICA E INALAMBICA	gp	1.00	392,093.54	392,093.54							1.00	392,093.54
05.19.19	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gp	1.00	224,771.12	224,771.12							1.00	224,771.12
05.20	SISTEMA DE MANTENIMIENTO LABORIO ENERGETICO	und	1.00	14,616.77	14,616.77							1.00	14,616.77
05.20.01	SERVIDORE	und	1.00	17,052.60	17,052.60							1.00	17,052.60
05.20.02	SUPERVISOR	und	2.00	54,235.48	108,470.96							2.00	108,470.96
05.20.03	CONTROLADOR	und	63.00	2,959.13	186,468.19							63.00	186,468.19
05.20.04	SERVIDORES	und	20.00	8,173.81	163,476.20							20.00	163,476.20
05.20.05	INSTALACION SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y AUDITO ENERGETICO	gp	1.00	171,082.59	171,082.59							1.00	171,082.59
05.20.07	GARANTIA Y SOPORTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gp	1.00	102,312.78	102,312.78							1.00	102,312.78
05.21.01	EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PACS-RIS	und	1.00	453,051.09	453,051.09			0.80	374,440.87	0.80	374,440.87	0.20	453,051.09



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 .- INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-Z CESAR GARAYAR GARCIA".  
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 SI. 217.226.482.36

31/08/2015  
**INSTALACIONES DE COMUNICACIONES**  
 30-Jun-21

OBRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CONTRATISTA  
 MONTO CONTRATADO  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA POLINOMICA No. 06  
 FECHA DE CORTE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID.	CANTIDAD	P.U.	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	MONTO
05.2.1.02	EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PARA EL HIS	usd	1.00	307,592.60	307,592.60	1.00	307,592.60			1.00	100.00%	1.00	100.00%
05.2.1.01	INSTALACION SISTEMA DE HIS-RKSPACS	gp	1.00	109,003.65	109,003.65							1.00	100.00%
05.2.1.04	GARANTIA Y EQUIPOTE DE LA SOLUCION Y SUS COMPONENTES POR 3 AÑOS	gp	1.00	102,312.78	102,312.78							1.00	100.00%
01.22	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE COLAS	usd	1.00	108,081.37	108,081.37							1.00	100.00%
05.2.2.01	SUMINISTRO DE TOTEM'S PARA MANEJO DE COLAS CON GARANTIA DE 3 AÑOS	gp	1.00	35,234.95	35,234.95							1.00	100.00%
05.2.2.02	INSTALACION SISTEMA DE COLAS												
	<b>COSTO DIRECTO</b>				12,666,395.12		3,574,151.14		86,339.18		3,640,490.32		9,027,896.83
	GASTOS GENERALES				14.89%		532,211.55		9,876.28		642,069.84		1,344,305.80
	UTILIDAD				3.00%		107,224.53		1,590.18		109,214.71		270,836.97
	<b>SUB-TOTAL</b>						4,213,587.23		78,207.64		4,291,794.87		10,643,041.59
	I.G.V.				18.00%		758,415.70		14,077.33		772,523.08		1,915,747.49
	<b>TOTAL</b>						4,972,032.93		92,285.01		5,864,317.85		12,558,789.08



**CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
 H.G. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

 <b>CONSORCIO SALUD LORETO</b>	Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	<b>VALORIZACION No40 JUNIO 2021</b>
		Revisión:

## **VALORIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO**

460

**VALORIZACIÓN N° 40 : EQUIPAMIENTO**

Período del 16 Ene al 30-Jun-21

\*MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIZ CESAR GARAYAR GARCIA.\*  
 IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 SI. 217.226.482.30  
 310692015  
**EQUIPAMIENTO**  
 80-Jun-21

OBRA  
 UBICACION  
 ENTIDAD  
 CONTRATISTA  
 MONTO CONTRATADO  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA ECONOMICA No. 06  
 FECHA DE CORTE

CÓDIGO drive	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO UND CANTIDAD	P.U.	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
				MONTO	METRADO %	MONTO	METRADO %	MONTO	METRADO %	MONTO	METRADO %	MONTO	METRADO %
97	<b>EQUIPAMIENTO</b>												
97.01	<b>EQUIPO BIOMEDICO</b>												
CH-17a	Cerraja de monitor con 12 monitores, de funciones, válida para 7 parámetros (D-3)	und	1,00	779.655,93	0,95	748.873,14	0,95	45.000,00	0,00	748.873,14	0,95	50,000,00	38.632,80
CH-17b	Cerraja de monitor con 6 monitores escalables de funciones y válida de 8 parámetros (D-3)	und	1,00	516.485,18	0,92	491.546,42	0,92	24.938,76	0,00	491.546,42	0,92	24.938,76	19.291,20
CH-18	Cerraja de monitor con 6 monitores escalables de funciones y válida de 8 parámetros (D-3)	und	1,00	516.485,18	1,00	516.485,18	1,00	516.485,18	1,00	516.485,18	1,00	0,000,00	0,000,00
CH-19	Cerraja de monitor con 20 monitores de funciones y válida de 8 parámetros (D-5)	und	1,00	474.818,27	0,95	459.847,45	0,95	14.970,82	0,00	459.847,45	0,95	14.970,82	23.728,81
CH-7	Cerraja de monitor con 7 monitores de funciones y válida de 8 parámetros (D-5)	und	2,00	523.433,23	1,90	1.050.847,46	1,90	523.433,23	0,00	523.433,23	1,90	500,000,00	52.443,37
D-100	Ecógrafo Doppler color 4D	und	1,00	1.715.452,44	0,95	1.621.027,54	0,95	94.424,90	0,00	1.621.027,54	0,95	94.424,90	6.211,19
D-101	Ecógrafo ultrasonido	und	1,00	433.020,85	0,95	413.959,61	0,95	19.061,24	0,00	413.959,61	0,95	19.061,24	13.559,32
D-103	Ecógrafo portatil	und	5,00	61.016,55	3,60	305.084,75	3,60	30.508,75	0,00	305.084,75	3,60	30,000,00	433.068,63
D-104	Bomba de infusion de 1 canal escalable	und	4,00	10.163,49	3,60	36.597,97	3,60	3.600,00	0,00	36.597,97	3,60	3,000,00	305.047,75
D-105	Bomba de infusion de 2 canales escalable	und	16,00	13.933,05	15,20	212.723,81	15,20	212.543,37	0,16	212.543,37	15,20	500,000,00	203,90
D-106	Bomba de infusion de 3 canales escalable	und	4,00	8.644,07	3,60	31.576,27	3,60	3.000,00	0,00	31.576,27	3,60	3,000,00	11.166,44
D-107	Bomba de infusion central	und	7,00	9.322,03	6,30	58.259,24	6,30	6,300,00	0,00	58.259,24	6,30	6,000,00	1.729,81
D-109	Coche de para respirador	und	14,00	94.217,29	13,30	125.397,03	13,30	71.353,53	0,00	125.397,03	13,30	54.043,50	65.293,54
D-110	Pompa de paracion respirador	und	2,00	116.975,00	2,00	232.950,00	2,00	232.950,00	2,00	232.950,00	2,00	0,000,00	232.950,00
D-111	Boquilla para nebulizacion oral	und	10,00	19.875,00	4,75	95.375,00	4,75	95,375,00	0,25	95.375,00	4,75	1,000,00	21.750,00
D-112	Boquilla de inhalacion nasal	und	7,00	31.020,35	6,30	207.551,61	6,30	207,551,61	0,40	207.551,61	6,30	4,000,00	4.308,85
D-113	Nebulizador nebulizador	und	6,00	158.305,05	5,70	168.339,83	5,70	168,339,83	0,30	168.339,83	5,70	500,000,00	9.155,55
D-114	Botella de oxigeno 10 litros	und	4,00	132.203,39	5,00	669.013,56	5,00	669,013,56	0,00	669.013,56	5,00	500,000,00	169.151,56
D-115	Respirador manual adulto para uso	und	5,00	89.516,55	4,75	427.544,75	4,75	427,544,75	0,25	427.544,75	4,75	500,000,00	40.442,37
D-116	Máquina de anestesia con ventilador asociado	und	3,00	293.949,15	2,85	840.847,46	2,85	840,847,46	0,15	840.847,46	2,85	500,000,00	40.442,37
D-118	Ventilador mecánico adulto - pediatra - neonatal	und	4,00	132.533,22	3,60	543.377,63	3,60	543,377,63	0,40	543.377,63	3,60	500,000,00	4.000,00
D-119	Ventilador de neonatos	und	6,00	73.644,07	6,00	441.834,41	6,00	441,834,41	0,00	441.834,41	6,00	500,000,00	441.834,41
D-12	Monitor de funciones vitales de transporte	und	9,00	29.691,02	9,00	269.949,15	9,00	269,949,15	0,00	269.949,15	9,00	100,000,00	169.999,15
D-129	Ventilador mecánico adulto pediátrico	und	17,00	120.339,89	16,05	2.045.782,71	16,05	2.045,782,71	0,95	2.045.782,71	16,05	100,000,00	2.045.782,71
D-121	Ventilador mecánico neonatal	und	8,00	150.847,45	7,70	1.209.779,63	7,70	1.209,779,63	0,30	1.209.779,63	7,70	100,000,00	1.209.779,63
D-133	Toruero para succion sónico	und	28,00	44.027	24,70	1.053.477	24,70	1.053,477	3,30	1.053.477	24,70	500,000,00	97.290
D-134	Monitor de nivel de oxígeno	und	3,00	41.101,63	2,85	123.303,08	2,85	123,303,08	0,15	123.303,08	2,85	500,000,00	6.162,55
D-135	Monitor de gases sanguíneos	und	5,00	77.825,10	4,75	376.339,38	4,75	376,339,38	0,25	376.339,38	4,75	500,000,00	6.162,55
D-14	Módulo de monitoreo de gases sanguíneos	und	1,00	493.203,35	0,95	488.659,33	0,95	488,659,33	0,05	488.659,33	0,95	500,000,00	44.214,24
D-146	Módulo de monitoreo de gases sanguíneos	und	2,00	429.238	1,90	8.074,58	1,90	8.074,58	0,10	8.074,58	1,90	500,000,00	677,67
D-165	Brecha de oxigenación satélite	und	2,00	3.638,73	1,90	6.060,65	1,90	6.060,65	0,10	6.060,65	1,90	500,000,00	433,73
D-166	Brecha de oxigenación pediátrica	und	1,00	3.638,73	0,95	3.638,73	0,95	3.638,73	0,05	3.638,73	0,95	500,000,00	3.638,73
D-17	Pulso oxímetro	und	12,00	3.741,35	11,40	43.107,48	11,40	43.107,48	0,60	43.107,48	11,40	500,000,00	2.638,81
D-178	Turquía de compresión caliente	und	1,00	9.322,03	0,95	9.322,03	0,95	9.322,03	0,05	9.322,03	0,95	500,000,00	469,10
D-180	Turquía de compresión fría	und	1,00	20.223,64	0,95	20.223,64	0,95	20.223,64	0,05	20.223,64	0,95	500,000,00	10.146,64
D-20	Equipo de rayos x - electrónico digital	und	1,00	1.016.949,15	1,016.949,15	1.016.949,15	1,016.949,15	0,00	1.016.949,15	1,016.949,15	1,016.949,15	0,000,00	1.016.949,15
D-21	Equipo de rayos x portátil reciente digital	und	1,00	49.691,02	49.691,02	49.691,02	49.691,02	0,00	49.691,02	49.691,02	49.691,02	0,000,00	49.691,02
D-212	Estimulador con generador eléctrico de vapor de 20 litros	und	1,00	18.755,93	18.755,93	18.755,93	18.755,93	0,00	18.755,93	18.755,93	18.755,93	0,000,00	18.755,93
D-213	Estimulador con generador eléctrico de vapor de 30 lt	und	1,00	25.433,73	25.433,73	25.433,73	25.433,73	0,00	25.433,73	25.433,73	25.433,73	0,000,00	25.433,73
D-214	Estimulador con generador eléctrico de vapor de 40 lt	und	1,00	29.691,02	29.691,02	29.691,02	29.691,02	0,00	29.691,02	29.691,02	29.691,02	0,000,00	29.691,02
D-219	Estimulador con generador eléctrico de vapor de 150/200 lt con doble punta	und	2,00	29.691,02	29.691,02	29.691,02	29.691,02	0,00	29.691,02	29.691,02	29.691,02	0,000,00	29.691,02
D-216	Equipo de rayos x de 30 lt	und	1,00	2.985,10	2.985,10	2.985,10	2.985,10	0,00	2.985,10	2.985,10	2.985,10	0,000,00	2.985,10
D-217	Equipo de rayos x de 40 lt	und	1,00	4.370,80	4.370,80	4.370,80	4.370,80	0,00	4.370,80	4.370,80	4.370,80	0,000,00	4.370,80
D-218	Equipo de rayos x de 50 lt	und	1,00	432.203,35	432.203,35	432.203,35	432.203,35	0,00	432.203,35	432.203,35	432.203,35	0,000,00	432.203,35
D-219	Equipo de rayos x de 60 lt	und	1,00	186.644,07	186.644,07	186.644,07	186.644,07	0,00	186.644,07	186.644,07	186.644,07	0,000,00	186.644,07
D-223	Turquía de hidroterapia para miembros inferiores	und	2,00	21.610,17	21.610,17	21.610,17	21.610,17	0,00	21.610,17	21.610,17	21.610,17	0,000,00	21.610,17
D-240	Turquía de hidroterapia para miembros superiores	und	1,00	21.610,17	21.610,17	21.610,17	21.610,17	0,00	21.610,17	21.610,17	21.610,17	0,000,00	21.610,17
D-24	Equipo de rayos x reciente digital	und	2,00	833.539,22	1.671.169,44	1.671.169,44	1.671.169,44	0,00	1.671.169,44	1.671.169,44	1.671.169,44	0,000,00	1.671.169,44
D-242	Ayudador orbital	und	1,00	6.095,24	6.095,24	6.095,24	6.095,24	0,00	6.095,24	6.095,24	6.095,24	0,000,00	6.095,24
D-243	Ayudador suborbitario para merchidología	und	1,00	77.969,10	77.969,10	77.969,10	77.969,10	0,00	77.969,10	77.969,10	77.969,10	0,000,00	77.969,10
D-244	Anulador boquimodo suborbitario	und	1,00	38.693,05	38.693,05	38.693,05	38.693,05	0,00	38.693,05	38.693,05	38.693,05	0,000,00	38.693,05
D-245	Anulador de sibilancias y gases en sangre portatil	und	6,00	33.698,31	203.399,83	203.399,83	203.399,83	0,00	203.399,83	203.399,83	203.399,83	0,000,00	203.399,83



**CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
 INGENIERO CIVIL  
 ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : EQUIPAMIENTO**  
 Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I+2 CESAR GARAYAR GARCÍA".  
 UBICACIÓN: IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL LORETO  
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO  
 MONTO CONTRATADO: S/ 217.226.482,36  
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015  
 FÓRMULA POLINÓMICA N.º 06

**EQUIPAMIENTO**  
 30-Jun-21

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	M E T R A D O		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UND	CANTIDAD	PUL	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%
D-247	Analizador de electrolitos y glicemia en la sangre	1.00	1.00	25693.05	18.983.05									
D-248	Bún de Maria de 10 a 15 litros	8.00	8.00	2.963.10	23.729.81	7.60	22.542.37	7.60	22.542.37	7.60	22.542.37	0.40	1.854.44	5.00%
D-249	Bún de Maria de 20 a 25 litros	3.00	3.00	4.237.29	12.711.85	2.85	12.076.27	2.85	12.076.27	2.85	12.076.27	0.15	633.58	5.00%
D-244	Equipo de tarjos x recible digital Arco en C	1.00	1.00	1.144.067.60	1.144.067.60	2.85	84.533.90	2.85	84.533.90	2.85	84.533.90	0.15	1,144,067.60	100.00%
D-250	Chubra de flujo laminar horizontal	3.00	3.00	29.691.02	88.693.05	0.95	19.774.58	0.95	19.774.58	0.95	19,774.58	0.05	4,489.15	5.00%
D-251	Cáscara metálica	1.00	1.00	20.762.71	20.762.71	3.60	12.237.29	3.60	12.237.29	3.60	12,237.29	0.20	844.07	5.00%
D-253	Maneja de digital	4.00	4.00	3.220.34	12.881.36	0.95	8.474.58	0.95	8.474.58	0.95	8.474.58	0.05	4,172.73	5.00%
D-252	Reactor siéologo	1.00	1.00	5.304.75	53.047.75									
D-253	Anal. del. biomédico automático de 03 tiempos	1.00	1.00	12.902.54	12.902.54	9.50	152.161.02	9.50	152,161.02	9.50	152,161.02	0.50	8,005.47	5.00%
D-257	Controlador Automático de flujo sanguíneo	10.00	10.00	16.098.95	160.989.95									
D-243	Cuadro para 24 tubos	4.00	4.00	14.692.51	58.770.04	4.75	30.190.68	4.75	30,190.68	4.75	30,190.68	0.25	1,255.38	5.00%
D-27	Equipo de laborator	1.00	1.00	61.016.55	61.016.55									
D-270	Congelador subenfriado	1.00	1.00	38.135.59	38.135.59									
D-270a	Congelador portátil	1.00	1.00	28.813.55	28.813.55									
D-273	Reactor de líquidos	1.00	1.00	35.227.18	35.227.18	0.95	31.463.82	0.95	31,463.82	0.95	31,463.82	0.05	1,761.36	5.00%
D-275	Micrómetro por radiación	1.00	1.00	82.203.39	82.203.39									
D-275a	Micrómetro por suspensión	1.00	1.00	21.875.65	21.875.65	2.00	51.254.42	2.00	51,254.42	2.00	51,254.42	1.00	82,203.39	100.00%
D-276	Procesador automático de líquidos	2.00	2.00	23.647.71	47.295.42									
D-277	Secadora de lámina de muestra de líquido	1.00	1.00	146.093.75	146.093.75	0.95	58.890.68	0.95	58,890.68	0.95	58,890.68	0.05	3,045.64	5.00%
D-278	Sistema de inyección intravenosa	1.00	1.00	7.697.12	7.697.12									
D-281	Analizador automático de gases	2.00	2.00	6.798.65	13.597.30									
D-292	Leitor de tarjetas	1.00	1.00	31.916.90	31.916.90									
D-293	Leitor de tarjetas	1.00	1.00	292.504.02	292.504.02									
D-300	Entalizador para eler tipo 50 litros	1.00	1.00	55.024.75	55.024.75									
D-303	Fotocopiador	1.00	1.00	110.189.49	110.189.49									
D-31	Lámpara ultravioleta de tipo de intensidad alta	3.00	3.00	226.231.63	678.694.89	3.00	330.506.47	3.00	330,506.47	3.00	330,506.47	1.00	280.500.00	100.00%
D-311	Micropico químico para absorción ultravioleta	15.00	15.00	15.234.24	228.513.55	14.25	217.372.88	14.25	217,372.88	14.25	217,372.88	0.75	2,821.69	5.00%
D-316	Bomba de infusión 3 canales	2.00	2.00	6.788.65	13.577.30									
D-317	Analizador electrónico temporal	1.00	1.00	46.271.19	46.271.19									
D-321a	Faja elástica con mensurador	1.00	1.00	168.941.39	168.941.39									
D-321b	Extensión de Pinza de fuerza	1.00	1.00	18.181.78	18.181.78	0.95	18.222.89	0.95	18,222.89	0.95	18,222.89	0.05	653.09	5.00%
D-324	Cámara subyacente repletable (inc. Automático de dos canales)	4.00	4.00	35.450.09	141.876.37	3.60	13.018.22	3.60	13,018.22	3.60	13,018.22	0.35	7,073.82	5.00%
D-325	Lámpara ultravioleta de tipo simple	1.00	1.00	1.957.63	1.957.63	6.65	13.703.39	6.65	13,703.39	6.65	13,703.39	0.35	653.17	5.00%
D-326	Pulmonograma portátil	1.00	1.00	165.733.85	165.733.85									
D-327	Lámpara ultravioleta de tipo simple	8.00	8.00	2.851.02	22.808.14	7.60	225.427.73	7.60	225,427.73	7.60	225,427.73	0.40	11,894.41	5.00%
D-328	Estilizador con contador electrónico de vapor de 100 litros	1.00	1.00	87.632.37	87.632.37	1.00	31.117.82	1.00	31,117.82	1.00	31,117.82	0.05	260.500.00	100.00%
D-329	Equipo de terapia con onda corta	2.00	2.00	44.097.60	88.195.20									
D-330	Equipo de calor radiante	1.00	1.00	33.249.15	33.249.15									
D-332	Estilizador con generador eléctrico de vapor vertical es 30 litros	2.00	2.00	56.778.65	113.557.30	0.95	31.558.68	0.95	31,558.68	0.95	31,558.68	0.05	260.500.00	100.00%
D-333	Micropico bioscilar con control de fase	1.00	1.00	237.293.14	237.293.14									
D-334	Analizador urindrogico	2.00	2.00	8.050.65	16.101.30	0.95	225.427.73	0.95	225,427.73	0.95	225,427.73	0.05	11,894.41	5.00%
D-335	Equipo de línea de con ultrasonido	1.00	1.00	14.830.51	14.830.51									
D-331	Equipo de imagen térmica	3.00	3.00	3.647.25	10.941.74	3.00	11.051.74	3.00	11,051.74	3.00	11,051.74	0.05	1,365.38	5.00%
D-337	Estimulador eléctrico transcutáneo (TENS)	1.00	1.00	27.707.89	27.707.89	0.95	26.332.23	0.95	26,332.23	0.95	26,332.23	0.05	1,816.57	5.00%
D-336	Chubra de tipo laminar vertical de doble cámara	1.00	1.00	35.331.49	35.331.49	0.95	34.514.68	0.95	34,514.68	0.95	34,514.68	0.05	1,007.29	5.00%
D-338	Equipo de terapia	3.00	3.00	10.017.29	30.051.87									
D-333	Equipo de terapia	3.00	3.00	15.254.26	45.762.71									
D-335	Mirrored table top	2.00	2.00	4.745.76	9.491.53									
D-337	Si. Mader es bacteriostático	1.00	1.00	9.793.87	9.793.87									
D-327	Equipo de ultrasonido de 60 canales multiphas	1.00	1.00	22.681.31	22.681.31	1.00	9.793.87	1.00	9,793.87	1.00	9,793.87	2.00	9,491.53	100.00%



**CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
**ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN**  
**JEFE DE SUPERVISION**  
**GIP N° 41863**

VALORIZACIÓN N° 40 : EQUIPAMIENTO  
 Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL "IZ. CESAR GARAYAR GARCÍA".  
 LOITOS - MAYNAS - LORETO.  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 S/ 211,226,482.36  
 31/08/2015  
**EQUIPAMIENTO**  
 30-Jun-21

UBICA: OBRA  
 ENTIDAD: CONTRATISTA  
 MONTO: CONTRATADO  
 FECHA DE PRESUPUESTO  
 FORMULA POLITOMICA No. 00  
 FECHA DE COYTE

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID	CANTIDAD	PLU	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO
D-3-5	Equipo de Limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	1.00	31,214.40	31,214.40								100.00%	31,214.40
D-3-10	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	1.00	44,691.53	44,691.53								100.00%	44,691.53
D-3-21	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	1.00	9,920.03	9,920.03								100.00%	9,920.03
D-3-24	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	1.00	55,094.75	55,094.75	1.00	55,094.75						100.00%	110,189.51
D-4	Equipos de computadora	und	1.00	17,756.61	17,756.61								100.00%	17,756.61
D-9-1	Metroscopia binocular x 40x (microscopio)	und	1.00	20,329.69	20,329.69	0.95	19,322.03						95.00%	39,658.38
D-9-4	Transmisor de voz con auriculares	und	5.00	12,953.39	64,765.55	5.00	64,765.55						100.00%	127,423.93
D-11	Unidad de control de temperatura	und	2.00	72,418.25	144,836.51								100.00%	289,273.44
D-115	Equipo de radiografía de mamografía	und	1.00	16,407.63	16,407.63	0.95	31,800.65						100.00%	48,208.28
D-118	Adaptador de radiografía de mamografía	und	1.00	34,474.55	34,474.55								100.00%	68,948.10
D-119	Adaptador de radiografía de mamografía	und	1.00	29,351.02	55,722.03	2.00	58,722.03						100.00%	114,444.05
D-12	Monitor de radiografía de mamografía	und	1.00	11,184.44	11,184.44								100.00%	22,368.88
D-123	Monitor de radiografía de mamografía	und	1.00	18,059.65	18,059.65								100.00%	36,119.30
D-15	Computadora de escritorio	und	1.00	249,333.33	249,333.33								100.00%	498,666.66
D-16	Equipos de radiografía	und	1.00	72,033.00	72,033.00								100.00%	144,066.00
D-184	Sistema de radiografía de mamografía (microscopio)	und	1.00	14,450.85	14,450.85								100.00%	28,901.70
D-15	Anticongelador	und	1.00	47,423.57	47,423.57								100.00%	94,847.14
D-15	Dormitorio	und	1.00	3,537.29	3,537.29	0.95	3,360.42						95.00%	6,917.71
D-15	Habitación	und	1.00	60,597.45	60,597.45								100.00%	121,194.90
D-16	Metroscopia binocular x 40x (microscopio)	und	11.00	5,084.75	55,922.20	10.45	53,135.59						95.00%	111,067.79
D-16	Metroscopia binocular x 40x (microscopio)	und	2.00	11,654.41	23,728.81	1.50	16,620.37						75.00%	40,349.18
D-16	Metroscopia binocular x 40x (microscopio)	und	1.00	57,654.47	57,654.47	0.95	54,655.55						95.00%	115,010.63
D-17	Tono de voz con auriculares	und	1.00	355,532.22	355,532.22								100.00%	711,064.44
D-17	Metroscopia binocular x 40x (microscopio)	und	1.00	334,745.76	334,745.76								100.00%	669,491.52
D-17	Metroscopia binocular x 40x (microscopio)	und	1.00	278,811.44	278,811.44	1.00	278,811.44						100.00%	557,622.88
D-17	Metroscopia binocular x 40x (microscopio)	und	1.00	215,145.84	215,145.84								100.00%	430,291.68
D-17	Metroscopia binocular x 40x (microscopio)	und	1.00	31,305.00	31,305.00	2.65	63,610.00						265.00%	127,115.00
D-17	Metroscopia binocular x 40x (microscopio)	und	3.00	41,450.85	124,365.91	7.60	230,311.84						760.00%	354,677.75
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	8.00	10,169.49	81,355.93	7.60	77,283.14						760.00%	158,539.07
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	3.00	79,651.02	239,893.05	1.90	4,508.47						19.00%	244,391.52
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	2.00	2,712.69	5,425.38	2.65	7,728.81						265.00%	13,154.19
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	16.00	3,949.15	63,185.44	15.20	60,027.12						95.00%	123,212.61
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	2.00	58,474.59	116,949.18	1.90	111,101.63						100.00%	228,050.81
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	6.00	18,929.73	113,542.37	6.00	113,542.37						100.00%	229,984.74
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	4.00	4,207.29	16,845.15	3.60	16,101.63						90.00%	32,946.78
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	1.00	1,285.61	1,285.61								100.00%	2,571.22
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	6.00	57,185.10	114,370.20	1.90	1,055,264.24						100.00%	1,269,634.44
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	1.00	27,453.27	27,453.27								100.00%	54,906.54
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	2.00	16,845.15	33,690.31	1.90	33,203.29						95.00%	66,883.60
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	6.00	22,033.60	132,203.39	3.60	16,101.63						60.00%	198,104.76
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	1.00	34,447.38	34,447.38								100.00%	68,894.76
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	1.00	252,911.85	252,911.85	1.90	3,203.24						100.00%	505,823.70
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	2.00	1,834.62	3,669.24								100.00%	7,338.48
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	1.00	1,834.62	1,834.62								100.00%	3,669.24
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	1.00	144,550.65	144,550.65								100.00%	289,101.30
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	1.00	275,255.24	275,255.24								100.00%	550,510.48
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	2.00	7,627.12	15,254.24	2.00	15,254.24						100.00%	30,508.48
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	6.00	4,905.05	29,430.51								100.00%	58,861.02
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	2.00	1,271.19	2,542.37	1.60	2,415.28						80.00%	5,057.65
D-17	Equipo de limpieza con equipo de limpieza y + (electrodomest)	und	17.00	14,407.14	244,915.15	15.15	2,303.63						89.00%	489,820.78





VALORIZACIÓN N° 40 : EQUIPAMIENTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL H-2 CESAR GARAYAR GARCÍA.  
Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

UBICACION  
ENTIDAD  
CONTRATISTA  
MONTO CONTRATADO  
FECHA DE PRESUPUESTO  
FORMULA POLINOMICA No. 08  
FECHA DE CORTE

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONSORCIO SALUD LORETO  
S/ 217.228.482,38  
31/08/2015  
EQUIPAMIENTO  
30-Jun-21

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION / PARTIDA, METRADO, MONTO, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO, MONTO, SALDO. Rows include items like Estufas de calentamiento, Frotas de mano, etc.



ONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
S. SAIURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
JEFE DE SUPERVISION  
CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : EQUIPAMIENTO**  
 Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL I+2 CESAR GARAYAR GARCÍA".  
 IQUITOS - MAYNAS - LORO  
 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
 CONSORCIO SALUD LORETO  
 SI: 217.286-482.35  
 31/08/2015  
**EQUIPAMIENTO**  
**30-Jun-21**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		METRADO		SALDO		
		UNID	CANTIDAD	P.M.	MONTO	METRADO	%	MONTO	%	METRADO	%	MONTO	%	METRADO	%	MONTO
D-2-0	Incidadora de microbiología CO2	und	1.00	12,758.61	12,758.61	1.00	100.00%	12,758.61		1.00	100.00%	12,758.61	0.05	5.00%	16,667.78	659.83
D-2-1	Incidadora de microbiología sat. 30 x 40 litros	und	2.00	9,177.97	18,355.94	1.50	75.00%	17,816.14		1.50	75.00%	17,816.14	0.10	5.00%	19,607.81	937.80
D-2-11	Hemiplegómetro	und	8.00	4,282.71	34,261.69								1.00	100.00%	34,261.69	4,282.71
D-2-72	Colesterol automática de líquidos	und	1.00	13,553.32	13,553.32								1.00	100.00%	13,553.32	13,553.32
D-2-79	Etiqueta analítica (100 x 500 pf)	und	3.00	5,942.20	17,756.61	5.70	95.00%	35,791.65		5.70	95.00%	35,791.65	0.30	5.00%	17,545.61	1,754.56
D-2-89	Etiqueta analítica de precisión	und	1.00	6,279.24	6,279.24								1.00	100.00%	6,279.24	6,279.24
D-2-92	Construcción de mediciones y reactivos	und	1.00	21,558.55	21,558.55								1.00	100.00%	21,558.55	21,558.55
D-2-93	Construcción de bobinas de aspirador a 12 x 18 U	und	1.00	18,028.55	18,028.55								1.00	100.00%	18,028.55	18,028.55
D-2-95	Cables para impresoras de ventas	und	2.00	338.93	677.87	1.90	95.00%	644.07		1.90	95.00%	644.07	0.10	5.00%	33.90	33.90
D-2-97	Refrigeradora para farmacia	und	12.00	50,000.00	600,000.00	11.50	95.83%	570,000.00		11.50	95.83%	570,000.00	0.60	5.00%	30,000.00	30,000.00
D-2-98	Refrigeradora para laboratorios de 14 puz. cubetas	und	4.00	46,101.17	184,404.68	3.60	90.00%	177,118.64		3.60	90.00%	177,118.64	0.20	5.00%	9,286.04	9,286.04
D-2-99	Computadora para impresión de imágenes	und	2.00	3,410.17	6,820.34								2.00	100.00%	6,820.34	6,820.34
D-2-99a	Computadora para impresión de imágenes	und	1.00	3,410.17	3,410.17								1.00	100.00%	3,410.17	3,410.17
D-2-99b	Computadora de 200" C.	und	1.00	27,692.70	27,692.70								1.00	100.00%	27,692.70	27,692.70
D-2-99c	Computadora de 200" C.	und	1.00	27,692.70	27,692.70								1.00	100.00%	27,692.70	27,692.70
D-3-0	Lámpara de freidora refig. ultravioleta	und	2.00	3,410.17	6,820.34								2.00	100.00%	6,820.34	6,820.34
D-3-04	Lámpara de succion de freno - Incl. tubo cuello de gamo	und	20.00	3,658.31	73,166.20	19.00	95.00%	74,097.60		19.00	95.00%	74,097.60	0.05	5.00%	74,097.60	74,097.60
D-3-13	Lámpara de succion de freno - Incl. tubo cuello de gamo	und	1.00	2,691.10	2,691.10	0.95	95.00%	2,659.22		0.95	95.00%	2,659.22	0.05	5.00%	2,659.22	2,659.22
D-3-32	Máquina de medir de mesa corporal	und	1.00	2,186.64	2,186.64	3.60	100.00%	8,050.65		3.60	100.00%	8,050.65	0.20	5.00%	1,551.71	1,551.71
D-3-32a	Etímetro digital	und	3.00	3,670.76	11,012.28								3.00	100.00%	11,012.28	11,012.28
D-3-35	Etiqueta digital con Tallmetro manual	und	31.00	3,670.76	113,993.64	6.65	21.45%	7,608.05		6.65	21.45%	7,608.05	0.35	5.00%	402.42	402.42
D-3-39	Contra medida	und	6.00	48.37	290.02	5.70	95.00%	241.53		5.70	95.00%	241.53	0.30	5.00%	12.71	12.71
D-3-39a	Equipo de Glóbulos + conos LEOP con accesorios	und	2.00	19,529.32	39,058.64								2.00	100.00%	39,058.64	39,058.64
D-3-39b	Equipo de Glóbulos + conos LEOP con accesorios	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39c	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39d	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39e	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39f	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39g	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39h	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39i	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39j	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39k	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39l	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39m	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39n	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39o	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39p	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39q	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39r	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39s	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39t	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39u	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39v	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39w	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39x	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39y	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28
D-3-39z	Módulo de procesamiento para tubo 3.25x8 a 9mm	und	2.00	2,186.64	4,373.28								2.00	100.00%	4,373.28	4,373.28



**CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
 Sr. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

OBRA: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA**.  
 Período del 16 Ene al 30-Jun-21

UBICACION: **QUITOS - MAYNAS - LORETO**  
 ENTIDAD: **GOBIERNO REGIONAL DE LORETO**  
 CONTRATISTA: **CONSORCIO SALUD LORETO**  
 MONTO CONTRATADO: **S/ 217,225,482.36**  
 FECHA DE PRESUPUESTO: **31/08/2015**  
 FORMULA FIDUCIARIA: **FORMULA POLITOMICA No. 06**  
 FECHA DE CORTE: **30-Jun-21**

**VALORIZACIÓN N° 40 : EQUIPAMIENTO**

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTES MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	P.LI	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%
D-130	Commodor para vacuna 300 x 400 bi.	und	1.00	17,531.25	17,531.25						1.00	100.00%	17,531.25
D-145	Alfabetizac	und	2.00	503.47	1,006.94						2.00	100.00%	1,006.94
D-146	Dinámico Utinap	und	1.00	1,534.02	1,534.02						1.00	100.00%	1,534.02
D-43	Oftalmoscopia	und	1.00	27,118.64	27,118.64						1.00	100.00%	27,118.64
D-51	Oftalmoscopia infr-rojo	und	2.00	65,913.47	130,826.95	1.50	55.00%	123,525.60	1.50	55.00%	123,525.60	100.00%	271,186.42
D-74	Oftalmoscopia directo	und	2.00	9,745.76	19,491.53	1.50	55.00%	18,516.95	1.50	55.00%	18,516.95	100.00%	6,500.33
D-82	Otoscopia	und	1.00	1,016.95	1,016.95	0.95	50.00%	965.10	0.95	50.00%	965.10	100.00%	974.53
D-83	Rectángulo médico	und	1.00	19,691.85	19,691.85	0.95	50.00%	18,693.77	0.95	50.00%	18,693.77	100.00%	503.65
D-84	Rectángulo médico	und	1.00	1,557.63	1,557.63						1.00	100.00%	1,557.63
D-85	Rectángulo médico	und	1.00	1,927.83	1,927.83						1.00	100.00%	1,927.83
D-92	Distintivo de brazos paramédicos	und	80.00	754.24	22,627.12	28.50	95.00%	21,452.76	28.50	95.00%	21,452.76	100.00%	1,174.36
D-93	Terminales de Laboratorio 65-10 x 100 0°C	und	3.00	95,944.07	77,720.34						3.00	100.00%	77,720.34
D-94	Terminales de Laboratorio 65-10 x 100 0°C	und	3.00	95,944.07	77,720.34	1.00	100.00%	181.35	1.00	100.00%	181.35	100.00%	77,200.35
E-105	Equipo para center Lita	und	2.00	777.20	777.20						2.00	100.00%	777.20
E-106	Equipo para center Lita	und	2.00	181.35	362.70	1.50	50.00%	344.62	1.50	50.00%	344.62	100.00%	181.35
E-110	Terminales para porta vacunas	und	3.00	232,403.31	697,210.00	2.05	95.00%	662,207.81	2.05	95.00%	662,207.81	100.00%	348,725.00
E-111	Equipo de laboratorio	und	2.00	1,016.95	2,033.90	2.05	95.00%	1,283.14	2.05	95.00%	1,283.14	100.00%	2,033.90
E-112	Equipo de laboratorio	und	4.00	2,605.93	10,423.73	3.00	50.00%	9,402.54	3.00	50.00%	9,402.54	100.00%	1,021.19
E-113	Equipo de laboratorio	und	1.00	38,135.53	38,135.53						1.00	100.00%	38,135.53
E-114	Equipo de laboratorio	und	1.00	1,278.81	1,278.81						1.00	100.00%	1,278.81
E-115	Equipo de laboratorio	und	1.00	2,865.10	2,865.10						1.00	100.00%	2,865.10
E-116	Equipo de laboratorio	und	1.00	7,627.12	7,627.12	1.00	100.00%	2,118.64	1.00	100.00%	2,118.64	100.00%	5,508.48
E-117	Equipo de laboratorio	und	2.00	3,135.53	6,271.06						2.00	100.00%	6,271.06
E-118	Equipo de laboratorio	und	1.00	2,722.02	2,722.02						1.00	100.00%	2,722.02
E-119	Equipo de laboratorio	und	300.00	41,144	12,343.20	1.00	100.00%	2,392.00	1.00	100.00%	2,392.00	100.00%	3,357.83
E-120	Equipo de laboratorio	und	300.00	307.59	9,227.73						300.00	100.00%	9,227.73
E-121	Equipo de laboratorio	und	1.00	13,339.15	13,339.15						1.00	100.00%	13,339.15
E-122	Equipo de laboratorio	und	100.00	298.31	47,769.61						100.00	100.00%	47,769.61
E-123	Equipo de laboratorio	und	20.00	1,271.19	25,423.73						20.00	100.00%	25,423.73
E-124	Equipo de laboratorio	und	8.00	1,016.95	8,135.53						8.00	100.00%	8,135.53
E-125	Equipo de laboratorio	und	2.00	193.03	386.06						2.00	100.00%	386.06
E-126	Equipo de laboratorio	und	2.00	42.37	84.75						2.00	100.00%	84.75
E-127	Equipo de laboratorio	und	4.00	7,559.49	30,237.97						4.00	100.00%	30,237.97
E-128	Equipo de laboratorio	und	4.00	163.49	653.96						4.00	100.00%	653.96
E-129	Equipo de laboratorio	und	2.00	2,188.64	4,377.29						2.00	100.00%	4,377.29
E-130	Equipo de laboratorio	und	2.00	158.46	316.92						2.00	100.00%	316.92
E-131	Equipo de laboratorio	und	2.00	245.76	491.53						2.00	100.00%	491.53
E-132	Equipo de laboratorio	und	2.00	207.25	414.51						2.00	100.00%	414.51
E-133	Equipo de laboratorio	und	2.00	271.19	542.37						2.00	100.00%	542.37
E-134	Equipo de laboratorio	und	2.00	259.07	518.14						2.00	100.00%	518.14
E-135	Equipo de laboratorio	und	2.00	168.44	336.88						2.00	100.00%	336.88
E-136	Equipo de laboratorio	und	3.00	1,050.65	3,151.95	3.00	100.00%	3,050.65	3.00	100.00%	3,050.65	100.00%	3,151.95
E-137	Equipo de laboratorio	und	3.00	1,188.44	3,565.32						3.00	100.00%	3,565.32
E-138	Equipo de laboratorio	und	1.00	1,271.19	1,271.19						1.00	100.00%	1,271.19
E-139	Equipo de laboratorio	und	1.00	163.49	163.49						1.00	100.00%	163.49
E-140	Equipo de laboratorio	und	1.00	668.92	668.92						1.00	100.00%	668.92
E-141	Equipo de laboratorio	und	1.00	6,614.28	6,614.28						1.00	100.00%	6,614.28
E-142	Equipo de laboratorio	und	1.00	6,693.64	6,693.64						1.00	100.00%	6,693.64
E-143	Equipo de laboratorio	und	1.00	4,639.13	4,639.13						1.00	100.00%	4,639.13



**ISORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
**SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN**  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

VALORIZACIÓN N° 40 : EQUIPAMIENTO

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL "D. CESAR GARAYAR GARCIA".

UBICACION: QUUITOS - MAYNAS - LORETO  
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO  
CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO  
MONTO CONTRATADO: S/ 217,226,492.36  
FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015  
FORMULA POLINOMICA No. 06  
EQUIPAMIENTO  
30-Jun-21

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION PARTIDA, METRADO, MONTO, ACUMULADO ANTERIOR, PRESENTE MES, ACUMULADO ACTUAL, METRADO %, MONTO %, SALDO %, MONTO. Rows include equipment like 'Placa para lavado de instrumentos', 'Anestesia de pruebas', 'Lente de contacto', etc.



CONSORCIO SUPERVISOR GARAYAR  
SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
JEFE DE SUPERVISION  
CIP N° 41863

**VALORIZACIÓN N° 40 : EQUIPAMIENTO**

Periodo del 16 Ene al 30-Jun-21

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCÍA.

UBICACION: EN EL CANTON DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE LOS RIOS, GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO  
 CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD LORETO  
 MONTO CONTRATADO: S/ 217.226.482,36  
 FECHA DE PRESUPUESTO: 31/08/2015  
 FORMULA POLINOMICA No. 08  
 FECHA DE CORTE: 30-Jun-21

CODIGO	DESCRIPCION / PARTIDA	METRADO		CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO		
		UNID	CANTIDAD	PLU	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO	METRADO	%	MONTO
M-70	Lavadora automática de 2 puertas (técnica estándar), industrial 70kg	und	1	353,186	353,186									353,186
M-120	Cintur para el temporizador pasado	und	6,00	2,346,62	14,079,72									14,079,72
M-138	Mesa de recepción en metal y tablarado	und	1,00	93,150,02	93,150,02									93,150,02
M-51	Tablarado metálico con aluminio de medida para taller	und	2,00	169,48	338,96									338,96
Q-3	Tornillo de banco	und	2,00	349,42	698,84									698,84
SEC-40	Escalera de alpa de 40kg	und	2,00	38,135,69	76,271,38									76,271,38
T-101	Equipo eléctrico para soldar	und	1,00	1,355,93	1,355,93									1,355,93
T-101a	Equipo para soldar y cortar con acileno (gasolina en general)	und	1,00	1,610,17	1,610,17									1,610,17
T-102	Equipo eléctrico para pintar con pulverizador (neopreno y acetato)	und	1,00	620,38	620,38									620,38
T-103	Caja registradora digital	und	5,00	1,334,75	6,673,75									6,673,75
P-9	Estimulador eléctrico de masa	und	1,00	1,778,69	1,778,69									1,778,69
M-37	Equipo de sonido (mixer, micrófono)	und	1,00	49,152,54	49,152,54									49,152,54
07-01	<b>FORJADO QUIMICO</b>													
D-155	Sillas plásticas de acero galvanizado	und	64,00	211,85	13,629,20									13,629,20
D-156	Sillas de aluminio de acero galvanizado	und	64,00	220,33	14,141,12									14,141,12
H1	Silla de aluminio para exámenes	und	16,00	1,016,95	16,271,19									16,271,19
P11	Silla de aluminio para exámenes	und	43,00	847,45	36,440,63									36,440,63
H12	Silla de aluminio para exámenes de cuerpo estubo	und	12,00	3,713,05	44,592,71									44,592,71
H13	Silla de aluminio para exámenes ultrasonidos, quirúrgicos	und	6,00	3,553,89	21,323,44									21,323,44
H15	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	6,00	1,849,15	7,756,61									7,756,61
H16	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	6,00	19,821,19	82,927,12									82,927,12
H19	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	30,00	220,34	6,610,17									6,610,17
H2	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	5,00	5,508,47	27,542,37									27,542,37
H20	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	11,00	5,508,47	60,592,21									60,592,21
H21	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	4,00	1,355,42	5,782,71									5,782,71
H22	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	2,00	1,025,37	4,101,26									4,101,26
H23	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	2,00	2,835,52	5,671,04									5,671,04
H27	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	2,00	10,827,46	21,654,92									21,654,92
H28	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	2,00	8,471,63	18,693,05									18,693,05
H29	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	4,00	37,769,59	159,153,93									159,153,93
H31	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	3,00	7,203,39	21,610,17									21,610,17
H32	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	3,00	67,372,69	202,118,64									202,118,64
H33	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	3,00	76,530,22	228,778,66									228,778,66
H34	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	3,00	75,716,95	227,150,65									227,150,65
H35	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	4,00	29,915,25	118,661,02									118,661,02
H37	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	2,00	2,019,90	4,039,80									4,039,80
H38	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	5,00	19,239,85	96,199,26									96,199,26
H39	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	2,00	27,118,64	54,237,28									54,237,28
H40	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	2,00	6,116,66	12,233,32									12,233,32
H41	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	2,00	6,116,66	12,233,32									12,233,32
H42	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	2,00	16,377,69	32,755,38									32,755,38
H43	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	3,00	18,183,60	54,550,80									54,550,80
H44	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	3,00	46,355,59	139,067,66									139,067,66
H45	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	3,00	18,135,59	54,406,76									54,406,76
H48	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	3,00	15,677,67	47,033,01									47,033,01
H49	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	3,00	23,474,58	70,423,73									70,423,73
H5	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	12,00	8,893,31	106,719,65									106,719,65
H50	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	3,00	5,093,22	15,279,65									15,279,65
H51	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	7,00	2,695,10	20,882,71									20,882,71
H54	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	4,00	3,813,56	15,254,24									15,254,24
H57	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	2,00	5,816,93	11,633,86									11,633,86
H58	Silla de aluminio para exámenes de ultrasonidos, quirúrgicos	und	6,00	3,893,31	23,360,18									23,360,18



**RESORCIO SUPERVISOR GARAYAR**  
 SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN  
 JEFE DE SUPERVISION  
 CIP N° 41863

**PANEL FOTOGRÁFICO  
VALORIZACIÓN N° 40  
JUNIO 2021**

Contratista

o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DE \_ PIP\_ RAMIEN TO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



**Nivelación y Compactación Interior**



**Obras de concreto Armado: Casetas de Vigilancia**

373




**PANEL FOTOGRÁFICO  
VALORIZACIÓN N° 40  
JUNIO 2021**

Contratista



OBJETIVO: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: VALORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

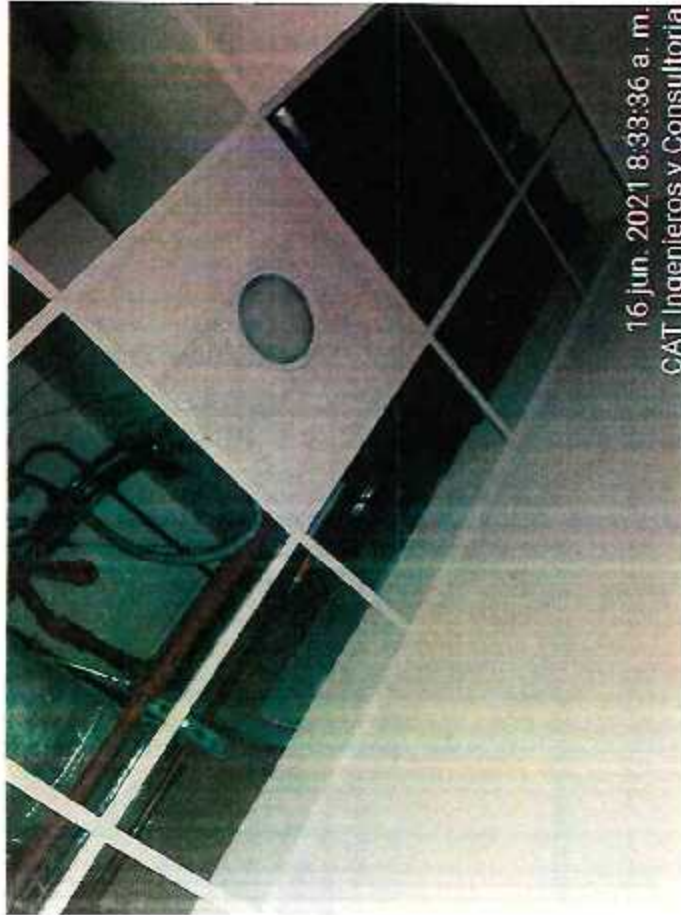

16 jun. 2021 8:33:36 a. m.  
CAT Ingenieros y Consultoría



16 jun. 2021 8:38:19 a. m.  
CAT Ingenieros y Consultoría

**FALSO CIELORRASO: Parantería en SSHH**

372




**PANEL FOTOGRÁFICO  
VALORIZACIÓN N° 40  
JUNIO 2021**

Contratista



3) ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CBRA) DEL PIP:  
RAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

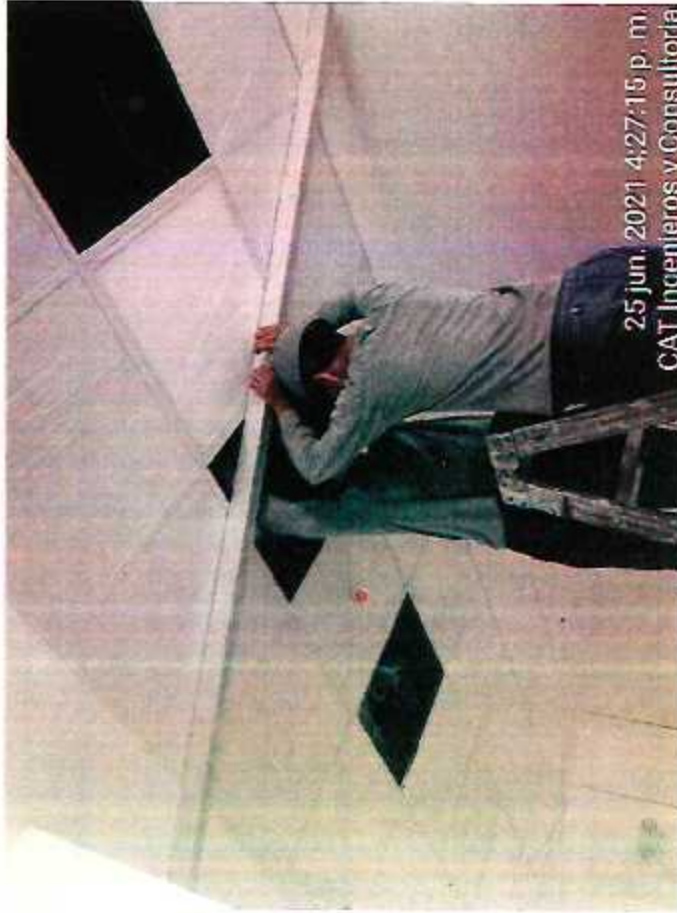

25 Jun. 2021 4:27:15 p. m.  
CAT Ingenieros y Consultoría



25 Jun. 2021 4:15:23 p. m.  
CAT Ingenieros y Consultoría

**FALSO CIELORRASO: Nivelación de Estructura y colocación de Baldosas**

371



**PANEL FOTOGRÁFICO  
VALORIZACIÓN N° 40  
JUNIO 2021**

Contratista

o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP: RAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



**Instalación de Marco y Hoja**



**Masillado de Puerta**




370

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DEL PIP:  
SAMIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



Instalación y Verificación de Brazo Hidráulico

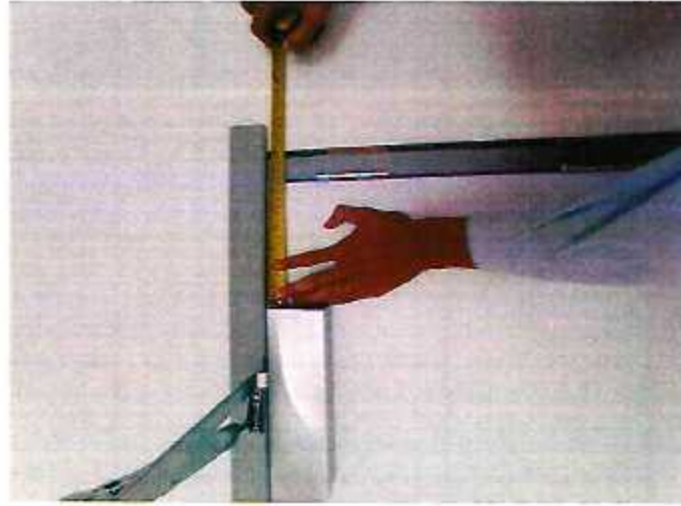

Instalación de Cerrajería y Rejillas





**PANEL FOTOGRÁFICO  
VALORIZACIÓN N° 40  
JUNIO 2021**

Contratista

**CONSORCIO  
SALUD  
LORETO**

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DEL PIP: EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



**Imprimante y Pintura Oleo Mate en Interiores**

368

**PANEL FOTOGRÁFICO  
VALORIZACIÓN N° 40  
JUNIO 2021**

Contratista

6: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP:  
RAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



**Cobertura de Teja Pizarra; Recubrimiento con Manto Asfáltico y montajes de Columnas**

367

**PANEL FOTOGRÁFICO  
VALORIZACIÓN N° 40  
JUNIO 2021**

Contratista

**CONSORCIO  
SALUD  
LORETO**

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DEL PIP:  
AMBIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



**Cobertura de Teja Pizarra: Implementación de Tejas en Pórtico de Ingreso**

368



**PANEL FOTOGRAFICO  
VALORIZACION N° 40  
JUNIO 2021**

Contratista




o: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA) DEL PIP:  
RAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR SARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO



**Colocación de Aparatos y Accesorios Sanitarios**

365

3: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO HASTA LA PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CBRA) DEL PIP:  
RAMAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CÉSAR GARAYAR GARCÍA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

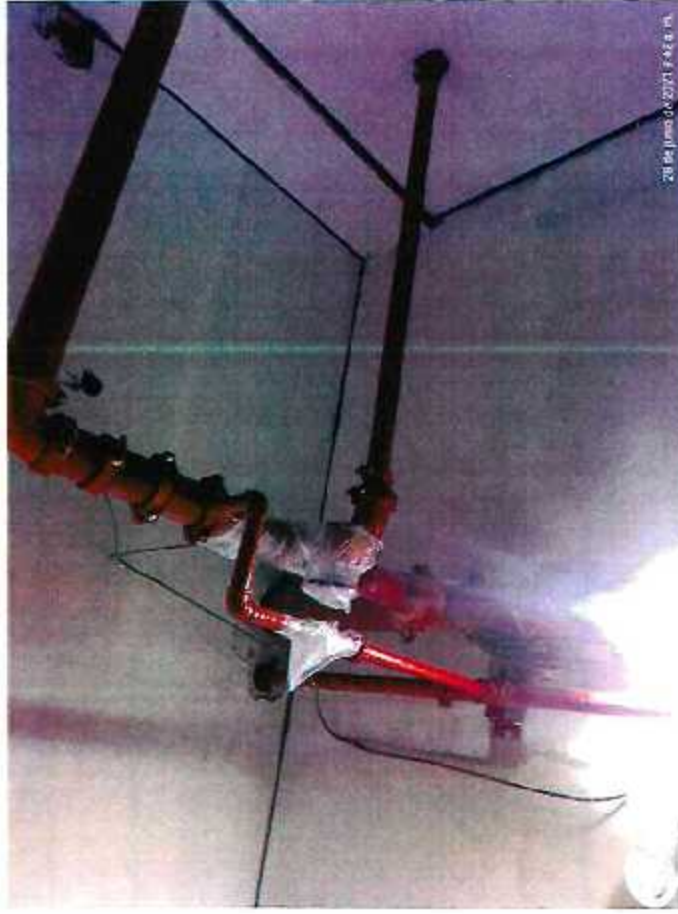

Sistema de Agua contra Incendio: Redes de Alimentación - Distribución

364
