



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Belén, 12 de julio de 2021

Oficio n° 2157-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mg. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente

CARGO



Asunto: Conformidad de Valorización de Obra n°05
Junio-2021.

Obra: "Mejoramiento de la Calle 04 de Septiembre, Calle Urarinas, Pasaje Secoya y Adyacentes al ámbito de su influencia - Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas -Loreto".

Ref.: a. Informe n° 189-2021-GRL/GRI/SGSyC-CDPBG
b. Carta n° 059-2021-C/BDRL

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la **Valorización de obra n°05 correspondiente a junio 2021**, que asciende a la suma **Un millón Quinientos Cuarenta y un Mil Setenta y Seis con 64/100 soles (S/. 1 541,706.64) sin IGV**, presentada y aprobada por la supervisión de la obra mediante carta de la referencia b), revisada por el Coordinador según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta n° 05 - junio 2021	SI.	1 774,115.81
Reajuste	S/	0.00
Amortización Adelanto Directo	S/	0.00
Amortización Adelanto Materiales	S/	232,409.17
Deducción reajuste Adelanto Directo	S/	0.00
Deducción reajuste Adelanto de Materiales	S/	0.00
Neto a Pagar	SI.	1 541,706.64

Asimismo, la obra a junio de 2021, tiene un avance real acumulado ejecutado del 51.20% versus un avance programado de 26.59%, encontrándose la obra en proceso de ejecución.

Por lo tanto, encontrándose **conforme** la documentación de la valorización que sustenta el supervisor, se solicita continuar con el trámite respectivo **a favor de CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. **RAÚL FLORES AQUEPUCHO**
Sub Gerente de Supervisión y Control
CIP. 03850

- Copia: SGSyC - File obra (01)
- SGSyC - File correlativo (01)
- SGSyC - File personal (01)
- RFA - S.G.
- dap - Sec.
- Tramite: 15591



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



Riis Amazonas
IQUITOS - PERU
Bosque Tropical. Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

INFORME N°0189-2021-GRL-GRI-SGSyC-CDPBG

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control
12 JUL 2021
Fecha: 75591 Hora: 12:16 PM
N° Reg:

AL : Ing. Raúl Flores Aquepucho
SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

DE : Arq. Carolina del Pilar Baneo Garate
COORDINADORA DE OBRA

ASUNTO : REMITO INFORME DE DOCUMENTACION, VALORIZACION DE OBRA N° 05 –
JUNIO 2021
(CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTA GENERALES E.I.RL.)

REFERENCIA : (01) Obra: "SUB ÍTEM 1.1 "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4 DE SEPTIEMBRE,
CALLE URARINA" CUI N° 2194661; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE
MANAS – LORETO"
(02) Carta N°059-2021-C/BDRL
(03) Informe N° 008-2021-JVA/CBDRL-2021
(03) Carta N° 027-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS 04 DE SETIEMBRE
(04) Trámite: 15591

FECHA : Iquitos, 09 de julio del 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitirle la presente documentación de la obra: "SUB ÍTEM 1.1 "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4 DE SEPTIEMBRE, CALLE URARINA" CUI N° 2194661; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MANAS – LORETO". Respecto a la Valorización N° 05 correspondiente al mes de JULIO del 2021.

1. DATOS GENERALES

Obra	: "Sub Ítem 1.1 "Mejoramiento de la Calle 4 de Septiembre, Calle Urarina" CUI N° 2194661; Distrito de Iquitos – Provincia de Manas – Loreto".
Ubicación	: Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto.
Entrega de Terreno	: 12 de Enero del 2021
Pago de Adelanto Directo	: NO SOLICITADO
Pago de Adelanto de Materiales	: No Solicitado
Fecha de Inicio Ejecución	: 01 de Febrero del 2021
Fecha de Término Ejecución	: 28 de Octubre del 2021
Estado de la obra	: En Ejecución
%Avance Programado	: 26.59%
%Avance Programado Acumulado	: 61.81%
%Avance Físico	: 21.12%
%Avance Físico Acumulado	: 51.20%
Contratista	: Caballero Contratistas Generales EIRL
Contrato de Obra	: 001-2021-GRL-GRI
Fecha de Contrato	: 05 de Enero del 2021
Monto Contractual	: S/. 8'400,000.00 (Sin IGV)
Plazo de Ejecución	: 270 días calendario
Supervisión de Obra	: CONSORCIO BDRL
Ing. Residente de Obra	: Ing. Tito Eduardo Herrera Sabogal
Ing. Jefe Supervisión de Obra	: Ing. Julio Vela Alvarado
Coordinadora de Obra	: Arq. Carolina del Pilar Baneo Garate



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



RiO Amazonas
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

ESTADO DE OBRA	: EJECUCION - ATRASADA
• DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
CONCURSO	: L.P. N° 027-2020-CSO-GRL-1
RESIDENTE	: ING. TITO EDUARDO HERRERA SABOGAL C.I.P. N°81970
CONTRATO	: N° 001-2021-GRL-GGR-GRI.
MONTO CONTRATADO	: S/ 8'400,000.00, sin IGV.
FIRMA DE CONTRATO	: 05 de enero del 2021.
PLAZO DE EJECUCION	: 270 Días Calendarios.
• DATOS DE LA SUPERVISION	
CONSULTOR	: CONSORCIO BDRL
JEFE DE SUPERVISIÓN	: ING. JULIO VELA ALVARADO – REG. CIP. 100475
CONTRATO	: N° 016-2021-GRL-GGR-GRI.
MONTO CONTRATADO	: S/ 636,022.40, SIN IGV.
FIRMA DE CONTRATO	: 01 de marzo del 2021
PLAZO DE EJECUCION	: 330 Días Calendarios.

2. ANTECEDENTES DE OBRA:

✓ **Con fecha 05 de enero del 2021:**

Se firma el contrato de ejecución de la obra en mención, entre el Gobierno Regional de Loreto y CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., mediante Contrato N° 001-2021-GRL-GRI

✓ **Con fecha 12 de enero del 2021:**

Se realizó la entrega de terreno para la ejecución de la Obra Antes mencionada en el asunto, no otorgo el Adelanto Directo, difiriendo el inicio de la obra hasta subsanar temas de propiedades, con fecha 01 de febrero del 2021, se procedió a dar por Inicio de la Obra, que es el último evento cumpliendo así con los requisitos de ley.

✓ **Con fecha 05 de marzo del 2021:**

Mediante Carta N° 007-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS 04 DE SEPTIEMBRE, CONSORCIO BDRL presenta primera Valorización – correspondiente al mes FEBRERO DEL 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 267,779.65 Soles.**

✓ **Con fecha 09 de abril del 2021:**

Mediante Carta N° 017-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS 04 DE SEPTIEMBRE, CONSORCIO BDRL presenta segunda Valorización – correspondiente al mes MARZO DEL 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 515,003.44 Soles.**

✓ **Con fecha 09 de abril del 2021:**

Mediante Carta N° 029-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS 04 DE SEPTIEMBRE, CONSORCIO BDRL presenta tercera Valorización – correspondiente al mes ABRIL DEL 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 442,901.86 Soles**

✓ **Con fecha 07 de JUNIO del 2021:**

Mediante Carta N° 050-2021-C/BDRL 04 DE SEPTIEMBRE, CONSORCIO BDRL presenta cuarta Valorización – correspondiente al mes MAYO DEL 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 1'301,026.43 Soles**

✓ **Con fecha 05 de JULIO del 2021:**

Mediante Carta N° 059-2021-C/BDRL 04 DE SEPTIEMBRE, CONSORCIO BDRL presenta QUINTA Valorización – correspondiente al mes JUNIO DEL 2021, en la cual hace de conocimiento que se ha ejecutado los metrados del presupuesto contractual, por un Monto Bruto de **S/. 1'541,726.64 Soles**



REVISADO
2
CAROLINA DEL PILAR BANE0 GARATE



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL


3. DOCUMENTOS PRESENTADOS:

Con Carta N° 059-2021-C/BDRL recepcionada por la ENTIDAD el 05 de JULIO del 2021, el Contratista presenta al Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR BDRL la Valorización de Ejecución de Obra N° 05 correspondiente al mes de JUNIO del 2021, en la cual hace de conocimiento que se han ejecutado los metrados del presupuesto del Expediente Técnico Contractual, de manera que solicita su pago correspondiente, con la siguiente documentación como anexo:

- CD CON CONTENIDO DIGITAL DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA
- Carta N° 035-2021-CCGEIRL-LCN-GG/VIAS 04 DE SETIEMBRE
- FICHA TECNICA
- MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
- REQUISITOS
- COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
- COPIA DE CONTRATO
- COPIA DE ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 001-2021-GRL-GGR-GRI
- COPIA DE ACTA DE TERRENO
- COPIA DE COMPROBANTES DE PAGOS EMITIDOS POR LA OFICINA EJECTIVA DE LOGISTICA Y DOCUMENTOS QUE SUSTENTE LA TRANFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS A LA CUENTA DE PROVEEDOR
- COPIA DE LA FORMULA POLINOMIC
- CALENDARIO PROGRAMADO VALORIZADO ACTUALIZADO
- DOCUMENTOS QUE ACREDITE EL CONTROL DE CALIDAD EN OBRA
- CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE
- PAGO DE TRIBUTOS
SENCICO
ESSALUD
ONP
SCTR
CONAFOVICER
- COPIA DE PLANILLAS DE JORNALES
- COPIA DE DECLARACION PDT – SUNAT
- COPIA EL CUADERNO DE OBRA
DESDE EL ASIENTO N° 173 AL ASIENTO N° 224 – MES DE JUNIO 2021
- RELACION DE PERSONAL TECNICO
- INFORME DE ACTIVIDADES
- INFORME DE ESPECIALISTA MECANICA DE SUELOS
- INFORME ESPECIALISTA AMBIENTAL
- INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- INFORME TEC. EN ENFERMERIA
- PANEL FOTOGRAFICO VALO N° 05 JUNIO 2021
- COPIA DE CARTAS FIANZA
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO
CARTA FIANZA DE ADELANTO DE MATERIALES
 - ANEXOS
 - DISEÑO DE MEZCLA
 - INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4. ASPECTO LEGAL DE OBRA

- ✓ **05 de enero del 2021**
Contrato de Ejecución de Obra- Contrato N° 001-2021-GRL-GGR-GRI.
- ✓ **01 de marzo del 2021**



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Contrato de Consultoría de Obra para la Supervisión - Contrato N° 016-2021-GRL-GGR-GRI.

5. CONTROL DE VIGENCIAS DE CARTAS FIANZAS DE OBRA

Del control de cartas fianzas de Obra, tenemos:

ESTADO DE CARTAS FIANZAS					
N°	CONCEPTOS	DOCUMENTO QUE SUSTENTA SOLICITUD DE DESEMBOLSO	MONTO (S/)	INICIO DE VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA
1	Fiel Cumplimiento	BBVA – BANCO CONTINENTAL	840,000.00	25 de Junio del 2021	24 de agosto del 2021
2	Adelanto de Materiales	MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGURADOS	1,739,000.00	20 junio de setiembre del 2021	17 de setiembre del 2021

6. RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS

Con respecto a los Metrados de la Valorización N° 05 de la obra en mención en la referencia (1), se informa que en gabinete se ha efectuado la revisión de la documentación alcanzada a la suscrita, para lo cual el supervisor ratifica en el informe presentado a la Entidad.

7. 037RESUMEN DE VALORIZACION

De acuerdo a la documentación presentada por la Supervisión con respecto a la Valorización N° 05 de la obra mencionada en la referencia (1), se informa que se ha revisado en gabinete la documentación alcanzada a la suscrita luego de que los metrados para la elaboración de la valorización fuesen aprobados por el Residente y el Supervisor de la obra, para lo cual se presenta un resumen de la misma, tenemos:

VALORIZACION N° 05 - JUNIO 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	1,774,115.81
REAJUSTE NETO	S/ 0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/ 0.00
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	232,409.17
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/ 0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/ 0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/ 1,541,706.64
IGV 18%	S/ 0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/ 0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/ 1,541,706.64

"De acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Art. 194^a Valorizaciones y metrados:

194.1 Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

194.6 El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este párrafo, las Bases deben establecer el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

194.7 A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. * Revisarlo en el RLCE.

8. ESTADO FISICO FINANCIERO ACTUAL DE OBRA


Del estado físico financiero actual de Obra, tenemos:

MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS PROGRAMADOS				
DIAS PLAZO	NUEVOS SOLES		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
0d	0.00	0.00	0.00%	0.00%
28d	111,100.58	111,100.58	1.32%	1.32%
59d	293,897.99	404,998.57	3.50%	4.82%
89d	746,294.34	1,151,292.91	8.88%	13.71%
120d	1,807,934.47	2,959,227.38	21.52%	35.23%
150d	2,233,534.02	5,192,761.40	26.59%	61.81%
181d	1,718,806.38	6,911,567.78	20.46%	82.27%
212d	888,545.14	7,800,112.92	10.58%	92.86%
242d	451,566.03	8,251,678.95	5.38%	98.23%
270d	148,321.05	8,400,000.00	1.77%	100.00%
	8,400,000.00		100.00%	

MONTOS y/o PORCENTAJES VALORIZADOS EJECUTADOS				
DIAS PLAZO	NUEVOS SOLES		PORCENTAJES	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
0d	0.00	0.00	0.00%	0.00%
28d	267,779.65	267,779.65	3.19%	3.19%
59d	515,003.44	782,783.17	6.13%	9.32%
89d	442,901.86	1,225,685.00	5.27%	14.59%
120d	1,301,026.43	2,526,711.45	15.49%	30.08%
150d	1,774,115.81	4,300,827.25	21.12%	51.20%
181d				
212d				
242d				
270d				
	2,526,711.45			

De la figura tenemos, al término del mes de JUNIO del 2021, el estado de **AVANCE** de obra respecto a lo programado es **ATRASADA**.

- o De la figura tenemos, al término del QUINTO MES contractual del plazo de ejecución de obra (junio del 2021), el estado de **AVANCE MENSUAL EJECUTADO ES DE 21.12%** respecto al **AVANCE PROGRAMADO PARCIAL** es de **26.59%**, y un **ACUMULADO EJECUTADO DE 51.20%** Y **AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE 61.81%** teniendo que la **OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 10.61%**.




"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

9. CURVA DE AVANCE DE OBRA

Del Avance de Obra comparado entre el Avance Programado vs. Avance Ejecutado, tenemos:

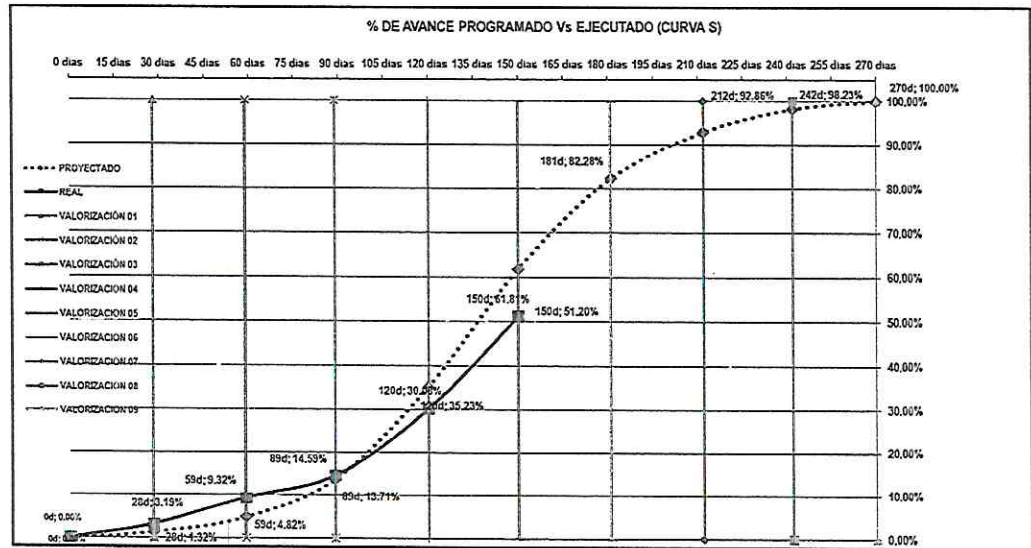

Mediante el grafico se observa que el avance ejecutado acumulado de la obra correspondiente al mes de JUNIO del 2021 es de 51.20%, el avance programado acumulado es 61.81%, por lo que la obra se encuentra ATRASADA.

10. AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES:

De la Amortización del Adelanto de Materiales, tenemos:

CONTROL DE AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES			
Adelanto otorgado			769,900.00
VAL.	MES	MONTO	SALDO
1	MAYO	170,434.46	599,465.54
2	JUNIO	232,409.17	367,056.37
3	JULIO		
4	AGOSTO		
TOTAL		402,843.63	367,056.37

De la figura tenemos, la Amortización del Adelanto de Materiales en el mes de JUNIO DEL 2021 es S/ 232,409.17 (DOS CIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 17/100 SOLES).

11. CONCLUSIONES

- ✓ Se comunica que la suscrita ha realizado la verificación y análisis de la documentación presentada por el Supervisor **CONSORCIO BDRL** en gabinete, correspondiente al mes de JUNIO del 2021, donde previamente se da conformidad a los Metrados conciliados en conjunto por el Jefe de Supervisión y el Residente de Obra los mismos que fueran anotados en el Cuaderno de Obra, habiéndose tomado como válida toda la información presentada por el Supervisor, quién es el responsable de velar directa y



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato.

- ✓ Se comunica que en la presente Valorización el **AVANCE REAL ACUMULADO DE OBRA** de 21.12%, con un **AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE OBRA** del 26.59% **AL MES DE JUNIO**. Por tanto, la Obra se encuentra **ATRASADA** según lo programado. Dichos porcentajes se han verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 05 – JUNIO del 2021 alcanzadas a la suscrita.
- ✓ Se comunica que el Monto Total Valorizado por el Contratista es de **S/ 1,774,115.81 (UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE CON 81/100 SOLES)**; debiéndosele pagar un Monto Total **S/ 1,541,706.64 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTAY Y UN MIL SETECIENTOS SEIS CON 64 /100 SOLES)**; dicho monto se ha verificado en los documentos tramitados de la Valorización N° 05 – JUNIO del 2021 alcanzados a la suscrita y aprobados por la Supervisión – CONSORCIO BDRL.

VALORIZACION N° 05 - JUNIO 2021	
DESCRIPCION	MONTO (S/)
MONTO BRUTO VALORIZADO	1,774,115.81
REAJUSTE NETO	S/ 0.00
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	S/ 0.00
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	232,409.17
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DIRECTO	S/ 0.00
DEDUCCION DE REAJUSTE ADELANTO DE MATERIALES	S/ 0.00
MONTO A PAGAR DE VALORIZACION	S/ 1,541,706.64
IGV 18%	S/ 0.00
RETENCION DEL 10% FONDO DE GARANTIA	S/ 0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	S/ 1,541,706.64

12. RECOMENDACIÓN

- ✓ Al contar con la opinión favorable, validación del monto consignado y conformidad por parte de la Supervisión de Obra **CONSORCIO BDRL**, se recomienda continuar con el trámite de pago de la valorización N° 05, correspondiente al mes de JUNIO 2021, de ejecución de obra: "SUB ÍTEM 1.1 "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 4 DE SEPTIEMBRE, CALLE URARINA" CUI N° 2194661; DISTRITO DE IQUITOS – PROVINCIA DE MANAS – LORETO", por el monto neto de **S/ 1,541,706.64 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTAY Y UN MIL SETECIENTOS SEIS CON 64 /100 SOLES)** a favor de **CABALLERO CONTRATISTA GENERALES E.I.R.L.**

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente,

Carolina Del Pilar Baneo Garate
ARQUITECTA
C.A.P. N° 78391

**Arq. Carolina del Pilar Baneo Gárate.
COORDINADORA DE OBRA**

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05 - MES DE JUNIO

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 04 DE SETIEMBRE, CALLE URARIMAS, PSUE SECOYA Y ADYACENTES AL AMBITO DE SU INFLUENCIA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS-REGION LORETO*

PLAZO DE EJECUCION:
VALOR REFERENCIAL
PRESUPUESTO CONTRATADO:

270 DIAS CALENDARIOS
S/9,083,704.82 SIN IGV
S/ 8,400,000.00 SIN IGV

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E. R.L.
ING° TITO EDUARDO HERRERA SIBOGAL
ING° VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA
ING° JULIO VELA ALVARADO
IQUITOS - MAYNAS - LORETO
JUNIO, 2021

CONSORCIO GENERAL E. R.L.
ING° AN CASALLERO NASHMATE
TITULAR - GERENTE

CONSORCIO GENERAL E. R.L.
ING. JULIO VELA ALVARADO
JEFE DE SUPERVISION
TEL: 953 100 1075

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
RESIDENTE DE OBRA:
COORDINADOR DE OBRA:
JEFE DE SUPERVISION
UBICACION:
FECHA:

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E. R.L.
ING° TITO EDUARDO HERRERA SIBOGAL
ING° VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA
ING° JULIO VELA ALVARADO
IQUITOS - MAYNAS - LORETO
JUNIO, 2021

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO				AVANCE				ACUMULADO				SALDO			
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	%	Metrado	Valorizado	%	Valorizado	%
01	PAVIMENTACION																
01.01	OBRAS PROVISIONALES																
01.01.01	CARTEL DE OBRA DE (3.60x8.50m) TIPO GIGANTOGRAFIA obst. de madera	und	2.00	1,640.77	3,281.54	2.00	3,281.54	0.00	0.00	2.00	3,281.54	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.01.02	ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA	mes	9.00	800.00	7,200.00	4.00	3,200.00	1.00	800.00	5.00	4,000.00	55.56%	4.00	3,200.00	44.44%	3,200.00	44.44%
01.01.03	TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	ton	241.26	40.00	9,650.40	230.00	9,200.00	0.00	0.00	230.00	9,200.00	95.33%	11.26	450.40	4.67%	450.40	4.67%
01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO A OBRA ZONA URBANA	vje	2.00	10,000.00	20,000.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	50.00%	1.00	10,000.00	50.00%	10,000.00	50.00%
01.01.05	POZA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 2.00x2.00x1.00m.	und	4.00	535.48	2,141.92	4.00	2,141.92	0.00	0.00	4.00	2,141.92	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES																
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL (con pico, lampa y carretilla)	m2	8,464.21	1.37	11,595.97	8,464.21	11,595.97	0.00	0.00	8,464.21	11,595.97	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.02.02	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m2	12,459.61	1.68	20,932.14	12,459.61	20,932.14	0.00	0.00	12,459.61	20,932.14	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.02.03	DEMOLICION DE VEREDA EXISTENTE Con Herramientas Manuales	m2	3,527.48	18.35	64,729.26	3,527.48	64,729.26	0.00	0.00	3,527.48	64,729.26	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.02.04	DEMOLICION DE TECHO DE BUZON PARA NIVELACION	und	28.00	82.80	2,318.40	9.00	745.20	4.00	331.20	13.00	1,076.40	46.43%	15.00	1,242.00	53.57%	1,242.00	53.57%
01.02.05	DEMOLICION DE TECHO DE BUZON A LA ALTURA DE RASANTE DE TALA DE ARBOLES Y ELIMINACION DE RAICES	und	28.00	398.04	11,145.12	9.00	3,582.36	4.00	1,592.16	13.00	5,174.52	46.43%	15.00	5,970.60	53.57%	5,970.60	53.57%
01.02.06	DESMTAJE Y REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO DE ELECTRO	und	4.00	135.84	543.36	3.00	407.52	0.00	0.00	3.00	407.52	75.00%	1.00	135.84	25.00%	135.84	25.00%
01.02.07	DESMTAJE Y REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO DE ELECTRO	und	16.00	875.73	14,011.68	8.00	7,005.84	5.00	4,378.65	13.00	11,384.49	81.25%	3.00	2,627.19	18.75%	2,627.19	18.75%
01.02.08	DESMTAJE Y REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO TELEFONICA	und	5.00	2,438.79	12,193.95	5.00	12,193.95	0.00	0.00	5.00	12,193.95	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.02.09	BOMBEO PARA ELIMINACION DE AGUAS FILTRANTES Y PLUVIALES	dia	60.00	74.09	4,445.40	50.00	3,704.50	0.00	0.00	50.00	3,704.50	83.33%	10.00	740.90	16.67%	740.90	16.67%
01.03	EXPLANACIONES																
01.03.01	CORTES Y EXCAVACIONES																
01.03.01.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA	m3	4,753.47	13.17	62,603.20	3111.29	40,975.69	1579.46	20,801.49	4,680.75	61,777.18	98.68%	62.72	826.02	1.32%	826.02	1.32%
01.03.01.02	SOBRE EXCAVACION DEBAJO DE SUB RASANTE C/RETREXCAVADORA	m3	2,537.35	12.92	32,782.56	1801.75	23,278.61	725.72	9,376.30	2,527.47	32,654.91	99.61%	9.88	127.65	0.39%	127.65	0.39%
01.03.01.03	CORTE DE TERRENO MANUAL PARA COLOCACION DE CAMA DE ARENA EN VEREDA	m3	318.68	45.45	14,479.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	318.68	14,479.46	100.00%	14,479.46	100.00%
01.03.02	NIVELACION Y REFINO																
01.03.02.01	CONFORMACION A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA	m2	8,305.14	6.77	56,225.60	0.00	0.00	4124.41	27,922.26	4,124.41	27,922.26	49.66%	4,180.73	28,303.54	50.34%	28,303.54	50.34%
01.03.02.02	REFINE, NIVELACION PARA VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS	M2.	3,995.40	4.14	16,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,995.40	16,540.96	100.00%	16,540.96	100.00%
01.03.03	RELLENOS																
01.03.03.01	RELLENO EN SOBRE EXCAVACION (ARENA A-3)	m3	2,537.35	62.31	158,102.28	1947.84	121,389.91	589.51	36,732.37	2,537.35	158,102.28	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.03.03.02	RELLENO EN SUB BASE DE CUNETA CON MATERIA DE PRESTAMO A-2-4	m3	314.72	59.51	18,728.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	314.72	18,728.99	100.00%	18,728.99	100.00%
01.03.04	ELIMINACIONES																
01.03.04.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DIST. DE 3km + 20% DE ESPONJAMIENTO C/VOLQUETE	m3	9,554.68	20.54	196,251.07	6700.76	137,633.61	2766.22	56,618.16	9,466.98	194,451.77	99.08%	87.60	1,799.30	0.92%	1,799.30	0.92%
01.04	PAVIMENTO																
01.04.01	CAPA ANTICONTAMINANTE CON MATERIAL A-3 e=0.15M	m3	2,539.26	50.29	127,699.39	0.00	0.00	2436.68	122,535.61	2,436.68	122,535.61	95.96%	102.68	5,163.78	4.04%	5,163.78	4.04%
01.04.02	BASE DE MATERIAL DE PRESTAMO (A-2-4)	m3	2,539.26	54.90	139,405.37	0.00	0.00	2436.68	133,768.24	2,436.68	133,768.24	95.96%	102.68	5,637.13	4.04%	5,637.13	4.04%
01.04.03	PERFILADO Y COMPACTADOR A NIVEL DE SUB-BASE	m2	8,464.21	4.49	38,004.30	0.00	0.00	8121.94	36,467.51	8,121.94	36,467.51	95.96%	342.27	1,536.79	4.04%	1,536.79	4.04%
01.04.04	SOLADO MEZCLA 1.8 e=4", EN PAVIMENTO	m2	7,515.39	23.21	174,432.20	0.00	0.00	7515.39	174,432.20	7,515.39	174,432.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
01.04.05	LOSA DE RODADURA MORTERO f'c=210 kg/cm2, e=0.20cm	m3	1,692.84	573.99	971,673.23	0.00	0.00	657.50	377,398.43	657.50	377,398.43	38.84%	1,035.34	594,274.81	61.16%	594,274.81	61.16%
01.04.06	MORTERO EN UNAS PARA PAVIMENTOS RIGIDO MORTERO f'c=210 kg/cm2	m3	347.80	573.99	199,691.12	0.00	0.00	97.81	56,141.96	97.81	56,141.96	28.11%	250.99	143,549.16	71.89%	143,549.16	71.89%
01.04.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE RODADURA, en diametro	m2	1,044.78	27.16	28,376.22	0.00	0.00	544.22	14,781.02	544.22	14,781.02	52.09%	500.56	13,895.21	47.91%	13,895.21	47.91%
01.04.08	ASERRADO DE JUNTAS DE CONTRACCION	m	1,813.30	3.91	7,090.00	0.00	0.00	961.00	3,757.51	961.00	3,757.51	53.00%	852.30	3,332.49	47.00%	3,332.49	47.00%
01.04.09	PASADORES DE FIERRO LISO Ø 5/8" (dilatacion)	kg	1,264.60	5.61	7,095.53	0.00	0.00	620.00	3,478.20	620.00	3,478.20	49.02%	644.80	3,617.33	50.98%	3,617.33	50.98%

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05 - MES DE JUNIO

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE M DE SETIEMBRE, CALLE URUPINAS, PS.E SECOYA Y ADVACENTES AL AMBITO DE SU INFLUENCIA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS-REGION LORETO"

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 RESIDENTE DE OBRA: ING* TITO EDUARDO HERRERA SABOGAL
 COORDINADOR DE OBRA: ING* VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA
 JEFE DE SUPERVISION: ING* JULIO VELA ALVARADO
 UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 FECHA: JUNIO, 2021

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 ING. TITO EDUARDO HERRERA SABOGAL
 RESIDENTE DE OBRA. CIP N° 81970

CONSORCIO BOKL
 ING. JULIO VELA ALVARADO
 JEFE DE SUPERVISION

PLAZO DE EJECUCION: 270 DIAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL: S/ 9,983,704.82 SIN IGV
 PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 8,400,000.00 SIN IGV

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR		ACTUAL		AVANCE		ACUMULADO		Saldo	%	
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado			Valorizado S/.
11.04.10	PASADORES DE FIERRO CORRUGADO DE 68" (ARTICULACION)	kg	1,526.44	5.61	8,563.33	0.00	0.00	933.72	5,238.17	933.72	5,238.17	592.72	3,325.16	38.83%	
11.04.11	SOPORTE PASADORES DE FIERRO LISO DE 14" (DILATACION)	kg	146.88	5.38	790.21	0.00	0.00	72.00	387.36	72.00	387.36	74.88	402.85	50.98%	
11.04.12	PASADORES DE FIERRO CORRUGADO 34" (CONTRACCION)	kg	5,875.20	5.61	32,959.87	0.00	0.00	3123.00	17,520.03	3,123.00	17,520.03	2,752.20	15,439.84	46.84%	
11.04.13	ESPIGA DE FIACION DE PVC 3/4" PARA JUNTA DE DILATACION	und	1,632.00	3.69	6,022.08	0.00	0.00	800.00	2,952.00	800.00	2,952.00	832.00	3,070.08	50.98%	
11.04.14	JUNTAS DE DILATACION DE E=1", H=2" @ 9.00m	m	866.90	5.88	5,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.90	5,214.97	100.00%	
11.04.15	JUNTAS DE CONTRACCION DE 17"x1" CON MORTERO ASFALTICO	m	1,813.80	5.74	10,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.80	10,411.21	100.00%	
11.04.16	JUNTAS DE ARTICULACION LONGITUDINAL 1"x2" CON MORTERO	m	923.02	5.88	5,427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.02	5,427.36	100.00%	
11.04.17	JUNTAS LATERAL DE CONSTRUCCION DE E=1", H=2" CON MORTERO	m	3,288.99	8.08	26,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.99	26,332.64	100.00%	
11.04.18	CURADO DE LOSA DE RIGIDAZA	m2	8,464.21	3.12	26,408.34	0.00	0.00	4,594.68	14,335.40	4,594.68	14,335.40	3,869.53	12,072.93	45.72%	
11.05	VEREDAS, MARTILLOS Y BAMPAS														
11.05.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE														
11.05.01.01	CAMA DE ARENA e = 0.10 m compactado	m2	3,527.48	8.22	28,995.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527.48	28,995.69	100.00%	
11.05.01.02	MORTERO 1:2:15 kg/m3 En Vereda, Muelle y Rampas, acabado frotado inc.	m3	596.09	485.92	289,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.09	289,652.05	100.00%	
11.05.01.03	ENCORADO Y DESENCORADO DE VEREDA E=4"	m2	1,527.63	32.48	49,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.63	49,623.92	100.00%	
11.05.01.04	JUNTAS DE DILATACION DE 1"x2" @ 3.00m	m	392.40	5.35	2,099.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.40	2,099.34	100.00%	
11.05.01.05	CURADO DE VEREDAS, por 7 días	m2	5,025.63	2.19	11,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.63	11,008.57	100.00%	
11.06	OBRAS DE ARTE														
11.06.01	SARDINEL Y CUNETA														
11.06.01.01	MORTERO 1:2:15 kg/m3 En cunetas y sardinelas, Vecio con Mezcladora	m3	369.97	485.92	179,775.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.97	179,775.82	100.00%	
11.06.01.02	ENCORADO Y DESENCORADO DE CUNETAS Y SARDINELES, con madera	m2	2,641.62	33.10	87,437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.62	87,437.62	100.00%	
11.06.01.03	ACERO DE REFUERZO Ø 38", Fy=4200 kg/m2 incluye Doblado + 5%	kg	37,601.37	5.86	220,344.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,601.37	220,344.03	100.00%	
11.06.01.04	JUNTA DE DILATACION 1"x2" EN CUNETAS Y SARDINEL DE MORTERO	m	318.50	5.42	1,726.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.50	1,726.27	100.00%	
11.06.01.05	JUNTA DE CONTRACCION 03.00m. E= 1"x2" @ 3.00m. CON MORTERO	m	877.50	5.42	4,756.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.50	4,756.05	100.00%	
11.06.01.06	TARRAJEO PULIDO EN CUNETAS Modelo 1.5 #=1.5cm	m2	1,258.90	19.79	24,913.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.90	24,913.63	100.00%	
11.06.01.07	SOLAJEADO EN SARDINEL	m2	1,274.58	8.88	11,318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.58	11,318.27	100.00%	
11.06.01.08	CURADO DE SARDINEL Y CUNETAS	m2	2,533.48	2.19	5,548.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.48	5,548.32	100.00%	
11.07	SUMIDEROS														
11.07.01	SUMIDERO E INSTALACION DE SUMIDERO	und	140.00	498.73	56,942.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	56,942.20	100.00%	
11.07.02	CONEXION DE SUMIDERO A CANAL DE MORTERO ARMADO	und	140.00	253.82	35,534.80	26.00	6,595.32	26.00	6,595.32	26.00	6,595.32	114.00	28,939.48	81.43%	
11.07.03	ENCORADO Y DESENCORADO EN DADO DE ANCLAJE	m2	134.40	27.39	3,699.22	24.96	558.85	0.00	0.00	24.96	558.85	109.44	2,460.38	81.43%	
11.07.04	MORTERO EN DADO DE ANCLAJE CA 1:4	m3	17.82	444.33	7,962.39	3.33	1,479.62	0.00	0.00	3.33	1,479.62	14.59	6,482.77	81.43%	
11.08	SUB DRENAJES														
11.08.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SUB DREN	m3	660.51	38.95	25,726.86	215.32	8,386.71	0.00	0.00	215.32	8,386.71	445.19	17,340.15	67.40%	
11.08.02	CAMA DE ARENA e = 0.10 m compactado	m2	60.65	8.22	493.61	97.82	804.08	0.00	0.00	97.82	804.08	-317.77	-310.47	-62.90%	
11.08.03	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE PRETAMO A-3 EN SUB DREN	m3	300.23	52.08	15,635.98	0.00	0.00	52.69	2,744.10	52.69	2,744.10	17.55%	247.54	12,891.88	82.45%
11.08.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	210.16	19.70	4,140.15	0.00	0.00	36.88	726.54	36.88	726.54	173.28	3,413.62	82.45%	
11.08.05	TAPA DE INSPECCION DE MORTERO Ø 80XØ 80XØ 1.20. INC. TAPA	und	53.00	172.79	9,157.87	17.00	2,937.43	0.00	0.00	17.00	2,937.43	32.08%	36.00	67.92%	
11.08.06	SUB DRENAJE ARENA FILTRO GEOTEXTIL	m	1,501.15	88.69	133,136.99	0.00	0.00	263.44	23,364.49	263.44	23,364.49	1,237.71	109,772.50	82.49%	
11.08.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DIST. DE 3km + 20% DE SEÑALIZACION	m3	540.41	20.54	11,100.02	128.13	2,652.33	44.26	909.10	173.39	3,561.43	367.02	7,538.59	67.92%	
11.08.08	SEÑALIZACION HORIZONTAL														
11.08.01.01	MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO COLOR AMARILLO SEPARADOR DE CARRIL	m2	56.63	16.04	908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.63	908.35	100.00%	
11.08.01.02	MARCAS SOBRE EL SARDINEL COLOR AMARILLO	m2	477.97	17.62	8,421.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.97	8,421.83	100.00%	
11.08.01.03	SEÑALES EN CURVAS Y RECTAS DE COLOR BLANCO	m2	144.98	16.04	2,325.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.98	2,325.48	100.00%	

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05 - MES DE JUNIO

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 04 DE SETIEMBRE, CALLE URARINAS, PSJE SECOYA Y ADYACENTES AL AMBITO DE SU INFLUENCIA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS-REGION LORETO

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 RESIDENTE DE OBRA: ING* TITO EDUARDO HERRERA SABOGAL

COORDINADOR DE OBRA: ING* VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUIA
 JEFE DE SUPERVISION: ING* JULIO VELA ALVARADO
 UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 FECHA: JUNIO, 2021

PLAZO DE EJECUCION: 270 DIAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL: S/ 9,083,704.82 SIN IGV
 PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 8,400,000.00 SIN IGV

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 ING. TITO EDUARDO HERRERA SABOGAL
 RESIDENTE DE OBRA. CIP N° 813970

ING. JULIO VELA ALVARADO
 JEFE DE SUPERVISION
 ING. VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUIA
 COORDINADOR DE OBRA

ING. JULIO VELA ALVARADO
 JEFE DE SUPERVISION
 ING. VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUIA
 COORDINADOR DE OBRA

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR		ACTUAL		AVANCE		ACUMULADO		SALDO			
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	
01.09.02	SEÑALIZACION VERTICAL															
01.09.02.01	SEÑALIZACION RESTRICATIVA OCTAGONALES DE LADOS 0.75X0.75	und	17.00	372.70	6,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	17.00	6,335.90	100.00%
01.09.02.02	SEÑALIZACION PREVENTIVAS 0.60X0.60	und	15.00	345.98	5,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	15.00	5,189.70	100.00%
01.10	AREAS VERDES															
01.10.01	CORTE DE TERRENO EN AREAS VERDES	m3	387.50	45.90	17,766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	387.50	17,766.25	100.00%
01.10.02	RELLENO EN AREAS VERDES E=2"	m3	232.50	48.88	11,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	232.50	11,364.60	100.00%
01.10.03	COLCACON DE TIERRA VEGETAL PARA SEMBRADO DE GRASS	m3	232.50	36.85	8,587.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	232.50	8,587.63	100.00%
01.10.04	SEMBRADO DE GRASS TORBURO	m2	3,875.02	10.80	41,850.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	3,875.02	41,850.22	100.00%
01.10.05	SEMBRADO DE PALMERAS Y/O PLANTAS ORNAMENTALES	und	300.00	27.81	8,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	300.00	8,343.00	100.00%
01.10.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE A UNA DIST. DE 30m + 20% DE AGUA POTABLE	m3	465.00	20.54	9,551.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	465.00	9,551.10	100.00%
02	TRABAJO PRELIMINARES															
02.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR INICIO DE OBRA	m2	2,755.46	1.64	4,518.95	160.82	266.54	609.69	1,000.38	790.81	1,296.53	28.70%	1,964.65	3,222.03	71.30%	
02.01.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO CEQUIRO, para instalacion de tuberia de	m3	2.11	30.96	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.11	65.33	100.00%
02.01.03	RETIRO DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE DE TUBERIA PVC DE 2", con	m	353.85	1.41	498.94	102.94	145.15	0.00	0.00	102.94	145.15	29.09%	290.92	353.80	70.91%	
02.01.04	RETIRO DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE DE TUBERIA PVC DE 3", con	m	136.26	1.48	201.66	97.73	144.64	38.53	57.02	138.26	201.66	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
02.01.05	RETIRO DE TUBERIA DE AGUA EXISTENTE DE TUBERIA PVC DE 4", con	m	1,072.87	1.48	1,587.85	0.00	0.00	615.17	910.45	615.17	910.45	57.34%	457.70	677.40	42.56%	
02.01.06	RETIRO DE CAJAS EXISTENTES DE MEDIDOR DE AGUA, con Herramienta	und	362.00	19.50	7,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	362.00	7,059.00	100.00%
02.01.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE A UNA DIST. DE 30m + 20% DE															
02.02	ESPOQUEAMIENTO CIVIL QUETE															
02.02.01	SISTEMA DE AGUA POTABLE	m3	2.54	20.54	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2.54	52.17	100.00%
02.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, TERRENO NORMAL, PARED DE AGUA	m	2,755.46	12.51	34,470.80	180.82	2,262.06	340.00	4,253.40	520.82	6,515.46	18.90%	2,234.64	27,955.35	81.10%	
02.02.01.02	REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJAS PARED DE AGUA POTABLE	m	2,755.46	1.83	5,042.49	190.82	330.90	340.00	622.20	520.82	953.10	18.90%	2,234.64	4,082.39	81.10%	
02.02.01.03	CAJAS DE ARENA e=0.10m PARED DE AGUA POTABLE	m	2,755.46	4.85	13,363.98	180.82	876.98	340.00	1,640.00	520.82	2,825.98	18.90%	2,234.64	10,838.00	81.10%	
02.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-3, EN RED DE AGUA POTABLE	m3	688.32	48.89	42,452.16	38.76	1,787.20	268.61	14,110.14	325.37	15,907.34	37.47%	542.95	26,544.83	62.53%	
02.02.01.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, PARED DE AGUA	m3	1,364.30	21.13	28,827.66	64.33	1,559.29	349.81	7,391.49	414.14	8,750.78	30.36%	950.16	20,076.88	69.64%	
02.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE A UNA DIST. DE 30m + 20% DE	m3	991.98	20.54	20,375.27	65.09	1,336.55	122.40	2,514.10	187.49	3,851.04	18.90%	804.49	16,524.22	81.10%	
02.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE															
02.02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ISO 4422 - UF DN= 083 MM	m	494.55	11.04	5,459.83	153.16	1,690.89	120.00	1,324.80	273.16	3,015.69	55.23%	221.39	2,444.15	44.77%	
02.02.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ISO 4422 - UF DN= 90 MM	m	2,081.21	15.37	31,988.20	0.00	0.00	220.00	3,381.40	220.00	3,391.40	10.57%	1,851.21	28,806.80	85.43%	
02.02.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ISO 4422 - UF DN= 110 MM	m	179.70	27.83	5,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	179.70	5,001.05	100.00%
02.03	RECOMENDACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE															
02.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
02.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL, TERRENO NORMAL, PICONEX	m	1,158.00	12.51	14,486.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,158.00	14,486.58	100.00%
02.03.01.02	REFINE Y NIVELACION EN FONDO DE ZANJAS PICONEX, DE AGUA POTABLE	m	1,158.00	1.83	2,119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,158.00	2,119.14	100.00%
02.03.01.03	CAJAS DE ARENA e=0.10m PICONEX, DOM. DE AGUA POTABLE	m	1,158.00	4.85	5,616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,158.00	5,616.30	100.00%
02.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-3, PICONEX, DE AGUA POTABLE	m3	277.92	48.36	13,460.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	277.92	13,460.21	100.00%
02.03.01.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, PICONEX, DOM. DE	m3	488.36	21.13	10,276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	488.36	10,276.79	100.00%
02.03.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE A UNA DIST. DE 30m + 20% DE	m3	333.50	20.54	6,860.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	333.50	6,860.09	100.00%
02.03.02	EMPALMES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE															

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05 - MES DE JUNIO

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CALLE 04 DE SETIEMBRE, CALLE URRUMAS, PS-E SECOYA Y ADYACENTES AL AMBITO DE SU INFLUENCIA, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS-REGION LORETO"

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL

RESIDENTE DE OBRA: ING° TITO EDUARDO HERRERA SABOGAL

COORDINADOR DE OBRA: ING° VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA

JEFE DE SUPERVISION: ING° JULIO VELA ALVARADO

UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO

FECHA: JUNIO, 2021

PLAZO DE EJECUCION: 270 DIAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL: S/ 8,063,704.82 SIN IGV

PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 8,400,000.00 SIN IGV

ING° TITO EDUARDO HERRERA SABOGAL
RESIDENTE DE OBRA. CIP N° 81310

ING° JULIO VELA ALVARADO
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO EIRL

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR		ACTUAL		AVANCE		ACUMULADO		RECORRIDO		%	
		Unid.	Metro	P. Unit.	Metro	Valorizado S/.	Metro	Valorizado S/.	Metro	Valorizado S/.	Metro	Valorizado S/.	Metro	Valorizado S/.		
02.03.02.01	EMPALME DE RED NUEVA D=90mm. A RED EXISTENTE D=110mm.	Unid	2.00	272.59	645.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	645.18	100.00%
02.03.02.02	EMPALME DE RED NUEVA D=110mm. A RED EXISTENTE D=160mm.	Unid	1.00	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	272.69	100.00%
02.03.02.03	INSTALACION DE TEE PVC UF D=90mm.	Unid	16.00	44.30	708.80	0.00	0.00	3.00	132.90	3.00	132.90	13.00	575.90	13.00	575.90	81.25%
02.03.02.04	INSTALACION DE TEE PVC UF D=110mm.	Unid	2.00	79.35	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	158.70	100.00%
02.03.02.05	INSTALACION DE CODO PVC UF D=90mm. x 22.5°	Unid	1.00	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	55.05	100.00%
02.03.02.06	INSTALACION DE CODO PVC UF D=110mm. x 22.5°	Unid	2.00	58.55	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	117.10	100.00%
02.03.02.07	INSTALACION DE CODO PVC UF D=90mm. x 45°	Unid	2.00	49.55	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	99.10	100.00%
02.03.02.08	INSTALACION DE CODO PVC UF D=110mm. x 45°	Unid	5.00	73.05	365.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	365.25	100.00%
02.03.02.09	INSTALACION DE CODO PVC UF D=90mm. x 90°	Unid	2.00	61.05	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	122.10	100.00%
02.03.02.10	INSTALACION DE CODO PVC UF D=110mm. x 90°	Unid	8.00	55.25	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	442.00	100.00%
02.03.02.11	INSTALACION DE CODO PVC UF D=90mm. x 90°	Unid	1.00	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	58.05	100.00%
02.03.02.12	INSTALACION DE REDUCCION PVC UF D=90mm. A 63mm.	Unid	0.00	52.82	315.12	0.00	0.00	2.00	105.04	2.00	105.04	2.00	105.04	2.00	210.08	66.97%
02.03.02.13	INSTALACION DE REDUCCION PVC UF D=110mm. A 90mm.	Unid	5.00	63.68	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	318.40	100.00%
02.03.02.14	INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA F.F.F. MAZZA 2"	Unid	4.00	280.36	1,161.44	0.00	0.00	1.00	280.36	1.00	280.36	1.00	280.36	1.00	871.08	75.00%
02.03.02.15	INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA F.F.F. MAZZA 3"	Unid	15.00	351.49	5,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5,272.35	100.00%
02.03.02.16	INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA F.F.F. MAZZA 4"	Unid	1.00	386.79	386.79	0.00	0.00	1.00	386.79	1.00	386.79	1.00	386.79	1.00	386.79	100.00%
02.03.02.17	INSTALACION DE TAPON DE P.V.C. D=63mm.	Unid	5.00	86.53	432.65	0.00	0.00	2.00	173.06	2.00	173.06	2.00	173.06	2.00	346.12	100.00%
02.03.02.18	INSTALACION DE TAPON DE P.V.C. D=90mm.	Unid	9.00	86.53	778.77	0.00	0.00	1.00	86.53	1.00	86.53	1.00	86.53	1.00	86.53	11.11%
02.03.02.19	RECONEXION DOMICILIARIAS DE AGUA 2" A 1/2" INC. CALA DOMICILIARIA	Unid	68.00	490.48	27,232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	27,232.64	100.00%
02.03.02.20	RECONEXION DOMICILIARIAS DE AGUA 3" A 1/2" INC. CALA DOMICILIARIA	Unid	208.00	402.38	119,104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	119,104.48	100.00%
02.03.02.21	RECONEXION DOMICILIARIAS DE AGUA 4" A 1/2" INC. CALA DOMICILIARIA	Unid	30.00	412.24	12,367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	12,367.20	100.00%
02.03.02.22	SUMINISTRO DE GRIFO CANCELADO HO DNTCL 2 BOCAS TIPO POSTE	Unid	1.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,600.00	100.00%
02.03.02.23	SUMINISTRO DE GRIFO CANCELADO TIPO POSTES 2 BOCAS INC. ANCLAJE	Unid	1.00	432.70	432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	432.70	100.00%
02.03.02.24	PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE PVC D= 4", 3" Y 2"	m	2,755.46	2.90	7,990.83	60.00	145.00	0.00	0.00	50.00	146.00	0.00	0.00	2,705.46	7,844.83	98.19%
02.04	VARIOS															
02.04.01	SOLADO PARA RESANE DE PAVIMENTO Metro 1:10 m ² vecoado con	m ²	10.57	16.41	173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57	173.45	100.00%
02.04.02	RESANE DE LOSA DE RODADURA MORTERO H=210kg/cm ²	m ³	2.11	517.38	1,091.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	1,091.67	100.00%
02.04.03	CRUCE ESPECIAL C-1 DE TUBERIA DE AGUA POR CANAL PLUVIAL INC. DADO	Unid	4.00	605.37	2,421.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,421.48	100.00%
02.04.04	CRUCE ESPECIAL C-2 DE TUBERIA DE AGUA POR CANAL PLUVIAL INC. DADO	Unid	6.00	458.24	2,749.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2,749.44	100.00%
02.04.05	CRUCE ESPECIAL C-3 DE TUBERIA DE AGUA POR CANAL PLUVIAL INC. DADO	Unid	5.00	504.42	2,522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2,522.10	100.00%
03	DRENAJES PLUVIALES															
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES															
03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR INICIO DE OBRA	m ²	3,927.50	1.64	6,441.10	3,191.28	5,233.70	197.10	323.24	3,388.38	5,556.94	3,388.38	5,556.94	539.12	884.16	13.73%
03.01.02	DEMOLICION CANAL DE MORTERO ARMADO EXISTENTE CON EQUIPO	m ³	574.89	35.51	20,414.34	279.67	9,831.08	259.22	9,204.90	538.89	18,135.98	538.89	18,135.98	36.00	1,278.36	6.25%
03.02	DEMOLICION DE BUZONES															
03.02.01	BUZON H=0.50 - 1.50	Unid	7.00	23.59	165.13	4.00	94.36	0.00	0.00	4.00	94.36	4.00	94.36	3.00	70.77	42.86%
03.02.02	BUZON H=1.51 - 2.00	Unid	4.00	24.84	99.36	3.00	74.52	0.00	0.00	3.00	74.52	3.00	74.52	1.00	24.84	25.00%
03.02.03	BUZON H=2.01 - 2.50	Unid	3.00	26.22	78.66	0.00	0.00	2.00	52.44	2.00	52.44	2.00	52.44	1.00	26.22	33.33%
03.02.04	BUZON H=2.51 - 3.00	Unid	1.00	26.97	26.97	0.00	0.00	1.00	26.97	1.00	26.97	1.00	26.97	0.00	0.00	0.00%
03.02.05	RETIRO DE TUBERIA PVC DE DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE DE D=12",	m	681.34	8.73	5,948.10	572.30	4,896.16	109.04	951.82	581.34	5,948.10	581.34	5,948.10	0.00	0.00	0.00%
03.03	ENTIBADO															
03.03.01	ENTIBADO PARA PROTECCION DE ZANJAS H=1.80	m ²	635.86	54.62	34,785.29	635.86	34,785.29	0.00	0.00	635.86	34,785.29	635.86	34,785.29	0.00	0.00	0.00%
03.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS															

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 05 - MES DE JUNIO

MEJORAMIENTO DE LA CALLE 04 DE SETIEMBRE, CALLE SECOWA Y ADYACENTES AL AMBITO DE SU INFLUENCIA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS-REGION LORETO

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 RESIDENTE DE OBRA: ING° TITO EDUARDO HERRERA SABOGAL
 COORDINADOR DE OBRA: ING° VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA
 JEFE DE SUPERVISION: ING° JULIO VELA ALVARADO
 UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 FECHA: JUNIO, 2021

PLAZO DE EJECUCION: 270 DIAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL: S/ 8,063,704.82 SIN IGV
 PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 8,400,000.00 SIN IGV

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 ING° TITO EDUARDO HERRERA SABOGAL
 RESIDENTE DE OBRA, CIP N° 81970

ING° VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA
 COORDINADOR DE OBRA

CONSORCIO BDA
 ING° JULIO VELA ALVARADO
 JEFE DE SUPERVISION

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR		ACTUAL		AVANCE		ACUMULADO		SALDO			
		Unid.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	Metrado	Valorizado S/.	%	Metrado	Valorizado S/.	%	
03.04.01	EXCAVACIONES															
03.04.01.01	EXCAVACION DE ZANJA CON MACINARIA HASTA COTA DE FONDO DE	m3														
	ALCANTARILLA		2,676.02	5.57	14,905.43	2990.04	14,426.52	0.00	0.00	2,590.04	14,426.52	96.79%	85.98	478.91	3.21%	
03.04.01.02	EXCAVACION DE ZANJA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS A CAVAL (H.	m3	1,053.78	47.07	49,601.42	954.72	44,938.67	0.00	0.00	954.72	44,938.67	90.62%	99.06	4,662.75	9.40%	
03.04.02	RELLENOS															
03.04.02.01	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-2-4, EN ZANJA DE	m3	794.28	62.31	49,491.59	1149.90	71,650.27	0.00	0.00	1,149.90	71,650.27	144.77%	-355.62	-22,168.68	-44.77%	
03.04.02.02	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO A-3, EN ZANJA DE CONEXIONES	m3														
	DOMICILIARIAS A CAVAL (H.promedio=1.60m)		824.42	51.98	42,653.35	200.38	10,415.75	155.18	8,066.26	355.55	18,482.01	43.13%	488.86	24,371.34	56.87%	
03.04.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	394.10	19.70	7,763.77	169.20	3,333.24	108.10	2,129.57	277.30	5,462.81	70.36%	116.80	2,900.96	29.64%	
03.04.02.04	NIVELACION Y REGLADO	m2	1,918.60	3.19	6,120.33	1051.05	3,352.85	834.04	2,022.59	1,685.09	5,375.44	87.83%	233.51	744.90	12.17%	
03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE															
03.05.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DIST. DE 36m + 20% DE	m3	7,049.97	20.54	144,806.38	4442.21	91,242.99	233.18	4,789.52	4,675.39	96,032.51	66.32%	2,374.58	48,773.07	32.68%	
03.06	ESPOSUMIENTO C/OLOQUETE															
03.06.01	OBRAS DE MORTERO ARMADO															
03.06.01.01	ALCANTARILLADO DE MORTERO ARMADO DE SECCION VARIABLE	m2	1,901.37	27.46	52,249.65	1262.56	34,420.35	533.43	14,656.66	1,765.90	48,070.01	93.83%	116.38	3,170.64	6.07%	
03.06.01.02	SOLADO PARA CAVAL RECTANGULAR Mezcla, C.A. 1:10 e-f' veceado con	m2	782.08	575.58	450,138.09	460.25	264,910.70	50.40	29,009.23	510.65	283,919.93	65.30%	271.41	166,218.17	34.70%	
03.06.01.03	MORTERO (c=210kg/m3 (Canal Rectangular)	m2	6,587.20	41.22	271,524.38	3921.13	161,028.88	424.13	17,482.64	4,345.26	179,111.62	65.97%	2,241.84	92,412.77	34.03%	
03.06.01.04	ACERO DE REFUERZO Ø 10", Fy = 4,200 kg/cm2 incluye Doblado + 6%	kg	25,928.78	5.86	151,942.53	6955.00	40,756.30	5908.40	34,611.50	12,861.40	75,367.80	49.60%	13,067.36	76,574.73	50.40%	
03.06.01.05	ACERO DE REFUERZO Ø 3/8", Fy=4200 kg/cm2 incluye Doblado + 5%	kg	88,083.16	6.86	340,367.32	47892.68	290,651.10	7488.95	43,855.25	55,381.63	304,536.35	95.35%	2,701.53	15,830.97	4.65%	
03.06.01.06	REVESTIMIENTO PULIDO DE CANAL RECTANGULAR	m2	3,406.85	18.74	63,844.37	2516.90	47,204.19	220.38	4,129.92	2,729.28	51,334.11	80.41%	607.57	12,510.28	19.59%	
03.06.01.07	CURADO DE CANAL RECTANGULAR, con material de préstamo	m2	1,093.37	2.05	2,241.41	671.06	1,46.64	742.59	1,522.31	67.92%	350.78	719.10	31.08%			
03.06.01.08	JUNTA DE DILATACION EN LOSA SUPERIOR CON MORTERO ASFALTICO	m	132.50	5.41	716.83	104.10	583.18	0.00	0.00	104.10	583.18	78.57%	28.40	153.64	21.43%	
03.06.01.09	JUNTA DE DILATACION EN LOSA INFERIOR Y PAREDES CON WATER STOP	m	447.80	26.07	11,228.85	407.80	10,223.55	0.00	0.00	407.80	10,223.55	91.05%	40.10	1,005.31	8.95%	
03.06.02	BUZONES DE INSPECCION															
03.06.02.01	BUZON TIPO MORTERO ARMADO D=1.2M F'C=210KG/CM2															
03.06.02.01.01	BUZON DE MORTERO ARMADO HASTA H=1.50M Inc. Tapa de Mortero	und	22.00	2,114.88	46,937.36	8.00	16,919.04	2.00	4,228.76	10.00	21,148.80	45.45%	12.00	26,378.56	54.55%	
03.06.02.01.02	BUZON DE MORTERO ARMADO HASTA H=2.00M Inc. Tapa de Mortero	und	7.00	2,415.91	16,911.37	2.00	4,831.82	1.00	2,415.91	3.00	7,247.73	42.88%	4.00	9,663.64	57.14%	
03.06.02.01.03	BUZON DE MORTERO ARMADO HASTA H=3.00M Inc. Tapa de Mortero	und	1.00	3,750.49	3,750.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	3,750.49	100.00%	
03.06.02.01.04	BUZON DE MORTERO ARMADO HASTA H=3.50M Inc. Tapa de Mortero	und	1.00	4,176.32	4,176.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	4,176.32	100.00%	
0.07	SISTEMA DE DRENAJE DE CAJA DE REGISTRO A CAVAL															
0.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO SEPARATIVAS	und	171.00	235.17	40,214.07	130.00	30,572.10	41.00	9,641.97	171.00	40,214.07	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
0.07.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC LF ISO 4435 - D=8" (200mm)	und	386.00	342.62	132,251.32	153.00	52,420.86	41.00	14,047.42	194.00	66,468.28	50.26%	192.00	65,783.04	49.74%	
0.08	SISTEMA DE DRENAJE AUXILIAR															
0.08.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA DESAGUE AUXILIAR	m3	633.45	38.95	24,672.88	563.91	21,570.50	46.35	1,768.77	599.17	23,337.67	94.59%	34.28	1,336.21	5.41%	
0.08.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA	m	1,508.22	1.83	2,760.04	1318.59	2,413.02	108.00	197.64	1,426.59	2,010.66	94.59%	81.63	140.38	5.41%	
0.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL D=8" CP	m	3,016.44	22.06	66,352.53	1768.59	40,076.25	216.00	4,894.56	1,984.59	44,970.81	65.79%	1,031.85	23,361.72	34.21%	
0.08.04	EMPALME DE DRENAJE PLUMAL AUXILIAR A SISTEMA EXISTENTE INC.	und	50.00	20.18	1,009.00	36.00	726.48	40.00	201.80	46.00	928.28	92.00%	4.00	80.72	8.00%	
0.08.05	CONEXIONES PROVISIONALES A RED AUXILIAR	und	388.00	54.98	21,222.28	200.00	10,995.00	41.00	2,254.18	241.00	13,250.18	62.44%	145.00	7,972.10	37.56%	
0.08.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A UNA DIST. DE 36m + 20% DE	m3	760.14	20.54	15,613.28	664.57	13,650.27	54.43	1,117.99	719.00	14,768.26	94.59%	41.14	845.02	5.41%	
0.09	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA															
0.09.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE	und	1.00	9,000.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	1.00	9,000.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
0.09.02	SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	und	5.00	32,225.00	161,125.00	3.50	112,787.50	0.50	16,112.50	4.00	128,900.00	80.00%	1.00	32,225.00	20.00%	

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA Nº 05 - MES DE JUNIO

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CALLE 04 DE SEPTIEMBRE, CALLE URARINAS, PS. JE SECOVA Y ADYACENTES AL AMBITO DE SU INFLUENCIA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS-REGION LORETO

PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
 CONTRATISTA: CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 RESIDENTE DE OBRA: ING* TITO EDUARDO HERRERA SABOGAL
 COORDINADOR DE OBRA: ING* VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA
 JEFE DE SUPERVISION: ING* JULIO VELA ALVARADO
 UBICACION: IQUITOS - MAYNAS - LORETO
 FECHA: JUNIO. 2021

PLAZO DE EJECUCION: 270 DIAS CALENDARIOS
 VALOR REFERENCIAL: S/ 9,083,704.82 SIN IGV
 PRESUPUESTO CONTRATADO: S/ 8,400,000.00 SIN IGV

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES EIRL
 ING. TITO EDUARDO HERRERA SABOGAL
 RESIDENTE DE OBRA. CIP N° 81970

ING. JULIO VELA ALVARADO
 JEFE DE SUPERVISION
 TITULAR - GERENTE

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			ANTERIOR		ACTUAL		AVANCE		ACUMULADO		SALDO	
		Und.	Metrado	P. Unit.	Presup.	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado	Valorizado	Metrado
23.09.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD													
23.09.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	906	1.00	10,950.00	10,950.00	0.81	8,678.50	0.20	2,100.00	0.81	8,689.50	0.19	2,080.50	19.00%
23.10	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	906	1.00	17,068.96	17,068.96	0.56	9,558.02	0.20	3,413.79	0.76	12,972.41	0.24	4,095.55	24.00%
23.10.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	8,261.01	1.38	11,477.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.01	11,427.79	100.00%
	COSTO DIRECTO (CD)		6,085,167.03		6,653,033.98		1,978,183.76		1,422,055.06		3,400,238.82		3,254,815.24	
	GASTOS GENERALES (13.1778910216084% de CD)		501,580.28		978,649.70		260,580.03		197,322.92		447,902.95		428,746.75	
	UTILIDAD (10.00%)		608,516.70		668,505.40		197,978.38		142,205.51		340,023.88		328,481.52	
	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19		202,790.92		202,790.92		50,129.28		22,532.32		112,661.60		50,129.32	
	SUB TOTAL SIN IGV S/		7,698,054.93		8,400,000.00		2,526,771.45		1,774,115.81		4,300,827.25		4,095,172.83	
	PRESUPUESTO TOTAL SIN IGV S/				8,400,000.00		2,526,771.45		1,774,115.81		4,300,827.25		4,095,172.83	
	PROCENTAJE DE AVANCE DE OBRA				100.00%		30.68%		21.12%		51.20%		48.89%	

CONSEJO DIRECTOR
 ING. JULIO VELA ALVARADO
 JEFE DE SUPERVISION
 (REG. S. N. 152473)

**PANEL FOTOGRAFICO VALORIZACION N°05 DEL 01 AL 30
DE JUNIO DEL 2021**


**FOTOGRAFÍA 01: EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN LAS INTERCEPCIONES DE LA CALLE
URARINAS/26 DE MAYO Y PASAJE SECOYA.**



**FOTOGRAFÍA 02: ENCOFRADO DE BUZON EN LA INTERCEPCION DE PASAJE ARMANDO
FORTES Y CALLE URARINAS**



FOTOGRAFÍA 05: SOLADO EN LA CALLE 26 DE MAYO

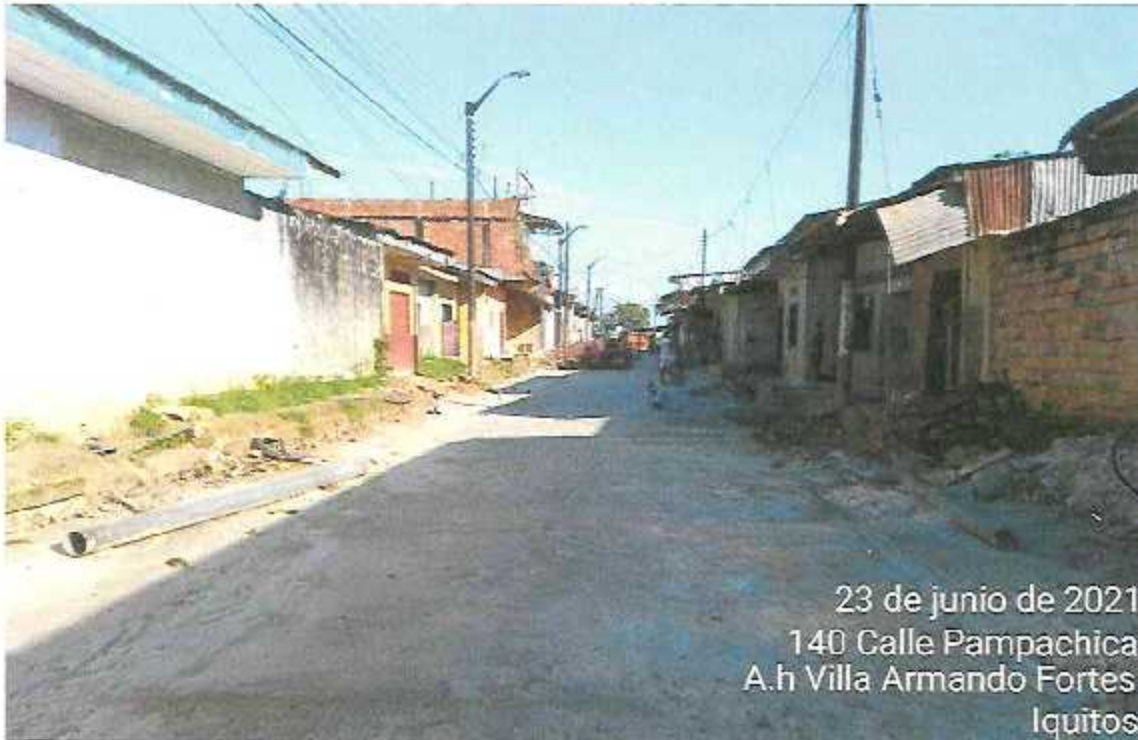

FOTOGRAFÍA 06: BUZON EN LA INTERCEPCION CALLE URARINAS CON PASAJE SECOYA



CONSORCIO SDRL
ING. JULIO VELA ALVARADO
M.P. N° 10845

CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. MICHAEL NASHINATE
TITULAR - GERENTE

FOTOGRAFÍA 07: RELLENO A NIVEL DE SUB RASANTE EN LA CALLE BELAUDE



**FOTOGRAFÍA 08: CONEXIONES AUXILIARES CON TUBO DE 6" EN LA CALLE 4 DE
SETIEMBRE**



FOTOGRAFÍA 09: HABILITACION DE ACERO Y ENCOFRADO DE ALCANTARILLA EN LA CALLE URARINAS



25 de junio de 2021

FOTOGRAFÍA 10: CONEXIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAS EN LA INTERCEPCION DE LA CALLE 26 DE MAYO Y CALLE URARINAS



23 de junio de 2021

166 Calle 26 de Mayo
A.h Villa Armando Fortes
Iquitos
Mazas

CONSORCIO SORI
ING. JULIO VERA ALVARO
JEFE DE SUPERVISIÓN
PROYECTO

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. JUAN CABALLERO NASHIMATE
RESIDENTE DE OBRAS CIVILES

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
ING. JUAN CABALLERO NASHIMATE
TITULAR GERENTE

FOTOGRAFÍA 11: TARRAJEO EN MUROS DE CANAL EN LA CALLE URARINAS



FOTOGRAFÍA 12: VACIADO DE MORTERO ARMADO EN TECHO DE ALCANTARILLA EN LA CALLE URARINAS



CONSORCIO DDRI
ALICIA M. A. TORO
INGENIERA DE SISTEMAS
REGL. DIF. N.º 14745

FOTOGRAFÍA 13: HABILITACION DE ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA



FOTOGRAFÍA 14: RELLENO EN EL PASAJE SECOYA A NIVEL DE SOBREECAVACION



~~CONSORCIO SORL~~
JULIO VELA ALVARADO
EFE DE SUPERVISION
RUC: 201101101101

~~CONSORCIO SORL~~

CABALLERO CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

25 de junio de 2021

FOTOGRAFÍA 15: HABILITACION DE ESTRUCTURA DE TECHO EN LA CALLE URARINAS



FOTOGRAFÍA 16: RELLENO A NIVEL DE SUB RASANTE EN LA CALLE 04 DE SETIEMBRE



**FOTOGRAFÍA 17: RELLENO EN EL PASAJE PABLO CHAVEZ A NIVEL DE SOBRE
EXCAVACION**



FOTOGRAFÍA 18: VACIADO DE CANAL EN LA CALLE URARINAS



FOTOGRAFÍA 19: EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE



FOTOGRAFÍA 20: HABILITACION DE MADERA PARA ENCOFRADO DE LOSA DE PAVIMENTO



AS DE PA...
...
