

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Belén, 08 de julio de 2021



Oficio n° 2081-2021-GRL-GRI-SGSyC

Ing. Mag. Artemio Del Águila Panduro
Gerente Regional de Infraestructura
Presente



Asunto: Remite Valorización de Obra n° 03 - Junio 2021.

Obra: "Mejoramiento de la Calle Arturo Fernández entre la Calle Nuevo México y la Vía Mazan – Indiana en la Localidad de Mazan, Distrito de Mazan – Maynas - Loreto".

Ref. : a. Informe n° 233-2021-GRL/GRI-SGSyC-JAZP
b. Carta n° 032-2021-CONS.PAV.M

Tengo el agrado de saludarle, a su vez alcanzarle la documentación de la Valorización de obra n° 03 correspondiente a junio de 2021, que asciende a la suma de **Cuatrocientos Ochenta y cuatro Mil Novecientos cincuenta y cuatro con 76/100 soles (S/. 484,954.76)**, presentada, revisada y aprobada por el Inspector según la referencia a), de acuerdo al siguiente detalle:

Valorización Bruta N° 03 - junio 2021	S/. 1 009,358.41
Reajuste	S/. 0.00
Amortización de Adelanto Directo	S/. - 151,403.76
Amortización de Adelanto de Materiales	S/. - 372,999.41
Neto a Pagar	S/. 484 954.76

Asimismo, la ejecución de la obra a junio del 2021 tiene un avance real ejecutado acumulado de 24.19% versus un programado de 20.61%, por lo tanto la Obra se encuentra atrasada en un 3.58%.

Se remite la conformidad de la valorización, para continuar con el trámite respectivo a favor de **CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN**, conforme lo detallan los documentos de la referencia,

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. RAÚL FLORÉS AGUAPUCHO
Sub Gerente de Supervisión y Control
CIP. 53353

Copia: SGSyC – File de obra (01)
SGSyC – File correlativo (01)
SGSyC – File personal (01)
TRAMITE: 15627
RFA – S.G.
dap – Sec.



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



Rio Amazonas
IQUITOS - PERÚ
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

INFORME N° 233 -2021-GRL/GRI/SGSyC/JAZP

Al : **ING. RAUL FLORES AQUEPUCHO**
Sub Gerente de Supervisión y Control

Del : **ING. JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ**
Inspector de Obra

Asunto : Entrega de Valorización N° 03.
Proyecto: "Mejoramiento de la Calle Arturo Fernández entre la Calle Nuevo México y la Vía Mazán – Indiana en la Localidad de Mazán, Distrito de Mazán – Maynas - Loreto". Código Unico 2300290.

Referencia : 1 CARTA N° 032-2021-CONS.PAV M. (05/07/2021).
2 PROVEIDO N° 15627 (SGSyC).

Fecha : Iquitos, 06 de Julio de 2021



Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente e informar sobre lo indicado en el asunto.

DATOS GENERALES

Obra : "Mejoramiento de la Calle Arturo Fernández entre la Calle Nuevo México y la Vía Mazán – Indiana en la Localidad de Mazán, Distrito de Mazán – Maynas - Loreto". Código Unico 2442962

Entidad : Gobierno Regional de Loreto.

Proceso de Selección : Licitación Pública N° 026-2020-CSO-GRL-1 – CONVOCATORIA 1.

Sistema de Contrato : A Precios Unitarios.

Otorgamiento de la Buena Pro : 22-Diciembre-2020.

Contratista : **CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN.**

Valor Contractual : S/. 10'228,044.13 Sin IGV.

Suscripción del Contrato : 13-Enero-2021.

Plazo de ejecución Contractual : 270 días calendario.

Fecha de Entrega de Terreno : 28-Enero-2021.

Entrega Adelanto Directo : 01-Marzo-2021.

Fecha de inicio contractual : 02-Marzo-2021.

Fecha de término contractual : 26-Noviembre-2021.

Suspensión de plazo ejecución : 02/Marzo-2021.

Fecha de Reinicio Contractual : 05-Abril-2021.

Término de Plazo Contractual : 09-Enero-2022.

Fecha de Recepción de la Obra : .

Residente de Obra : Ing° Paul Edilberto Alfaro Sandoval.

Inspector de Obra : Ing° José Armando Zumarán Pérez.

ANTECEDENTES

- Con fecha 03 de Setiembre de 2020, mediante la Resolución Gerencial Regional N° 141-2020-GRL-GRI, se aprobó el Expediente técnico del Proyecto.
- Con fecha 22 de Diciembre de 2020, el Comité de Selección de Obras adjudicó la buena pro de la Licitación Pública N° 026-2020-CSO-GRL-1 – CONVOCATORIA-1, para la contratación de la ejecución de la obra denominada **MEJORAMIENTO DE LA CALLE**



BICENTENARIO
PERÚ 2021

LORETO
GOBIERNO REGIONAL
compromiso con **TODOS**



RIO Amazonas
Bosque Tropical, Maravilla Natural del Mundo

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

LOCALIDAD DE MAZÁN, DISTRITO DE MAZÁN - MAYNAS - LORETO al CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN; consorcio conformado por las empresas LORINSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.TDA., con RUC N° 20103921288 y la empresa CONSTRUCTORA MIDATO E.I.R.L., con RUC N° 20567237061.

ANALISIS

Se ha tomado conocimiento de la Valorización N° 03 presentada mediante documento 1 de la referencia, practicada por el Residente y el Inspector, cuyo contenido pasamos a evaluar.

De la revisión de las copias del Cuaderno de Obra, el Ing° Residente, Paul E. Alfaro Sandoval, en su Asiento N° 059 del cuaderno de obra (páginas 39 y 40), de fecha 30 de Junio de 2021, presenta los metrados ejecutados, para la elaboración de la Valorización N° 03. El Inspector, mediante Asiento N° 60 del cuaderno de obra (página 41) aprueba dichos metrados y, en forma conjunta, elaboran la Valorización N° 03 de Junio de 2021.

La Valorización N° 02 arroja el siguiente resultado en forma global:


Valorización Contractual	S.	1,009,358.41	
Reajuste Valorización Obra N° 03		0.00	1,009,358.41
Amortización Adelanto Directo	(-)	151,403.76	
Amortización Adelanto Materiales	(-)	372,999.89	524,403.65
Sub total			484,954.76
Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento			0.00
TOTAL VALORIZADO S.			<u>484,954.76</u>

Monto valorización : S/ 1,009,358.41

VALOR ACUMULADO: S/ 10,228,044.13 (sin IGV) AVANCE **9.87%.**


PERIODO	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			ESTADO (adelantada / atrasada)
	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	PARCIAL	ACUMULADO	% ACUM	
abr-21	372,611.43	372,611.43	3.64%	388,405.41	388,405.41	3.80%	ADELANTADA
may-21	738,578.21	1,111,189.64	10.86%	710,477.70	1,098,883.11	10.74%	ATRASADA
jun-21	1,362,840.94	2,474,030.58	24.19%	1,009,358.41	2,108,241.52	20.61%	ATRASADA
jul-21	1,305,855.27	3,779,885.85	36.96%				
ago-21	1,681,877.88	5,461,763.73	53.40%				
sep-21	1,598,755.94	7,060,519.67	69.03%				
oct-21	1,516,123.57	8,576,643.24	83.85%				
nov-21	1,141,228.38	9,717,871.62	95.01%				
dic-21	510,172.51	10,228,044.13	100.00%				
	10,228,044.13			2,108,241.52			

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the Subgerencia de Supervisión y Control.



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

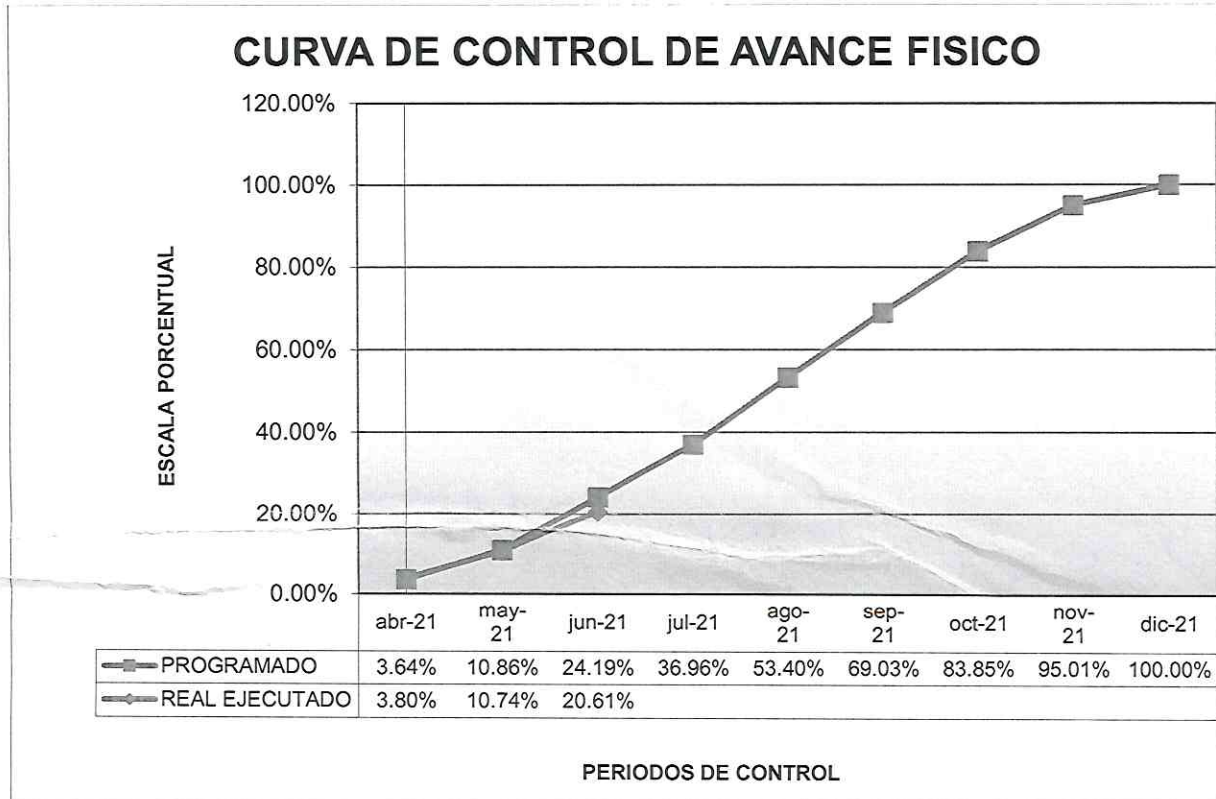

CONCLUSION

Se ha cumplido con presentar toda la documentación pertinente de la Valorización N° 03 del Contratista, en consecuencia, se da la aprobación. De acuerdo al CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA vigente, el porcentaje de avance programado acumulado para el mes de Junio 2021 es de 24.19% y el avance de obra acumulado real es de 20.61%, por lo tanto la obra se encuentra **atrasada** en un 3.58%.


RECOMENDACION

Continuar con el trámite respectivo para el pago de la Valorización N° 03 por un monto de **S/ 484,954.76 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro con 76/100 Soles)**, correspondiente.


Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Sub. Gerencia de Supervisión y Control


JOSE ARMANDO ZUMARAN PEREZ
Ingeniero Civil
CIP. N°10738

José Armando Zumarán Pérez
Ingeniero Civil



"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Iquitos, 05 de julio del 2021
05 JUL. 2021
Nombre: J. B. M. Firma: [Signature]
Reg. N°

ORIGINAL

CARTA N°032-2021-CONS.PAV. M.

Señores:
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
Gerencia Regional de Infraestructura
Ing. Kenyo Alberto Montes Cuellar CIP:195722

Inspector de Obra
Av. Abelardo Quiñones Km. 1.5, Belén Maynas, Loreto

Presente. -

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control
15627
05 JUL 2021
Nombre: [Signature] Fecha: [Signature]
CONTROL RECEPCIÓN

ASUNTO: ENTREGA DE VALORIZACIÓN N° 03

REF: CONTRATO DE OBRA N°007-2021-GRL-GRI

OBRA: "Mejoramiento de la calle Arturo Fernández entre la calle nuevo México y la vía Mazan- Maynas- Loreto"

De mi consideración:

Grato es dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacer entrega de la Valorización N°03 de la obra en referencia correspondiente al mes de junio.

Sin otro particular me suscribo de usted esperando su conformidad a la presente.

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de Supervisión y Control
06 JUL 2021
Fecha: 15627 Hora: 8:32 AM
N° Reg:

ORIGINAL
01/07/21
SUPERVISION Y CONTROL
EVALUACION
Se adjunta
• Valorización original
• Valorización 03 copias
06/07/21

[Signature]
ARQ. RTO R. BEATEGUI DEL CASTILLO
CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN
REPRESENTANTE COMUN

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN
S/N. 10,228,044.13

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CALLE ARTURO FERNANDEZ ENTRE LA CALLE NUEVO MEXICO Y LA VIA MAZAN - INDIANA EN LA CLOACIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO

VALORIZACION DEL CONTRATO PRINCIPAL
VALORIZACION MENSUAL N° 02

(Sin IGV; art. 13° Ley 27037)

DEL 01-Jun-21 AL 31/06/2021

SUPERV.: ING KENYO ALBERTO MONTES
RESIDENTE: Ing. PAUL ALFARO SANDOVAL

UBICAC: MAZAN
DISTRITO: MAZAN
PROV: MAYNAS
REGION: LORETO

UND	PREMIUMUESTO CONTRATADO	P.UNIT.	PRESUP.	A V A N C E D E		O B R A		SALDOS POR	
				MEETRADO	SI.	VALOR SI.	PTIE. VALORIZACION	VALOR SI.	VALORIZAR
und	2.00	1,958.12	3,916.24	3,916.24	2.00	3,916.24	100.00%	0.00	0.00
mes	9.00	2,000.00	18,000.00	4,000.00	2.00	2,000.00	33.33%	6.00	12,000.00
und	10.00	881.43	8,814.30	2,046.75	3.00	6,000.00	66.67%	2.00	1,384.50
und	10.00	881.43	8,814.30	3,525.72	4.00	2,729.00	50.00%	5.00	4,407.15
ton	2,386.55	340.00	812,107.00	102,421.40	477.71	835.99	35.00%	1,552.56	527,869.55
GLB	1.00	20,000.00	20,000.00	-0,000.00	0.50	10,000.00	50.00%	0.50	10,000.00
m2	28,933.00	2.22	64,242.36	38,853.11	17,501.40	21,561.40	74.51%	7,376.60	16,378.05
m2	24,801.00	1.64	40,678.56	13,240.80	5,707.20	16,720.80	67.41%	8,083.20	13,256.45
m2	960.00	30.11	28,908.00	2,044.00	67.14	688.00	71.67%	272.00	8,169.92
día	216.00	120.13	25,948.08	5,525.68	30.00	76.00	35.19%	140.00	16,818.20
DIA	270.00	14.75	3,982.50	828.00	30.00	442.50	31.85%	184.00	2,714.00
m3	21,383.54	10.14	216,595.88	100,942.89	9,954.92	12,597.42	58.98%	8,763.12	88,838.04
m3	157.58	44.96	7,089.29	7,089.29	157.68	7,089.29	100.00%	0.00	29,602.92
m3	4,465.86	10.14	45,263.54	-2,643.36	297.56	5,017.26	34.60%	2,919.42	20,979.36
M2	14,882.40	3.40	50,600.16	33,990.40	1,656.00	8,712.00	58.54%	6,170.40	5,456.25
M2	3,676.85	2.53	9,307.49	3,001.34	335.93	1,522.23	41.38%	2,156.62	0.00
m2	126.90	2.53	321.06	321.06	126.90	126.90	100.00%	0.00	273,423.84
M3	3,915.90	113.60	399,178.04	38,624.00	767.00	1,107.00	31.50%	2,406.90	136,825.62
M3	1,736.95	113.60	199,589.52	9,312.00	382.50	552.50	31.45%	1,204.45	217,311.12
M3	2,786.45	113.60	314,995.12	30,672.00	607.50	877.50	31.45%	1,912.95	166,348.36
M3	31,173.50	13.41	416,103.69	116,342.01	4,677.95	17,282.28	55.43%	13,886.22	10,591.35
m2	13,533.65	36.66	496,334.24	1,811,829.11	2,947.50	2,947.50	21.77%	2,976.48	310.88
m3	2,976.48	643.32	1,911,829.11	189,995.32	3,472.56	3,472.56	100.00%	3,472.56	138,485.68
m3	3,472.56	39.88	138,485.68	27,383.62	1.84	14,882.40	14.882.40	14,882.40	27,383.62
M2	14,882.40	4.43	65,811.72	31,128.72	7,981.92	7,981.92	100.00%	7,981.92	16,292.65
ML	7,026.80	4.43	31,128.72	7,981.92	16,292.65	16,292.65	100.00%	16,292.65	9,890.26
m	1,656.00	4.82	7,981.92	16,292.65	9,890.26	9,890.26	100.00%	9,890.26	20,072.19
m	3,304.80	4.93	16,292.65	39,341.81	4.87	20,072.19	4.87	4,121.60	39,341.81
m	2,067.00	4.78	9,890.26	2,067.00	4.87	20,072.19	4.87	4,121.60	2,067.00
KG	4,121.60	4.87	20,072.19	39,341.81	4.87	20,072.19	4.87	4,121.60	2,067.00
KG	8,072.40	4.87	39,341.81	2,067.00	4.87	20,072.19	4.87	4,121.60	2,067.00
KG	2,624.76	4.87	12,884.85	8,436.40	2.62	12,884.85	4.87	2,624.76	8,436.40
und	3,220.00	2.62	8,436.40	4,449.00	20.63	4,449.00	100.00%	4,449.00	4,744.90
und	230.00	20.63	4,744.90	13,834.26	10,098.00	10,098.00	100.00%	10,098.00	13,834.26
und	10,098.00	1.37	13,834.26	13,140.11	113.6	5,532.32	113.6	113.6	13,140.11
M3	115.67	113.6	13,140.11	6,970.62	57.94	6,970.62	113.6	57.94	6,970.62
M3	57.94	113.6	6,970.62	13,140.11	115.67	13,140.11	113.6	115.67	13,140.11
M3	115.67	113.6	13,140.11	643.32	74,412.02	4,916.81	115.67	74,412.02	4,916.81
M2	123.29	39.88	4,916.81	112.20	123.29	123.29	100.00%	123.29	112.20
KG	23.04	4.87	112.20	1,888.28	4.87	1,888.28	100.00%	4.87	1,888.28
KG	244.00	4.87	1,888.28	4,716	2.62	4,716	100.00%	4.87	4,716
und	18.00	2.62	4,716	20.63	2.62	4,716	100.00%	2.62	4,716
und	4.00	20.63	82.52	1,064.16	1.84	1,064.16	100.00%	4.00	82.52
m2	578.35	1.84	1,064.16	0	0	0	0.00%	578.35	1,064.16
M2	2,067.00	23.1	47,747.70	0	0	0	0.00%	2,067.00	47,747.70
M3	671.78	577.15	387,717.63	101.50	53,560.73	101.50	15.11%	570.28	329,137.10

CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN
REPRESENTANTE COMUN

PAUL ALFARO SANDOVAL
Ingeniero Civil
C.O.P. 4995 (6)

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

UBICACION: MAZAN

DISTRITO: MAZAN

PROV.: MAYNAS

REGION: LORETO

CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN
SI. 10.228.044.13

UBICACION: MAZAN

DISTRITO: MAZAN

PROV.: MAYNAS

REGION: LORETO

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CALLE ARTURO FERNANDEZ ENTRE LA CALLE NUEVO MEXICO Y LA

VIA MAZAN - INDIANA EN LA CLOCCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS -

LORETO

VALORIZACION DEL CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACION MENSUAL N° 02

LORETO

DEL 01-Jun-21 AL 31/06/2021

(Sin GV, art. 13° Ley 27037)

SUPERV: ING. KENYO ALBERTO MONTE

RESIDEN: Ing. PAUL ALFARO SANDOVAL

DE INICIO DE OBRA: 05-Abr-21

TERMINO CONTRACTUAL: 30-Dic-21

VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01-Jun-21 AL 31/06/2021

(Sin GV, art. 13° Ley 27037)

SUPERV: ING. KENYO ALBERTO MONTE

RESIDEN: Ing. PAUL ALFARO SANDOVAL

VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01-Jun-21 AL 31/06/2021

(Sin GV, art. 13° Ley 27037)

SUPERV: ING. KENYO ALBERTO MONTE

RESIDEN: Ing. PAUL ALFARO SANDOVAL

VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01-Jun-21 AL 31/06/2021

(Sin GV, art. 13° Ley 27037)

SUPERV: ING. KENYO ALBERTO MONTE

RESIDEN: Ing. PAUL ALFARO SANDOVAL

VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01-Jun-21 AL 31/06/2021

(Sin GV, art. 13° Ley 27037)

SUPERV: ING. KENYO ALBERTO MONTE

RESIDEN: Ing. PAUL ALFARO SANDOVAL

VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01-Jun-21 AL 31/06/2021

(Sin GV, art. 13° Ley 27037)

SUPERV: ING. KENYO ALBERTO MONTE

RESIDEN: Ing. PAUL ALFARO SANDOVAL

VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01-Jun-21 AL 31/06/2021

(Sin GV, art. 13° Ley 27037)

SUPERV: ING. KENYO ALBERTO MONTE

RESIDEN: Ing. PAUL ALFARO SANDOVAL

VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01-Jun-21 AL 31/06/2021

(Sin GV, art. 13° Ley 27037)

SUPERV: ING. KENYO ALBERTO MONTE

RESIDEN: Ing. PAUL ALFARO SANDOVAL

VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01-Jun-21 AL 31/06/2021

(Sin GV, art. 13° Ley 27037)

SUPERV: ING. KENYO ALBERTO MONTE

RESIDEN: Ing. PAUL ALFARO SANDOVAL

VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01-Jun-21 AL 31/06/2021

(Sin GV, art. 13° Ley 27037)

SUPERV: ING. KENYO ALBERTO MONTE

RESIDEN: Ing. PAUL ALFARO SANDOVAL

VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01-Jun-21 AL 31/06/2021

(Sin GV, art. 13° Ley 27037)

SUPERV: ING. KENYO ALBERTO MONTE

RESIDEN: Ing. PAUL ALFARO SANDOVAL

VALORIZACION MENSUAL N° 02

DEL 01-Jun-21 AL 31/06/2021

(Sin GV, art. 13° Ley 27037)

SUPERV: ING. KENYO ALBERTO MONTE

RESIDEN: Ing. PAUL ALFARO SANDOVAL

DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO CONTRATADO		PRESUP. SI.	A V A N C E		O B R A		SALDOS POR	
		METRADO	P.UNIT. SI.		ACUMULADO ANTERIOR METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.	METRADO	VALOR SI.
ENEDORES SANITARIOS PARA EQUIPO DE PROTECCION USADOS	und	2.00	400.00	800.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00
CIO DE TRASLADO DE PERSONAL HASTA OBRA	und	270.00	15.00	4,050.00	56.00	840.00	104.00	1,560.00	166.00	2,490.00
CIO DE ALIMENTACION DE PERSONAL	und	270.00	90.00	24,300.00	56.00	5,040.00	104.00	9,360.00	166.00	14,940.00
ISTRO Y MONTAJE DE MODULO DE CONTROL- PREVI	und	1.00	4,128.00	4,128.00	1.00	4,128.00	1.00	4,128.00	0.00	0.00
ISTRO Y MONTAJE DE MODULO DE CONTROL DE DESINFECCION	und	1.00	6,127.50	6,127.50	1.00	6,127.50	1.00	6,127.50	0.00	0.00
ISTRO Y MONTAJE DE MODULO DE CONTROL DE COMEDOR	und	1.00	16,382.00	16,382.00	1.00	16,382.00	1.00	16,382.00	0.00	0.00
ISTRO Y MONTAJE DE MODULO DE CONTROL DE VESTUARIO	und	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00
S DE PROTECCION PERSONAL	und	14,560.00	1.00	14,560.00	2,770.20	2,770.20	4,082.40	4,082.40	10,497.60	10,497.60
IAS DE PROTECCION PERSONAL	und	270.00	175.05	47,263.50	46.00	8,052.30	76.00	13,303.80	194.00	33,959.70
NCIA DE LA SALUD DEL TRABAJADOR EN EL CONTEXTO COVID-19	und	5.00	14.20	71.00	5.00	71.00	5.00	71.00	5.00	71.00
ERACIONES PARA EL REGRESO AL TRABAJO	und	5.00	14.20	71.00	5.00	71.00	5.00	71.00	5.00	71.00
SO PARA LA REINCORPORACION AL TRABAJO	und	5.00	14.20	71.00	5.00	71.00	5.00	71.00	5.00	71.00
SO PARA LA REINCORPORACION AL TRABAJO	und	5.00	14.20	71.00	5.00	71.00	5.00	71.00	5.00	71.00
ERACIONES PARA LA REVISION Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN	und	5.00	113.16	565.80	1.00	113.16	2.00	226.32	3.00	339.48
ON Y REFORZAMIENTO A TRABAJADORES EN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO CON RIESGO	und	5.00	113.16	565.80	1.00	113.16	2.00	226.32	3.00	339.48
ERACIONES PARA EL REGRESO O REINCORPORACION AL TRABAJO DE TRABAJADORES	und	5.00	113.16	565.80	1.00	113.16	2.00	226.32	3.00	339.48
STORES DE RIESGO PARA COVID-19	und	5.00	113.16	565.80	1.00	113.16	2.00	226.32	3.00	339.48
DAJE Y ALIMENTACION COVID-19	und	5.00	113.16	565.80	1.00	113.16	2.00	226.32	3.00	339.48
EDAJE Y ALIMENTACION COVID-19	und	5.00	113.16	565.80	1.00	113.16	2.00	226.32	3.00	339.48
S RAPIDAS AL INGRESO DE OBRA	und	10.00	151.04	1,510.40	2.00	302.08	4.00	604.16	6.00	906.24
UEBAS RAPIDAS COVID-19 (EN OBRA)	und	10.00	151.04	1,510.40	2.00	302.08	4.00	604.16	6.00	906.24
FLUMIAL A OBRA	ton	0.50	160.00	80.00	0.10	16.00	0.30	48.00	0.20	32.00
SUB TOTAL (1) + (2) =				241,013.25		28,521.19		1,009,358.41		
PERCENTAJE DE AVANCE PARCIAL				10,228,044.13		100.00%		9.87%		

Paul B. Alfaro Sandoval
Ingeniero Civil
CIP N° 49953

ING. KENYO ALBERTO MONTE
CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN
REPRESENTANTE COMUN

187

CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN

"MEJORAMIENTO DE LA CALLE ARTURO FERNANDEZ ENTRE LA CALLE NUEVO MEXICO Y LA VIA MAZAN - INDIANA EN LA LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO"



Charla de inducción y seguridad a inicio de obra



Vaceado de mortero f'c= 175 kg/cm2 en sardinel

Paul E. Alvaro Sandoval
Ingeniero Civil
1953

[Signature]
ASOCIACION DE SERVIDORES CASTILLO
CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN

"MEJORAMIENTO DE LA CALLE ARTURO FERNANDEZ ENTRE LA CALLE NUEVO MEXICO Y LA VIA MAZAN - INDIANA EN LA LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO"



Excavación de terreno a nivel sub rasante



Encofrado de sardineles

Paul E. Aljaro Sandoval
Ingeniero Civil

[Handwritten Signature]
ARL F. DE LA ROSA BUSTILLO CASTILLO
CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN

"MEJORAMIENTO DE LA CALLE ARTURO FERNANDEZ ENTRE LA CALLE NUEVO MEXICO Y LA VIA MAZAN - INDIANA EN LA LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO"



Compactación con mini rodillo



Vaceo de mortero en solado

Raúl E. Alfaro Sandoval
Ingeniero Civil

[Signature]
ARE FIDEL MARTINEZ RODRIGUEZ
CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN
SUPERINTENDENTE GENERAL

CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN

"MEJORAMIENTO DE LA CALLE ARTURO FERNANDEZ ENTRE LA CALLE NUEVO MEXICO Y LA VIA MAZAN - INDIANA EN LA LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO"



Desenclavado de Sardinel



Pruebas de compactación (densidad de campo)

Paul E. Alvaro Sandoval
Ingeniero Civil
1989

[Handwritten signature]
ARQUITECTO EN CARTELAS
CONSEJO EN MAZAN

CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN

"MEJORAMIENTO DE LA CALLE ARTURO FERNANDEZ ENTRE LA CALLE NUEVO MEXICO Y LA VIA MAZAN - INDIANA EN LA LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO"



Colocación tubo alcantarillado de cruce



Conformando la sub rasante

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
AV. FERNANDEZ DE CASTAÑO
CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN
REG. COM. 2014/000118

CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN

"MEJORAMIENTO DE LA CALLE ARTURO FERNANDEZ ENTRE LA CALLE NUEVO MEXICO Y LA VIA MAZAN - INDIANA EN LA LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN - MAYNAS - LORETO"



Trasporte y acopio de cemento a obra



Vaceo de mortero en solados

Paul E. Alfaro Sandoval
Paul E. Alfaro Sandoval
Ingeniero Civil
40053

[Signature]
CONSORCIO PAVIMENTO MAZAN
REPRESENTANTE COMISA
